

# 中新广州知识城开发建设办公室文

穗开知办发〔2020〕10号

## 中新广州知识城开发建设办公室关于印发 《中新广州知识城基础设施近期实施 计划（2020-2022）》的通知

区发展改革局、教育局、财政局、规划和自然资源局、生态环境局、住房城乡建设局、水务局、农业农村局、卫生健康局、国资局、城市更新局、城市管理综合执法局、政务服务数据管理局、援建和对外经济合作局、重点项目办，新龙镇政府、龙湖街道办、九佛街道办，区建管中心、知识城合作项目服务管理中心：

经区长办公会议同意，现将《中新广州知识城基础设施近期实施计划（2020-2022）》印发给你们，执行过程中如遇问题，请径向我办反映。

特此通知。

附件:《中新广州知识城基础设施近期实施计划(2020-2022)》



中新广州知识城开发建设办公室

2020年8月5日

(联系人: 于晗, 联系电话: 020-82110353)

公开方式: 依申请公开

---



中新广州知识城开发建设办公室综合处

2020年8月5日印发

---

# (三) 园区道路—信息技术创新区、科教创新区

## 7. 信息技术创新区、科教创新区

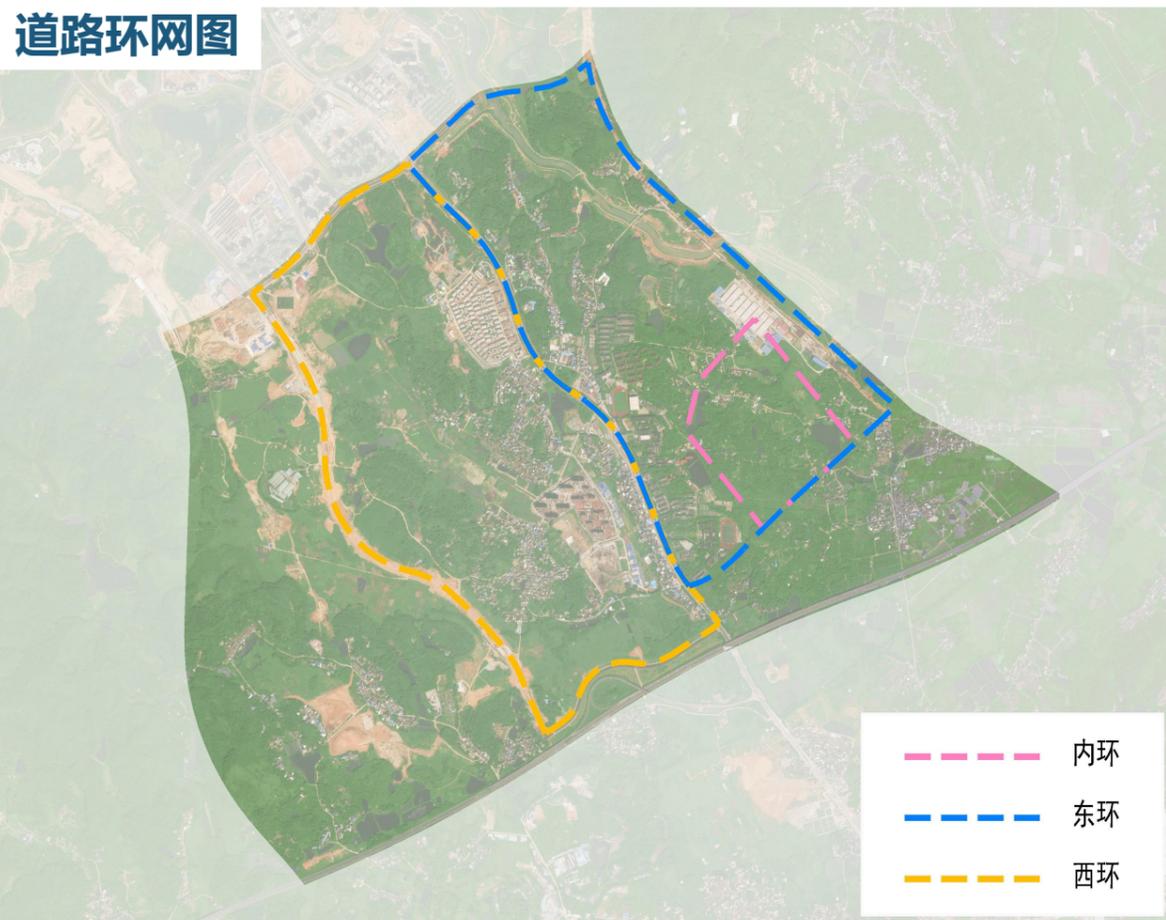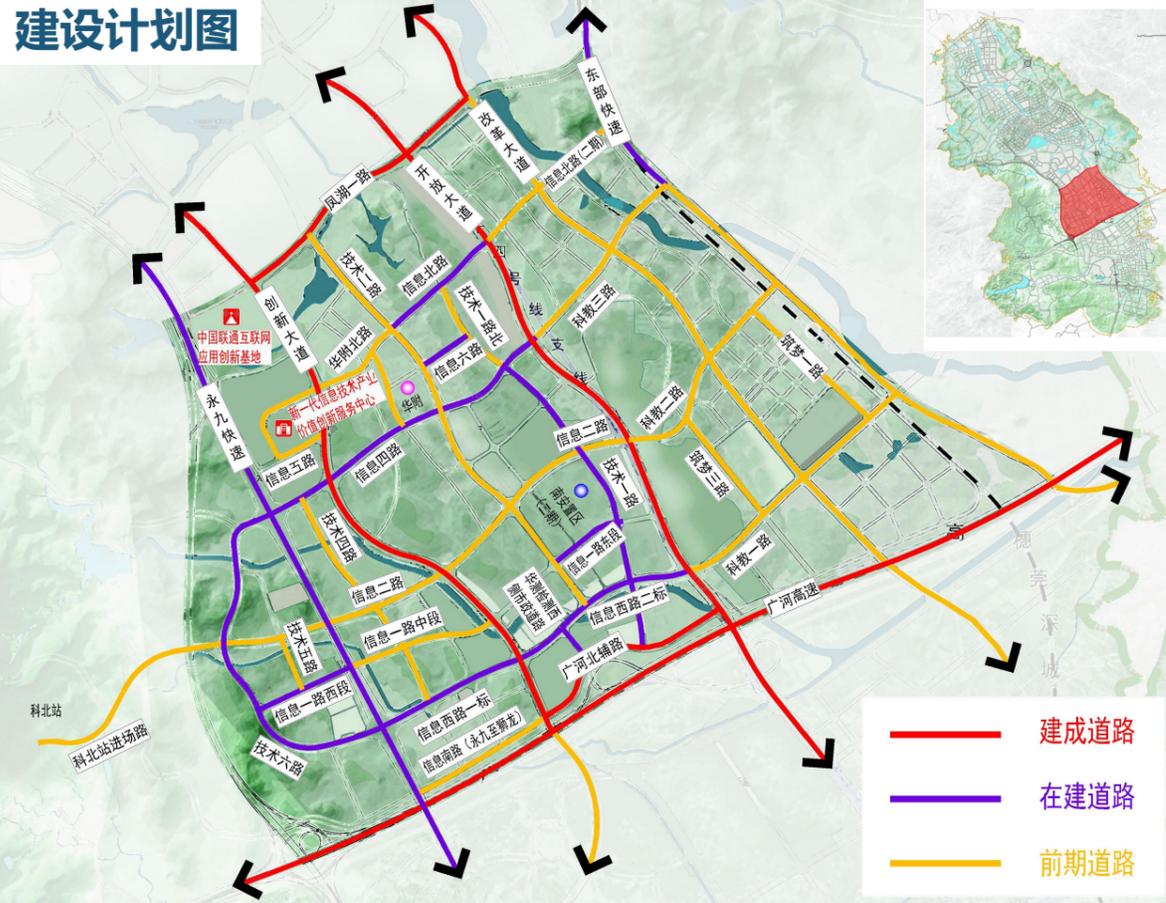

区域	项目名称	项目概况	项目总投资 (万元)	累计投资 (万元)	阶段	计划完工时间	2020年资金需求	2021年资金需求	2022年资金需求	存在困难和问题
信息技术创新区	广河北辅路	全长1.258km, 红线宽30m, 4车道。	7007	5600	建成	已完工	500	0	0	无
	创意大路 (信息四路)	全长1.857km, 红线宽40m, 6车道。	18570	2439	在建	2022年5月	1500	4000	2000	无
	华测检测西侧路	全长160m, 路宽20m, 2车道。	1098	18	在建	2021年5月	300	200	100	
	聚贤路 (技术六路)	全长2.056km, 红线宽40m, 6车道。	16190	2025	在建	2022年10月	2000	5000	5000	中段大涵村房屋拆迁
	玉麟东一路 (技术一路)	全长1.826km, 红线宽30m, 4车道。	21083	1807	在建	2022年10月	2000	5000	1000	北段还有部分汤村房屋
	玉麟一路 (信息西路)	全长2.01km, 红线宽50m, 6车道。	33210	2007	在建	2022年6月	5000	10000	10000	西段大涵村房屋拆迁
	信息北路 (康大龙翔一路社会投资)	全长0.752km, 红线宽30m, 4车道。	7520	500	在建	2021年5月	3000	2000	1000	无
	信息六路 (康大龙翔二路社会投资)	全长0.312km, 红线宽20m, 2车道。	3120	200	在建	2021年5月	1000	1000	800	无
	科北站进场路	全长1.31km, 红线宽16m, 2车道。	22528	148	新建	2021年9月	150	10000	8000	需调整规划和土规。
	玉麟大道 (技术二路)	全长2.692km, 红线宽40m, 6车道。	31780	131	新建	2022年9月	10	10000	15000	需结合华附方案建设。
	玉麟二路 (信息一路) 一期	全长1.05km, 红线宽30m, 4车道。	10550	121	在建	2021年9月	1000	4000	2000	无
	玉麟三路 (信息二路)	全长2.688km, 红线宽40m, 6车道。	49516	0	新建	2021年9月	3000	15000	1000	无
	玉麟二路 (信息一路) 二期	全长0.87km, 红线宽30m, 4车道。	14360	0	新建	2022年9月	100	5000	4000	需加快立项。
	技术五路	全长0.324km, 红线宽20m, 2车道。	2426	0	新建	2021年5月	500	2000	500	需加快立项。
	信息五路	全长0.294km, 红线宽30m, 4车道。	5600	0	新建	2021年5月	2000	1000	800	需加快立项。
	华附西路	全长0.624km, 红线宽20m, 2车道。	3000	0	新建	2022年5月	0	2000	2000	需加快立项。
	华附北路	全长1.172km, 红线宽30m, 4车道。	5000	0	新建	2022年5月	0	5000	4000	需加快立项。
	知识城信息南路 (永九至狮龙段)	全长0.859km, 红线宽30m, 4车道。	6000	0	新建	2022年5月	50	2000	3000	需加快立项。
	技术一路北	全长0.608km, 红线宽30m, 4车道	7020	0	新建	2022年5月	0	2000	4000	需加快立项。
	技术四路	全长1.389km, 红线宽30m, 4车道	13770	0	新建	2022年5月	50	2000	3000	需加快立项。
科教创新区	玉麟一路东 (信息东路)	全长1.415km, 红线宽50m, 6车道。	19370	97	新建	2021年5月	3010	7000	5000	需加快立项。
	科教二路	全长0.747km, 红线宽40m, 6车道。	13250	0	新建	2022年5月	1000	3000	2000	需加快立项。
	科教三路	全长1.135km, 红线宽40m, 6车道。	20480	0	新建	2022年5月	1000	4000	4000	需加快立项。
	筑梦一路	全长0.785km, 红线宽30m, 4车道。	3750	0	新建	2022年5月	80	3000	1000	需调整土规。
	筑梦三路	全长0.707km, 红线宽30m, 4车道。	5750	0	新建	2022年5月	100	2000	800	需加快立项。
	信息北路 (二期)	全长0.985km, 红线宽30m, 4车道	3500	0			0	1000	1000	
合计			345448	15093			27350	107200	81000	

### 实施建议:

加快技术四路、技术五路、信息一路 (中段)、信息五路、信息七路、华附西路、科教三路、筑梦一路及筑梦三路的立项工作, 分批开工建设。
