

X304（良沙路-九太路）升级改造工程

树木保护专章

Tree Protection Chapter

建设单位：广州市白云区道路设施养护管理中心

 编制单位：广州普邦园林股份有限公司

二〇二二年七月 广州

项目名称：X304（良沙路-九太路）升级改造工程树木保护专章

委托方（甲方）：广州市白云区道路设施养护管理中心

受托方（乙方）：广州普邦园林股份有限公司

资质证书与编号：风景园林工程设计专项甲级（A244076000）

林业有害生物防治组织丙级（SFS 丙 2020-253）

林业调查规划设计单位丙级（LDG 丙 2019-032）

造林绿化施工单位丙级（ZLS 丙 2019-047）

主编单位：广州普邦园林股份有限公司

审 定	谭广文	园林高级工程师（教授级）	
项目负责人	李 银	风景园林施工高级工程师 森林病虫害防治员	
项目组成员	邓演文	林业工程师	
	谢腾芳	园林高级工程师 森林病虫害防治员	
	李子华	风景园林研究高级工程师	
	易慧琳	风景园林研究工程师	
	陈 笙	风景园林研究生	





广东省林学会
Forestry Society of Guangdong Province
FSGD

扫二维码
验证真伪



林业调查规划设计单位资质证书

单位名称：广州普邦园林股份有限公司

法定代表人：杨国龙

业务范围：

森林资源调查监测与评价、林业规划设计、可行性报告咨询、
林业标准制定等。

证书编号：LDG 丙 2019-032

有效期至：2022 年 12 月 02 日

发证机构（印章）

2019 年 12 月 02 日

广东省林学会印制



广东省林学会
Forestry Society of Guangdong Province
FSGD

扫二维码
验证真伪



造林绿化施工单位资质证书

单位名称：广州普邦园林股份有限公司

法定代表人：杨国龙

业务范围：

营造林、城乡绿化、生态修复等工程施工与营养。

证书编号：ZLS 丙 2019-047

有效期至：2022 年 12 月 03 日

发证机构（印章）

2019 年 12 月 03 日

广东省林学会印制

目录

1 总则	1
1.1 项目介绍	1
1.1.1 项目背景	1
1.1.2 项目概况	1
1.1.3 项目意义	2
1.1.4 项目必要性	2
1.2 编制目的	3
1.3 编制原则	3
1.3.1 保护优先	3
1.3.2 分级保护	3
1.3.3 全程保护	4
1.3.4 合理利用	4
1.4 编制依据	4
1.4.1 法律法规	4
1.4.2 指引性文件	4
1.4.3 技术标准和规范	5
2 树木资源调查	5
2.1 调查内容与方法	5
2.1.1 调查范围	5
2.1.2 调查对象	5
2.1.3 调查方法	6
2.2 资源状况分析	6
2.2.1 总体概况	6
2.2.2 现有绿地	6
2.2.3 连片成林	7
2.2.4 古树名木	7
2.2.5 古树后续资源	7
3 树木保护措施	7
3.1 现有绿地	7
3.2 连片成林	7
3.2.1 连片成林保护方案	7
3.2.2 具体保护措施	8
4 结论与建议	10
4.1 结论	10
4.2 建议	10
附件 1: 树木保护规划图	11
附件 2: 大树以上树木资源信息汇总表	14
附件 3: 其它树木资源信息汇总表	18

1 总则

1.1 项目介绍

1.1.1 项目背景

本项目设计路段现状为城市支路，设计速度 30km/h，双向二车道，路面宽度为 7.0m，水泥混凝土路面。现状道路交通量较大，重车多，路面破损较严重，存在多处水浸黑点，路况较差，严重影响了车辆的通行能力，并给行车及居民出行带来较大的安全隐患。

随着道路沿线市政化的逐步推进，周边发展起多个物流园及产业园，为保证本地区周边园区及居民的出行安全，提升道路沿线的整体形象，X304（良沙路-九太路）段迫切需要因地制宜按城市支路的市政道路标准进行升级改造。



图 1-1 项目地理位置图

1.1.2 项目概况

本项目位于广州市白云区，设计起点位于 X304 线与良沙路平交口处，设计

桩号 K4+060；终点位于 X304 线与九太路平交口处，设计桩号 K8+212.398。路线全长 4.153km。

X304 线金盆路段现状标准为城市支路，双向二车道，设计速度 30km/h，一般路段路面宽度为 7.0m，水泥混凝土路面。本次升级改造主要是因地制宜，将路面拓宽至 10m，加铺沥青砼路面，通讯线下地，对水浸点进行改造，提高车辆及沿线居民出行的安全性。

1.1.3 项目意义

随着太和镇的发展带来的交通问题日益突出更加显著，城镇道路交通压力增长迅速，部分设计路段位于墟镇路段，周边居民较多。本项目的升级改造不仅能够提高了道路的交通使用功能，优化道路服务功能；同时对周边居民的出行及行车安全也有着重要的意义。

1.1.4 项目必要性

1.1.4.1 是保障交通安全及满足居民安全出行的需要。

现状道路于 1980 年建成，于 1996 年完成双向二车道改建。随着道路沿线市政化的逐步推进，周边发展起多个物流园及产业园，为保证本地区周边园区及居民的出行安全，提升道路沿线的整体形象，X304（良沙路-九太路）段迫切需要因地制宜按城市支路的标准进行升级改造。

1.1.4.2 是实现广州城市总体规划“北优”、战略的需要。

广州市是广东省的政治、经济、文化、科技、教育中心，是华南地区的中心城市，根据广州市“十四五”规划及城市发展战略目标，将进一步加速广州城市化进程，广州城市战略规划确定了中心城市空间布局的基本取向为：东进、西联、南拓、北优，把广州营造为一个“青山、名城、良田、碧海”的山水城市。本项目的实施是对广州市北部城区道路系统工程的完善，实现广州城市总体规划“北优”战略的需要。

1.1.4.3 是完善区域路网建设的需要。

本项目所在区域为广州北部，据相白云区交通规划，未来本区域的路网形态，将营造“畅达、绿色、集约、安全”的多模式、一体化交通体系。本项目起点接

良沙路平面交叉，南侧与沙亭西路平面交叉，是太和地区路网的重要组成部分。本项目的建设，可改善该区域道路网络通行能力不足的现状，完善广州北部地区和白云区的路网结构，对改进白云区和广州北部地区的交通有重要意义。

1.1.4.4 是促进社会经济和谐发展的需要。

在《广州市白云区城市更新专项规划大纲（2020—2035）》中，涉及太和镇辖内整治等各项重点工作正如火如荼推进中。根据白云区太和镇总体规划，本项目的建设是适应新时期经济社会发展的迫切需要，是关系现代化建设全局的基础条件，是促进广州市社会经济和谐发展的必要条件。

1.2 编制目的

在双碳目标的大背景及生态文明建设的新要求下，本项目以实现绿色低碳循环发展为目标，围绕高质量发展的主题，贯彻科学绿化的规划理念，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，科学规划，严格保护，精准建设，完善机制，走科学、生态、节俭的绿化发展之路，用“绣花功夫”推进城市绿化，提升环境质量，加快建设美丽白云。

按照《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办〔2021〕48号）、《广州市绿化条例》、《广州市关于科学绿化的实施意见（穗办〔2021〕11号）》、《广州市城市树木保护专章编制指引》等规范要求，切实做好本项目树木的保护工作，特此开展树木现状调查，根据调查分析结果编制树木保护专章，为本项目树木保护提供科学依据。

1.3 编制原则

坚持“保护优先、分级保护、全程保护、合理利用”的原则，保护树木及其生境。

1.3.1 保护优先

落实“优先保护”的原则，最大限度地减少对绿地的占用和树木的迁移、砍伐。

1.3.2 分级保护

古树名木须原址保护、古树后续资源原则上原址保护、大树和其它树木实施最大限度的避让和保护。

1.3.3 全程保护

项目全过程树木保护措施,包括施工前、施工中和施工后的保护及养护措施。

1.3.4 合理利用

经论证、审批确需迁移的树木,优先就地迁移至本项目的绿地利用,本项目无法安排利用的,迁移至临近公共绿地或其它绿地;远距离迁移须论证其必要性和可行性;迁移过程按照技术标准实施,采用免(少)修剪移植等先进技术,严控树冠修剪量,确保迁移树木的成活率和完好率。

1.4 编制依据

1.4.1 法律法规

- (1) 《城市古树名木保护管理办法》(2000年)
- (2) 《城市绿化条例》(2017年修订)
- (3) 《广东省城市绿化条例》(2014年修订)
- (4) 《广州市绿化条例》(2020年修订)

1.4.2 指引性文件

- (1) 《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》(建城〔2012〕166号)
- (2) 《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》(全绿字〔2016〕1号)
- (3) 《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》(国办发〔2021〕19号)
- (4) 《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》(建科〔2021〕63号)
- (5) 《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》(粤府办〔2021〕)

48号)

(6) 《广州市关于科学绿化的实施意见》(穗办〔2021〕11号)

(7)《广州市关于在城市更新行动中防止大拆大建问题的实施意见(试行)》
(穗办〔2021〕12号)

(8) 《广州市城市树木保护管理规定(试行)》(穗林业园林规字〔2022〕
1号)

1.4.3 技术标准和规范

(1) 《绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

(2) 《绿化植物废弃物处置和应用技术规程》GB/T 31755-2015

(3) 《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021

(4) 《古树名木鉴定规范》LY/T2737-2016

(5) 《园林绿地养护管理技术规范》B4401/T 6-2018

(6) 《园林树木安全性评价技术规范》B4401/T 17-2019

(7) 《古树名木保护技术规范》DB4401/T 52-2020

(8) 《古树名木减抗巡查技术规范》DB4401/T 126-2021

(9) 《广州市树木修剪技术指引(试行)》(2021.9)

(10) 《广州市城市道路绿化改造树木处理技术指引》(2020.3)

2 树木资源调查

2.1 调查内容与方法

2.1.1 调查范围

现状树木调查范围主要为道路改造红线范围,根据其红线范围内原道路两侧的绿化树木。因绿化范围为 K4+060-K8+212.398。路线全长 4.153km。

2.1.2 调查对象

本项目调查对象为现有绿地、连片成林、古树名木、古树后续资源。

2.1.3 调查方法

调查现有绿地的类型、数量、面积、位置。

连片成林的范围、面积、树木数量、主要树种。

大树以上调查树木的基本信息（树种、胸径、树高、冠幅、位置）、生长状况（长势、存在问题）、立地环境；其它树木调查树种、胸径、数量、位置等。

珍贵稀有树种参考《中国主要栽培珍贵树种参考名录》和《国家重点保护野生植物名录》。

疑似古树后续资源的树木需开展树龄鉴定，明确是否为古树后续资源。

所有树木按统一方式编号。

2.2 资源状况分析

2.2.1 总体概况

经前期绿化摸查，县道 X304 线 K4+060-K8+211.398 段工程范围内乔木共计 63 株，涉及树种包括细叶榕、桉树及黄槐决明，其中细叶榕 54 株，桉树 1 株、黄槐决明 8 株。树木保护规划图见附件 1，树木资源信息汇总表见附件 2、附件 3。

表 2-1 大树以上树木统计表

序号	树种	拉丁学名	总数量（株）	总占比（%）	胸径分布（cm）
1	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	49	92.45	20-78
2	黄槐决明	<i>Senna surattensis</i>	3	5.66	22-28
3	桉树	<i>Eucalyptus robusta</i>	1	1.89	22
合计			53	100.00	

表 2-2 其他树木统计表

序号	树种	拉丁学名	总数量（株）	总占比（%）	胸径分布（cm）
1	黄槐决明	<i>Senna surattensis</i>	6	60.00	10-18
2	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	4	40.00	11-16
合计			10	100.00	

2.2.2 现有绿地

该项目道路改造红线范围内只有行道树，没有成片绿地。

2.2.3 连片成林

该项目道路改造红线范围内连片成林的乔木数量共计 63 株，涉及树种包括细叶榕、桉树及黄槐决明，其中细叶榕 54 株，桉树 1 株、黄槐决明 8 株。

2.2.4 古树名木

该项目道路改造红线范围内不涉及古树名木。

2.2.5 古树后续资源

该项目道路改造红线范围内不涉及古树后续资源。

3 树木保护措施

3.1 现有绿地

该项目道路改造红线范围内只有行道树，没有成片绿地，无需进行保护。

3.2 连片成林

3.2.1 连片成林保护方案

该项目改造工程经过选择线位及调整人行道位置的方式尽可能保留现状乔木，工程范围内 63 株乔木均可保留。



图 3-1 沿线部分路段道路两侧路树情况



图 3-2 沿线部分路段道路两侧路树情况



图 3-3 沿线部分路段道路两侧路树情况

3.2.2 具体保护措施

建立原位保护树木档案，档案包括树种、坐标、胸径、树高、冠幅、生长情况及现状图片，同时在以下几个方面进行保护：

3.2.2.1 树干保护

树干外 2 m 设置保护钢管，并挂标识牌，防止施工车辆、机械对树干造成伤害。设置的钢管栏杆及标识牌应符合安全文明施工要求，达到美观统一。清除各种寄生植物（如桑寄生、无根藤和菟丝子等）。

3.2.2.2 树冠保护

设置限高标识，冠缘下立标识桩，挂警示牌，防止施工设备和车辆对树冠造成伤害。树体附近保持通风采光良好，及时清除生长在树冠表层的覆盖性藤本植物。

3.2.2.3 根系保护

保护范围内以内应有良好的排水条件,可采用通透铺装、埋置透水管等排水。不应损坏保护范围内表土层和大幅改变地表标高,不可新增覆土。除树木保护范围内及加固设施外,不应设置建筑物、构筑物及架(埋)设各种过境管线,射灯宜采用太阳能。

3.2.2.4 周边土壤压实度

保护范围应保持原有的压实度,不应车辆机械重压,铺装宜破除原有的硬质铺装,采用通透铺装。若必须在大树的保护范围修筑临时道路时,不应超过1个月,完工前应根据现场情况采取应急措施,如对土壤进行疏松或采取排水措施。严禁建材等建筑物资堆放在树木周围边。

3.2.2.5 水分环境

树木保护范围内具有良好的排水条件。应保持原有地下水位,观测记录大树的适应情况。冲洗地面等可能损害大树的,应计划排水路线,防治有害液体深入土体危害乔木安全。

3.2.2.6 水分监测要求

对原有大树进行定时监测,观察树叶叶片情况(变黄脱落或萎蔫干枯不脱落),做好记录。浇水前采用土壤湿度计检测土壤的湿度,检测深度为大树冠缘处以及大树基部50cm处。

3.2.2.7 养护管理

对原地保留的细叶榕挂牌,标明树木的名称、胸径、冠幅、习性、保护注意事项等,安排专职人员负责大树养护管理,负责浇灌、施肥、病虫害防治等。专职人员对树木在施工期进行全过程跟踪管理,每隔1周对大树生长情况进行观测评估。当树木出现异样应及时展开调查,通过检测土壤、根系等寻找原因,必要时组织专家论证,出具解决方案并实施。

3.2.2.8 病虫害防治

应做好白蚁防治,观测树木附近是否有白蚁路,若有,采用诱杀,若无,可直接捕杀,并间隔1周作监测。应做好天牛防治,观测树干、树枝是否有虫洞,树干、树枝及树下是否有虫粪,发现虫害,及时灭杀,并间隔1周作监测。

3.2.2.9 修剪

因项目需要进行通透性修剪的,应按《广州市树木修剪技术指引(试行)》

对树木进行修剪，修剪 5 cm 以上枝条，按相关程序办理手续。

4 结论与建议

4.1 结论

该项目道路改造红线范围内连片成林的乔木数量共计 63 株，涉及树种包括细叶榕、桉树及黄槐决明，其中细叶榕 54 株，桉树 1 株、黄槐决明 8 株。没有绿地，没有古树名木，没有古树名木后续资源。通过调整道路总体后，全线乔木全部保留。

4.2 建议

建议下阶段对树木保护方案继续完善。

附件：

附件 1：树木保护规划图

附件 2：大树以上树木资源信息汇总表

附件 3：其它树木资源信息汇总表




广州普邦园林股份有限公司
PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD.

设计证书: A144021183

设计资质: 风景园林工程设计专项甲级

地址: 广州市珠江新城海安路13号财富广场11楼33-35楼
电话: 87526029
传真: 87526532 邮编: 510627
图纸的版权归由
广州普邦园林股份有限公司所有

绿化工程图

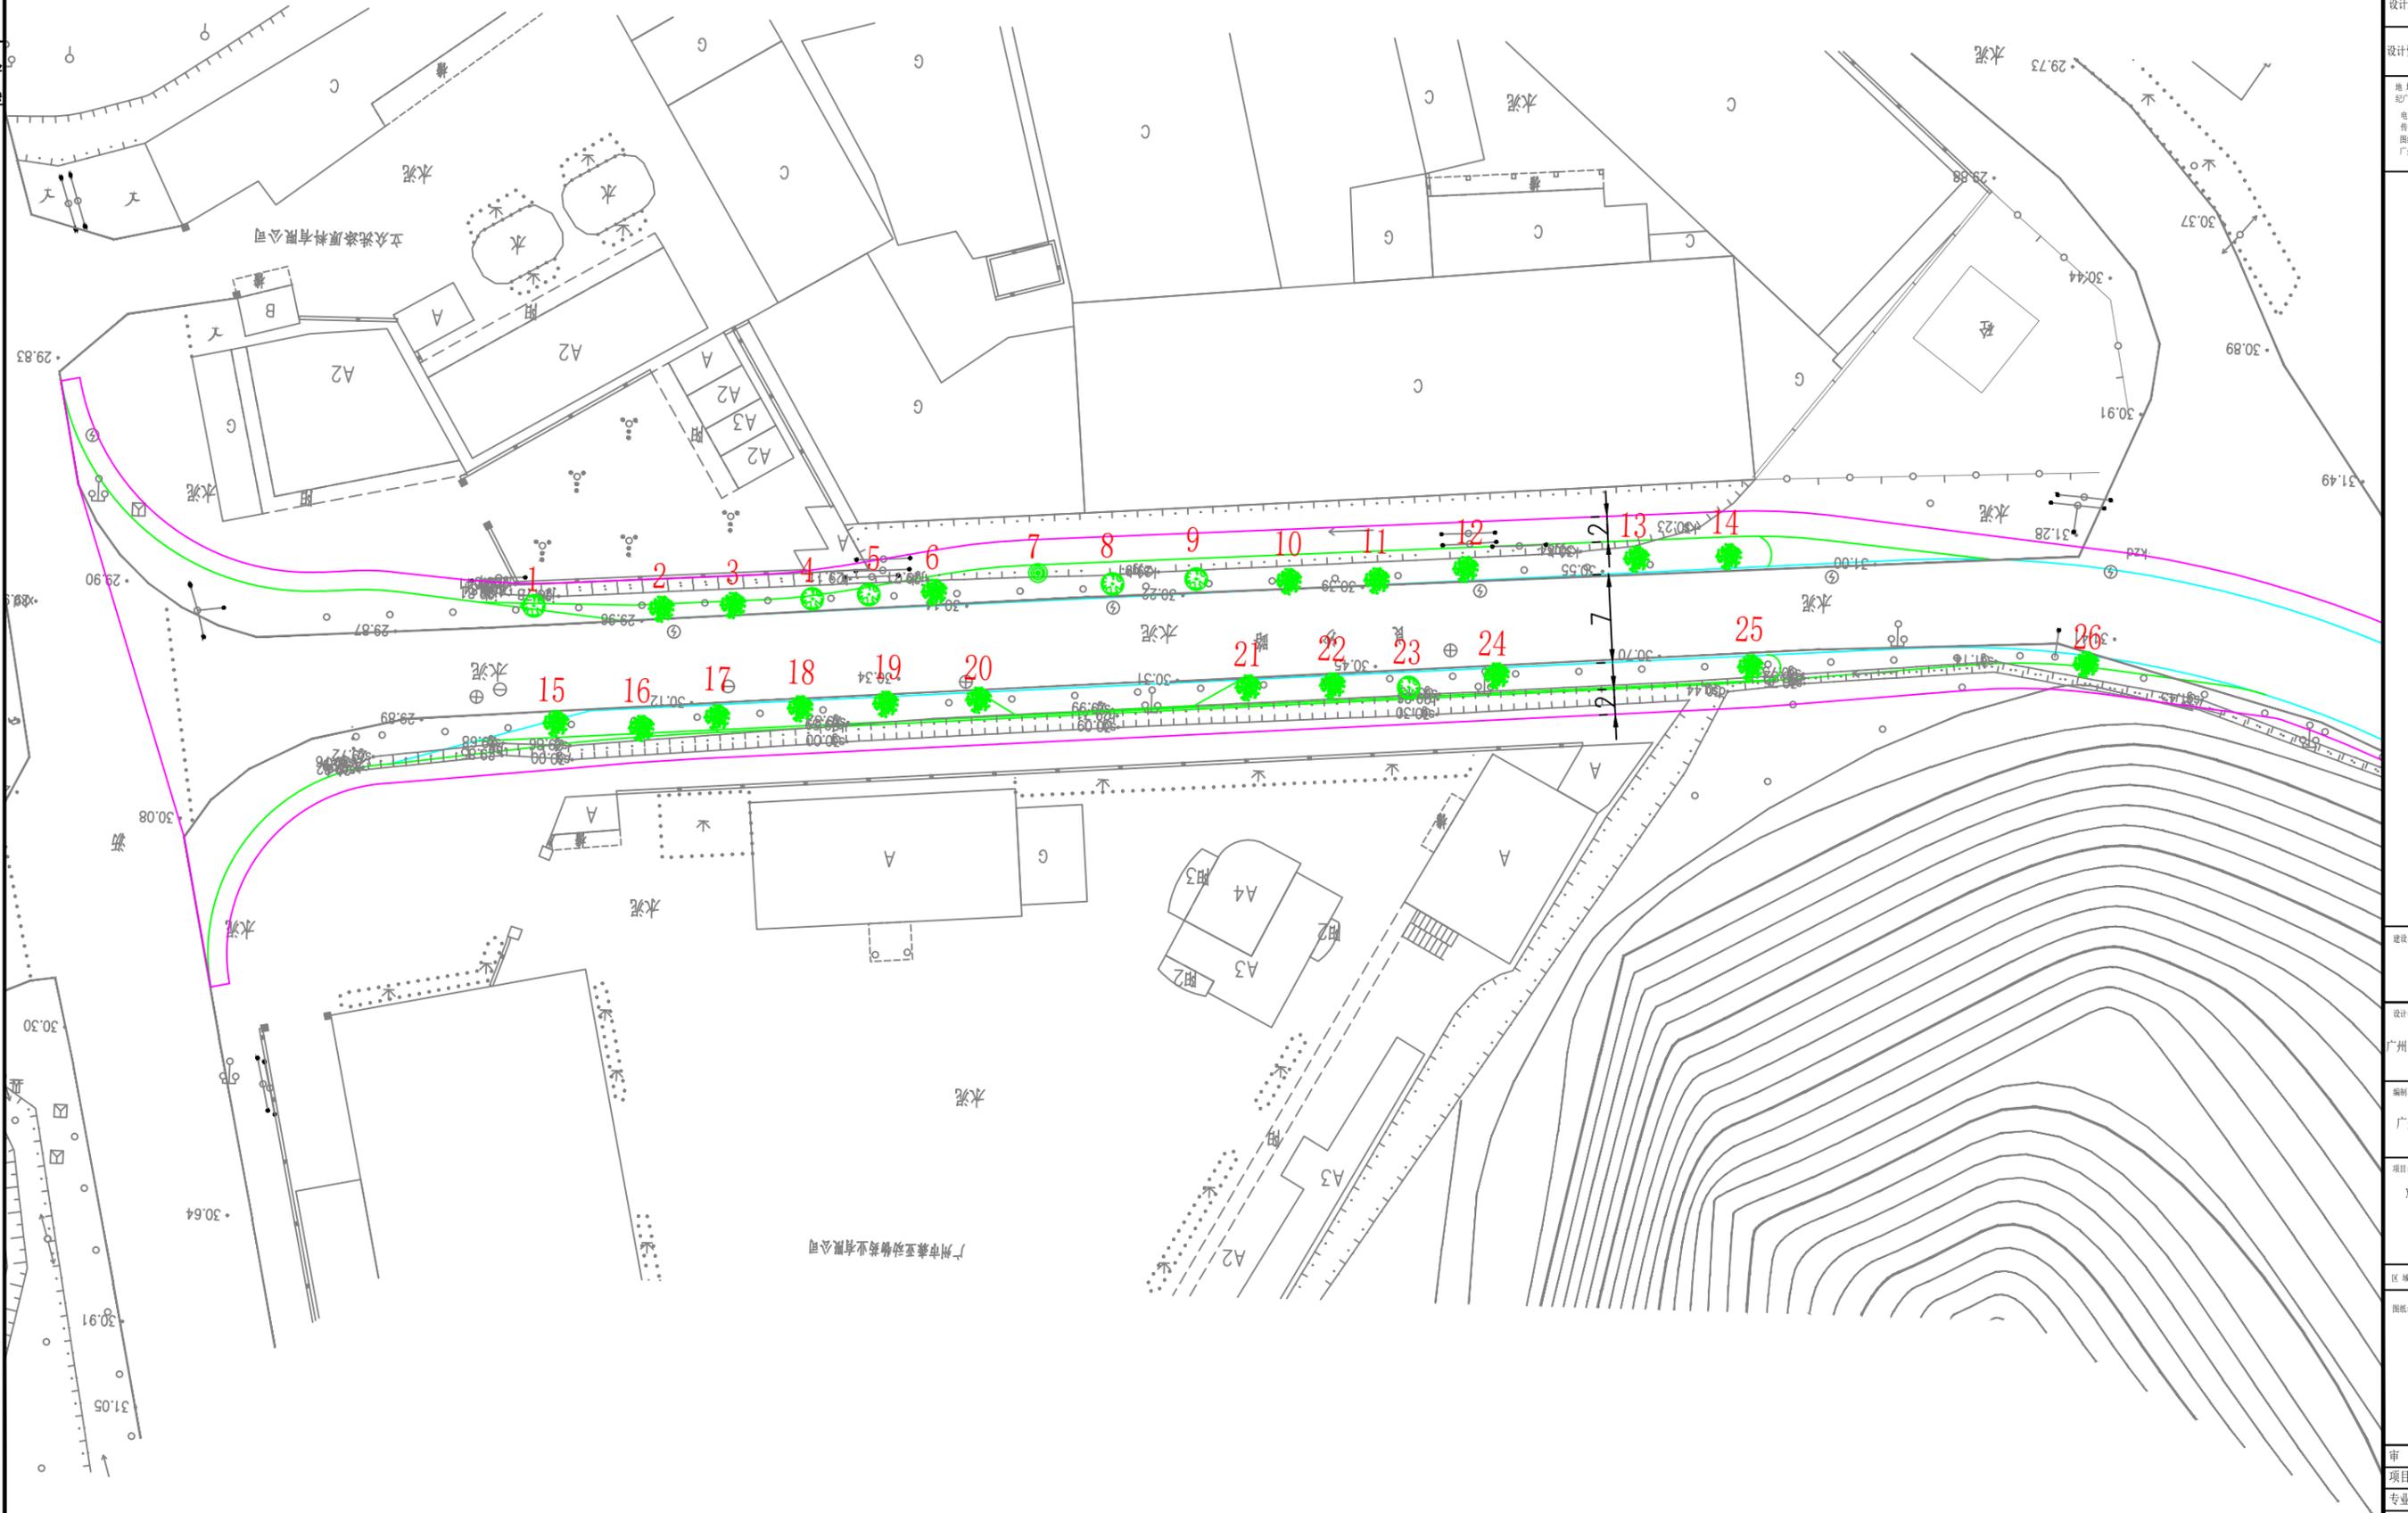

建设单位:
广州市白云区道路
设施养护管理中心

设计单位:
广州市交通设计研究院有限公司

编制单位:
广州普邦园林股份有限公司

项目名称:
X304 (良沙路-九太路)
升级改造工程
城市树木保护专项

图名:
X304 (良沙路-九太路)
升级改造工程
树木资源分布图

审定	谭广文
项目负责人	谢腾芳
专业负责	邓演文
校对	朱炫熹
制图	邹惠隆
日期	2022.06.30
比例	1:500



广州普邦园林股份有限公司


PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD.

设计证字: A144021183

设计资质: 风景园林工程设计专项甲级

地址: 广州市珠江新城海安路13号财富世纪广场11楼33-35楼
电话: 87529029 传真: 87529332 邮编: 510627
图纸的版权归
广州普邦园林股份有限公司所有

绿化工程
给排水
电气

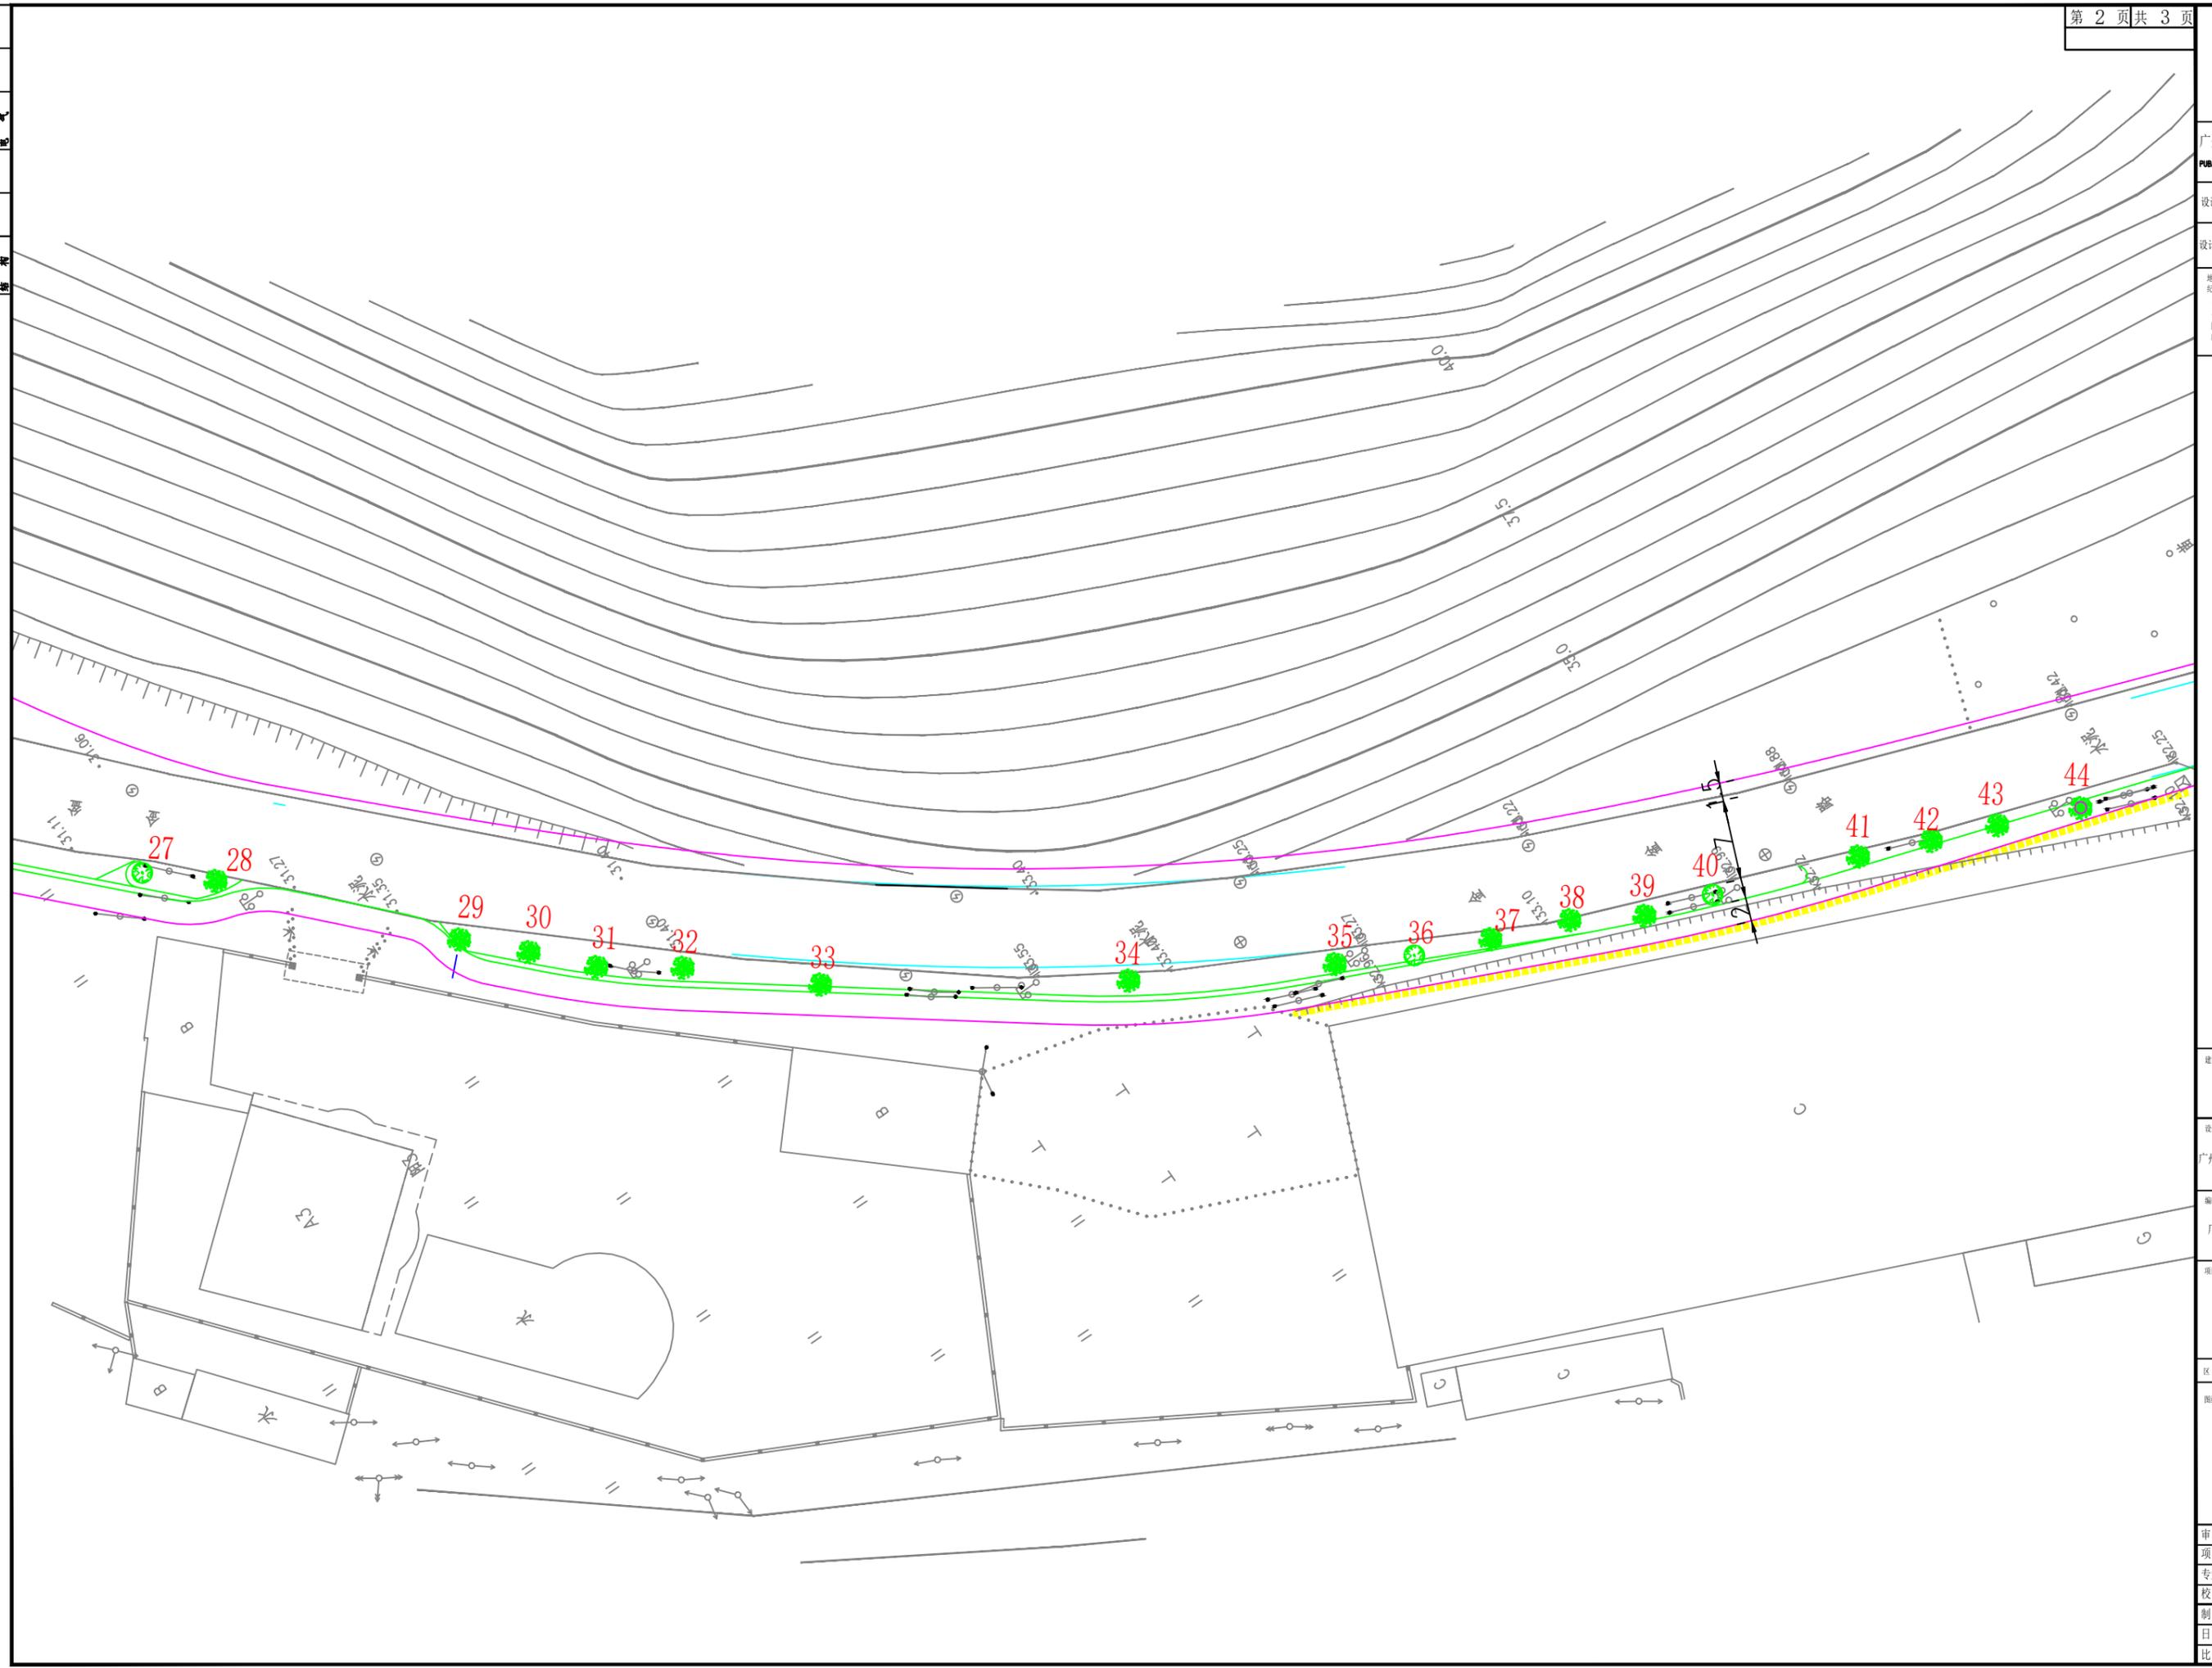

建设单位:

广州市白云区道路
设施养护管理中心

设计单位:

广州市交通设计研究院有限公司

编制单位:

广州普邦园林股份有限公司

项目名称:

X304 (良沙路-九太路)
升级改造工程
城市树木保护专章

区域:

图纸名称:

X304 (良沙路-九太路)
升级改造工程
树木资源分布图

审定	谭广文	
项目负责人	谢腾芳	
专业负责	邓演文	
校对	朱炫熹	
制图	邹惠隆	
日期	2022.06.30	
比例	1:500	




广州普邦园林股份有限公司
PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD.

设计证字: A144021183

设计资质: 风景园林工程设计专项甲级

地址: 广州市珠江新城海安路13号财富世纪广场A1栋33-35楼
电话: 87529029 传真: 87529532 邮编: 510627
图纸的版权归由
广州普邦园林股份有限公司所有

绿化工程
给排水工程
电气工程

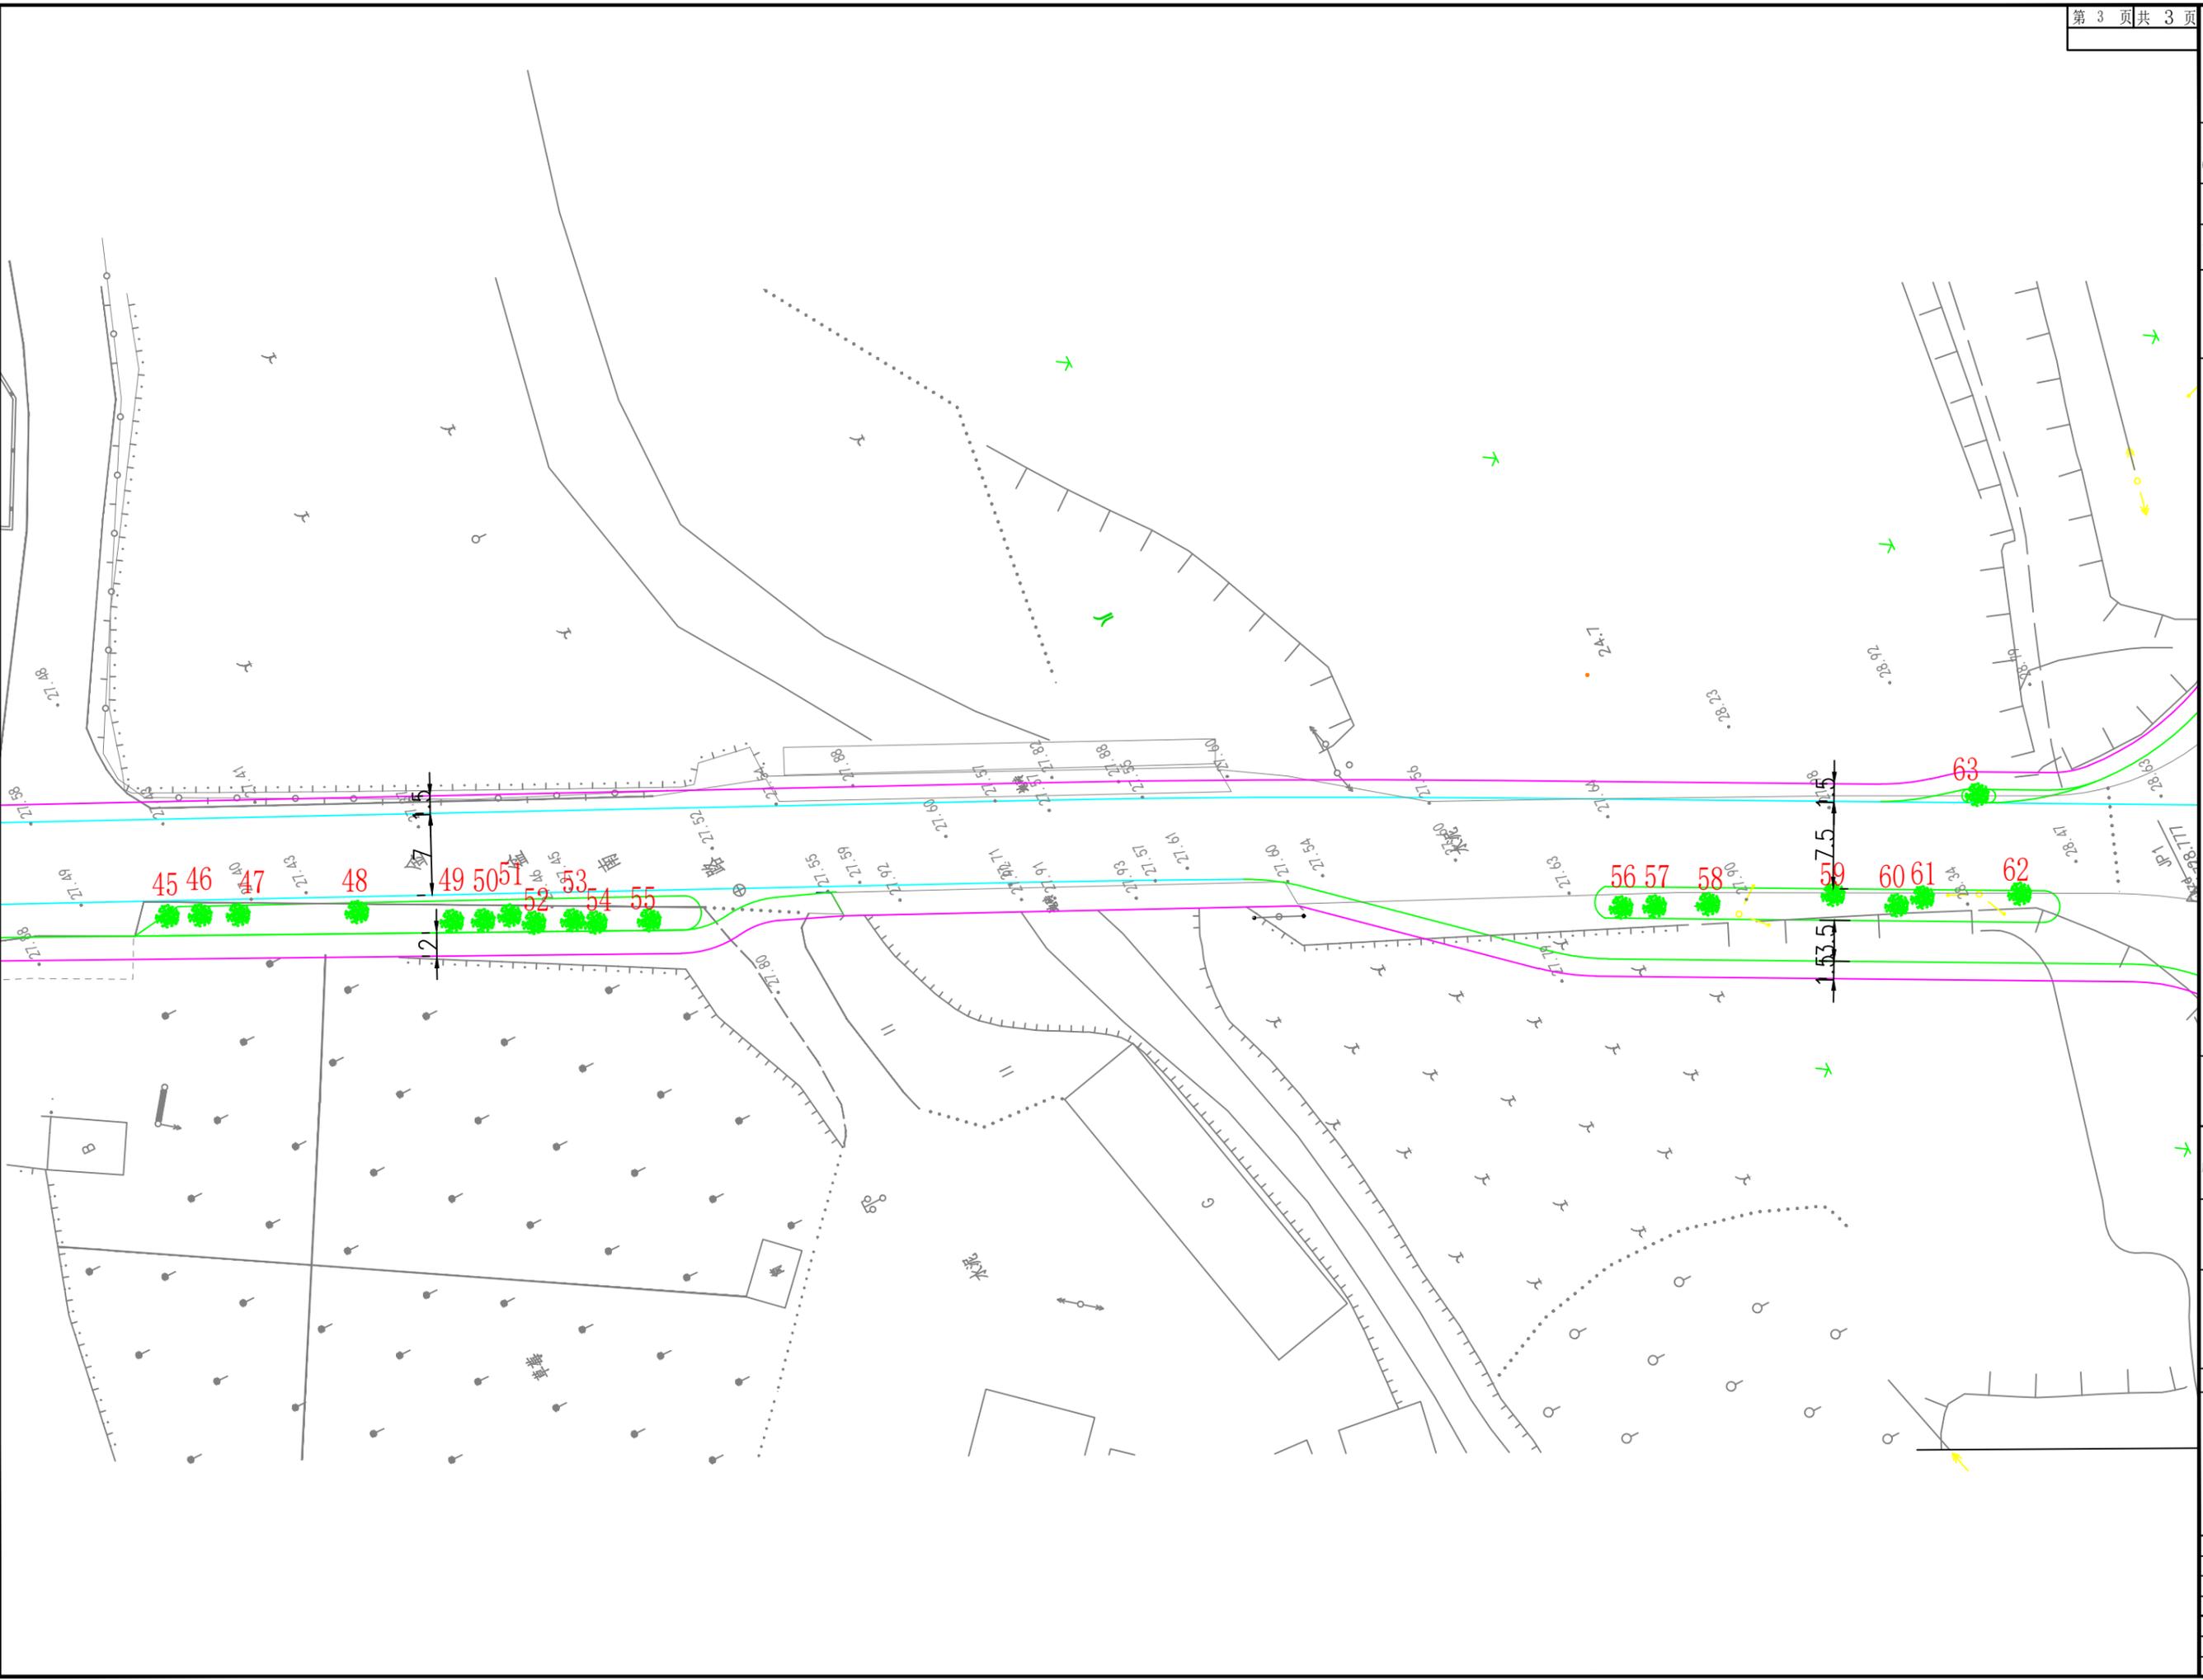

建设单位:
广州市白云区道路
设施养护管理中心

设计单位:
广州市交通设计研究院有限公司

编制单位:
广州普邦园林股份有限公司

项目名称:
X304 (良沙路-九太路)
升级改造工程
城市树木保护专章

图名:
X304 (良沙路-九太路)
升级改造工程
树木资源分布图

审定	谭广文
项目负责	谢腾芳
专业负责	邓演文
校对	朱炫熹
制图	邹惠隆
日期	2022.06.30
比例	1:500

附件 2：大树以上树木资源信息汇总表

编号	树木类型	树种	学名	科名	胸径 (cm)	树高 (m)	冠幅 (m)	位置	长势	立地环境	存在问题
2	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	23	4	3	县道 304 线 (金盆北路路口至森林公园路口段)	正常	良好	无
3	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	24	4.1	3.6	县道 304 线 (金盆北路路口至森林公园路口段)	正常	良好	无
6	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	28	4.1	3.8	县道 304 线 (金盆北路路口至森林公园路口段)	正常	良好	无
7	大树	桉树	<i>Eucalyptus robusta</i>	桃金娘科	22	6	3.2	县道 304 线 (金盆北路路口至森林公园路口段)	正常	良好	无
10	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	27	5	3.6	县道 304 线 (金盆北路路口至森林公园路口段)	正常	良好	无
11	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	29	5.2	3.5	县道 304 线 (金盆北路路口至森林公园路口段)	正常	良好	无
12	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	28	5.5	3.8	县道 304 线 (金盆北路路口至森林公园路口段)	正常	良好	无
13	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	25	4.8	3.3	县道 304 线 (金盆北路路口至森林公园路口段)	正常	良好	无
14	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	33	6.2	4.2	县道 304 线 (金盆北路路口至森林公园路口段)	正常	良好	无
15	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	22	5.6	3.6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
16	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	23	5	3.3	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
17	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	25	5	3.6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
18	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	30	6	3.6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无

编号	树木类型	树种	学名	科名	胸径 (cm)	树高 (m)	冠幅 (m)	位置	长势	立地环境	存在问题
19	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	28	5.8	3.6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
20	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	22	5.4	3.9	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
21	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	36	6.8	4.5	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
22	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	25	6.1	4	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
24	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	26	5.6	4	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
25	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	33	6.2	4.2	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
27	大树	黄槐决明	<i>Cassia surattensis</i>	苏木科	25	5	3.6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
28	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	27	5.4	4.2	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
29	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	32	6.7	5	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
30	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	25	5.5	3.8	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
31	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	20	4	3.6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
32	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	34	6.8	5.2	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
33	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	35	6.7	4.8	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
34	大树	黄槐决明	<i>Cassia surattensis</i>	苏木科	28	5.9	4.7	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无

编号	树木类型	树种	学名	科名	胸径 (cm)	树高 (m)	冠幅 (m)	位置	长势	立地环境	存在问题
35	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	32	6	5.2	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
36	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	23	5.2	3.6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
38	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	32	5.9	4.5	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
39	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	42	7.2	6.8	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
40	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	24	5.7	3.63	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	衰弱	良好	无
41	大树	黄槐决明	<i>Cassia surattensis</i>	苏木科	22	4.2	3.6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
42	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	40	7.1	6.9	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
43	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	40	7.3	5.8	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
44	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	26	5.6	4.8	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
45	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	40	6.2	6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
46	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	52	7.5	7.8	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
47	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	43	6.8	6.6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
48	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	78	8.5	8	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
49	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	32	6	5.4	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无

编号	树木类型	树种	学名	科名	胸径 (cm)	树高 (m)	冠幅 (m)	位置	长势	立地环境	存在问题
51	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	43	7.1	6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
53	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	31	5.5	4	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
54	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	52	7.6	7.8	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
55	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	42	5.8	6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
56	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	40	5.8	6.6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
57	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	42	6	5.1	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
58	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	36	5.8	4.5	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	一般	无
59	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	42	5.9	4.3	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
60	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	28	5.6	3.5	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	一般	无
61	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	50	7	6.3	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
62	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	43	5.9	4.6	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)	正常	良好	无
63	大树	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	52	6.3	6.6	县道 304 线 (金盆北路路口至森林公园路口段)	正常	良好	无

附件 3：其它树木资源信息汇总表

编号	树种	学名	科名	胸径 (cm)	数量	位置
3	宫粉紫荆	<i>Bauhinia variegata</i>	苏木科	10	1	县道 280 线 (雅阁线-S267 段)
4	宫粉紫荆	<i>Bauhinia variegata</i>	苏木科	12	1	县道 280 线 (雅阁线-S267 段)
9	宫粉紫荆	<i>Bauhinia variegata</i>	苏木科	14	1	县道 280 线 (雅阁线-S267 段)
18	宫粉紫荆	<i>Bauhinia variegata</i>	苏木科	14	1	县道 280 线 (雅阁线-S267 段)
26	宫粉紫荆	<i>Bauhinia variegata</i>	苏木科	17	1	县道 280 线 (雅阁线-S267 段)
29	宫粉紫荆	<i>Bauhinia variegata</i>	苏木科	18	1	县道 280 线 (雅阁线-S267 段)
35	宫粉紫荆	<i>Bauhinia variegata</i>	苏木科	11	1	县道 280 线 (雅阁线-S267 段)
52	细叶榕	<i>Ficus micorcarpa</i>	桑科	18	1	县道 304 线 (森林公园路口至金盆北路路口段)
