

正本

广东省

高州市 2025 年东北部农村公路改造工程（项目名称） 高州市 2025
年东北部农村公路改造工程 标类（或标段）施工招标

投 标 文 件

（第一信封：商务及技术文件）

投标人： （主）中建三局集团有限公司，（成）广东善宇公路
工程有限公司 （盖单位章）

2025 年 8 月 18 日

副本

广东省

高州市 2025 年东北部农村公路改造工程 (项目名称) 高州市 2025
年东北部农村公路改造工程 标类 (或标段) 施工招标

投 标 文 件

(第一信封：商务及技术文件)

投标人： (主) 中建五局集团有限公司, (成) 广东善宇公路
工程有限公司 (盖单位章)

2025 年 8 月 18 日

目 录

第一信封(商务及技术文件)

一、投标函及投标函附录	2
二、授权委托书或法定代表人身份证明	6
三、联合体协议书（如有）	9
四、投标保证金	10
五、施工组织设计	12
六、项目管理机构	81
七、拟分包项目情况表	82
八、资格审查资料(适用于未进行资格预审的)	83
九、其他材料	194



一、投标函及投标函附录

（一）投 标 函

高州市地方公路建设管理处（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究 高州市 2025 年东北部农村公路改造工程（项目名称） 高州市 2025 年东北部农村公路改造工程 标类（或标段） 施工招标文件的全部内容（含补遗书第 / 号至第 / 号等），在考察工程现场后（如有），愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 工程质量：标段工程交工验收的质量评定：质量等级：合格。竣工验收的质量评定：质量等级：合格，安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内不发生生产安全责任事故，工期：90 日历天。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附件条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺：拟投入本项目的项目经理 柳楚卫（包括备选人，如有）及项目总工 吴加涛（包括备选人，如有）无在岗项目（☐ 目前未在其他项目上任职，☒ 虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。

7. 我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。

8. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9. 我方完全响应招标文件、答疑及澄清的公告等招标文件要求（其他补充说明）。

投 标 人：（主）中建三局集团有限公司，（成）广东善宇公路工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：陈建强（签字）

地址：武汉市关山路 552 号

网址：https://3bur.cscec.com/index.html

电话: [REDACTED] _____

传真: [REDACTED] _____

邮政编码: 430070 _____



2025 年 8 月 18 日



(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条目号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	1.1.4.5	自实际交工日期起计算 <u>2</u> 年, 其中绿化工程自实际交工日期起计算 <u>12</u> 个月。	
2	逾期交工违约金	11.5 (3)	<u>2000</u> 元/天	
3	逾期交工违约金限额	11.5 (3)	<u>10%</u> 签约合同价	
4	提前交工的奖金	11.6	/	
5	提前交工的奖金限额	11.6	/	
6	因物价波动引起的价格调整	16.1	☒ 因物价波动引起的价格调整按照 <u>16.1.2</u> 项约定的原则处理 ☐ 合同期内不调价	
7	开工预付款金额	17.2.1(1)	<u>10%</u> 签约合同价	
8	材料、设备预付款比例	17.2.1(2)	<u> </u> / 等主要材料、设备单据所列费用的 <u> </u> / %	
9	进度付款证书最低限额	17.3.3(1)	<u>50</u> 万元	
10	逾期付款违约金的利率	17.3.3(2)	<u> </u> / %/天	
11	质量保证金限额	17.4.1	质量保证金限额: <u>3</u> % 合同价格。若交工验收时承包人具备被招标项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级, 发包人给予 <u> </u> % 工程价款结算总额质量保证金的优惠。根据粤发改法规函[2022]1178号文相关规定, 质量保证金可采用以下任意一种方式: ① 银行保函 (或保险、担保); ② 结算时扣留现金的形式。 质量保证金是否计付利息: ☐ 是, 利息的计算方式: ☒ 否	

12	保修期	19.7 (1)	自本项目实际交工日期之日起计 算 <u>5</u> 年	
----	-----	----------	--------------------------------	--



二、授权委托

（一）授权委托书

本人 陈卫国（姓名）系 中建三局集团有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托 陈建君（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 高州市 2025 年东北部农村公路改造工程（项目名称） 高州市 2025 年东北部农村公路改造工程 标类（或标段）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人： 中建三局集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人: 陈国明 (签字)

身份证号码: [REDACTED]

委托代理人: 陈建君 (签字)

身份证号码: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2025 年 8 月 13 日

注:

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则不需提交（二）法定代表人身份证明。
2. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

法定代表人身份证复印件

 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 北京市公安局丰台分局 有效期限 2020.11.03-2040.11.03	姓名 陈卫国 性别 男 民族 汉 出生 1975 年 11 月 9 日 住址 北京市丰台区大成南里四 区21楼6层2单元603号 公民身份号码 [REDACTED] 
---	---

委托代理人身份证复印件

 中华人民共和国 居民身份证 签发机关 凌源市公安局 有效期限 2019.10.11-2039.10.11	姓名 陈建君 性别 男 民族 汉 出生 1993 年 1 月 28 日 住址 辽宁省凌源市三道河子乡 胡杖子村胡杖子东组6498 号 公民身份号码 [REDACTED] 
---	---

(二) 法定代表人身份证明

投标人名称：中建三局集团有限公司

姓名：陈卫国（法定代表人亲笔签名） 性别：男 年龄：50 职务：董事长
系中建三局集团有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。



投标人：中建三局集团有限公司（盖单位章）
2025年8月13日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、联合体协议书

联合体协议书

中建三局集团有限公司，广东善宇公路工程有限公司（所有成员单位名称）自愿组成（主）中建三局集团有限公司，（成）广东善宇公路工程有限公司（联合体名称）联合体，共同参加高州市 2025 年东北部农村公路改造工程（项目名称）高州市 2025 年东北部农村公路改造工程 标类（或标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 中建三局集团有限公司（某成员单位名称）为（主）中建三局集团有限公司，（成）广东善宇公路工程有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：中建三局集团有限公司（牵头人名称）承担挖填路基、新建混凝土路面及旧路面修复、圆管涵等 专业工程，占总工程量的 70 %；广东善宇公路工程有限公司（成员一名称）承担挖填路基、新建混凝土路面及旧路面修复、圆管涵等 专业工程，占总工程量的 30 %；……。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：中建三局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：陈国（签字）

联合体成员一名称：广东善宇公路工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：李永才（签字）

2025 年 7 月 30 日

四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

投标银行保函格式

_____/____/____（招标人名称）：

鉴于_____/____/____（投标人名称）（以下称“投标人”）于____/____年____/____月____/____日参加_____/____/____（项目名称）____标段施工的投标，_____/____/____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）_____/____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：_____/____/____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____/____/____（签字）

地 址：_____/____/____

邮政编码：_____/____/____

电 话：_____/____/____

传 真：_____/____/____

____/____年____/____月____/____日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写，但主要内容须与本保函内容原则上保持一致。

建设工程投标保证金保险

申能财产保险股份有限公司
SHENENG PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO., LTD.

建设工程投标保证金保险（凭证）

保险单号：6303130042160250001389

被保险人：高州市地方公路建设管理处（招标人名称）

鉴于中建三局集团有限公司（投标人名称）（以下称“投标人”）于2025年08月18日参加高州市2025年东北部农村公路改造工程（项目名称）高州市2025年东北部农村公路改造工程标段施工的投标，申能财产保险股份有限公司广东省分公司营业部（保险人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与被保险人订立合同，在签订合同时向被保险人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）叁拾捌万元整。

本保险在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

保险人名称：申能财产保险股份有限公司广东省分公司营业部（盖章单位章）

法定代表人或其委托代理人：黄羽（签字）

地 址：广东省广州市天河区兴民路 222 号之三 5007 房

邮政编码：510623

电 话：

传 真：

2025 年 08 月 13 日

五、施工组织设计

(适用于双信封的综合评分法、双信封的技术评分最低标价法)

附后



第1章 总体施工组织布置及规划

1.1 工程概况

1.1.1 工程建设规模

表1.1.1-1 工程概况表

序号	项目	内容
1	项目名称	高州市 2025 年东北部农村公路改造工程
2	招标人	高州市地方公路建设管理处
3	招标代理机构	茂名市中新项目管理有限公司
4	设计单位	中国公路工程咨询集团有限公司
5	建设地点	广东省茂名市高州市
6	招标范围	本次招标范围为工程量清单对应设计施工图纸的所有内容。
7	建设规模	本工程是高州市 2025 年东北部农村公路改造工程分布于高州市宝光街道、南塘镇、泗水镇、金山街道、谢鸡镇、长坡镇，共计 24 段农村路，路线总长 45.824 公里。主要内容包括挖填路基、新建混凝土路面及旧路面修复、圆管涵等（具体内容以审核的施工图纸和工程量清单为准）。
8	计划工期	90 日历天（具体开工时间以监理下发的开工令为准）
9	质量要求	标段工程交工验收的质量评定：质量等级合格。 竣工验收的质量评定：质量等级合格
10	安全目标	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内不发生生产安全责任事故。
11	项目地理位置图	

1.1.2 主要工程数量

高州市 2025 年东北部农村公路改造工程，由 CC36 线、CL06 线、C780 线、CG20 线、YA79 线、Y579 线、Y524 线、Y803 线、C823 线、C830 线、CN36 线、Y669 线、Y945 线、Y906 线德载山段、Y906 线富田段、CD55 线、Y746 线、CJ26 线、C205 线、X806 线、Y690 线、Y693 线、Y697 线、Y685 线共计 24 条线路组成，改造路线总长 45.824 公里。

本项目县道设计速度采用 30km/h，按三级公路两车道标准建设，路基宽度 7.5m，路面宽度 6.5m；乡道、村道设计速度采用 15km/h，按四级（I 类）公路两车道标准建设，路基宽度 6.5m，路面宽度 6.0m。用地困难、工程实施难度特别大的路段维持现状四级公路（II 类）单车道不变，并在有条件的路段增设错车道。

表1.1.2-1 路线一览表

序号	线路名称	建设范围	建设里程（公里）
1	宝光街道 CC36 苏屋至彭屋公路	K0+457~K0+773	0.316
2	宝光街道 CL06 泗塘口至苏屋公路	K0+369~K1+752	0.883
3	宝光街道 C780 线钱坡路口至陂田村委会公路	K0+000~K1+256	1.256
4	宝光街道 C020 线林科所至李子坑公路	K0+000~K1+479	1.479
5	宝光街道 YH79 线茶亭路口至腰古公路	K0+000~K3+783	3.783
6	宝光街道 Y579 线黎洞至石龙公路	K1+330~K2+090	0.7
7	南塘镇 Y524 线罗村小学至沙田村公路	K1+364~K2+515	1.151
8	南塘镇 Y003 线平乐坡至石龙公路	K0+000~K4+122	4.122
9	南塘镇 C823 线 207 国道至上东岸公路	K0+000~K1+217	1.217
10	南塘镇 C830 线 207 国道至村委会大队公路	K0+000~K1+272	1.272
11	南塘镇 CN36 钱路口至大朗公路	K0+000~K1+219	1.219
12	泗水镇 Y669 线林垌至南山公路	K0+000~K4+763	4.763
13	泗水镇 Y945 线大联至书房村公路	K0+000~K0+700	0.7
14	金山街道 Y906 线德榄山段公路	K2+631~K3+910	1.279

序号	线路名称	建设范围	建设里程（公里）
15	金山街道 Y906 线富田段公路	K4+125~K5+151	1.026
16	谢鸡镇 CD55 线亚子垌至西坑公路	K0+000~K1+276	1.276
17	谢鸡镇 Y746 线文雅至凤塘公路	K0+000~K3+636	3.636
18	谢鸡镇 CJ26 线木龙岗村道	K0+000~K0+616	0.616
19	谢鸡镇 C205 线坑塘路村口至坑塘公路	K0+000~K1+034	1.034
20	谢鸡镇 X306 线大坡山至水砖公路	K21+366~K22+209	0.843
21	长坡镇 Y690 线乌石头至银树垌公路	K0+000~K1+099	1.099
22	长坡镇 Y693 线旺村委会至良坑公路	K0+000~K7+423	7.423
23	长坡镇 Y697 线田坪段公路	K4+694~K6+390	1.696
24	长坡镇 Y685 线西坑至良坑公路	K0+000~K3+035	3.035

合计

45.824

表1.1.2-2 主要工程数量表

序号	项目	单位	工程数量	备注
1	路线长度	km	45.824	
2	路基工程	总挖方	m ³	20767
3		总填方	m ³	2405
4		本桩利用方	m ³	200
5		远运利用方	m ³	800
6		弃土方	m ³	19567
7		借土方	m ³	1405
8		清表土	m ³	7197
9		边沟	m	12248
10	路面工程	C35 水泥混凝土	m ³	6817.2
11		Φ14 拉杆	Kg	19751
12		Φ28 传力杆	Kg	2855

序号	项目		单位	工程数量	备注
13		路肩培土	m ³	1684	
14	旧路维修工程	C35 水泥混凝土	m ³	2596.6	
15		Φ14 拉杆	Kg	1087	
16		Φ28 传力杆	Kg	4552	
17	桥梁工程	桥梁	座	5	护栏更新、附属修复
18	涵洞工程	涵洞	座	78	接长、新建、拆除新建
19	交安及沿线设施	标志牌	个	181	
20		波形护栏	m	4586	
21		标线	m ²	6763	
22		道口标柱	个	244	
23		示警桩	个	580	
24		凸面镜	个	24	
25		爆闪灯	个	18	

1.1.3 施工自然条件

1.1.3.1 地形地貌

高州市东北部山区部分地势起伏大，岩土体受雨水冲刷、地下水活动和人工开挖等因素影响，稳定性差，在暴雨等强降水条件下，极易形成滑坡、泥石流。对于此路段尽量减少开挖、设置必要的支挡防护措施、完善排水设施。





图1.1.3-1 丘陵地貌现状图



图1.1.3-2 平原地貌

1.1.3.2 水文地质、工程地质、气象气候



1.1.4 施工条件

1.1.4.1 运输条件

本项目即为农村公路改造工程，周边公路网络较完善，现状道路宽度均能够满足货车通行需求，部分位置错车困难，但基本可直接用作临时道路使用。

钢筋、混凝土、交安工程等材料运输便利，能够通过货运车辆直接运抵施工现场，无需二次转运。

1.1.4.2 施工用水、用电

项目施工区域河流充沛，各工点附近均有河流，较大河流有南塘河、顿梭河、曹江河、新垌河、谢鸡河、小东江、鉴江，水资源极为丰富，水质纯净，可直接作为工程用水。乡道沿线电网密布，协调临时用电较为方便。



图1.1.4-1 项目周边电力线路现状图



图1.1.4-2 项目周边水资源现状

1.1.4.3 筑路材料

项目沿线的筑路材料相对匮乏，除土料外，砂料和石料均需外购远运。块石、碎石料可在高州市大坡镇和兴沙石场购运，该石场花岗岩石料强度高、耐磨性好，是良好的碎石料，可经省道、国道进行汽车运输，路况良好；砂料在取得环保、水利部门的许可下，可在鉴江砂场及滩地都可取得丰富的建筑用砂，砂料以中粗砂为主，含泥量较少，是较好的建筑用砂，可采用汽车运输。

1.1.5 工程特点及重难点工程分析与说明

1.1.5.1 工程特点

本项目总线路长，结构物分散，各工点不连续，大部分区域的施工与交通导行相辅相成，土石方调配与填挖平衡分解为更小的段落进行考虑，运输车辆协调频次增加，施工组织难度大。

本项目总长 45.824km，共计 24 条线路，其中 1 条县道，13 条乡道，10 条村道。现状道路窄，部分路段无法会车，局部路段由于缺少排水设施导致路基掏空出现沉陷，水

泥混凝土路面整体状况较差，局部路段破损严重。沿线除少部分路段设有路肩挡墙外，其余路段边坡基本无防护，部分路段边坡垮塌。沿线排水设施较少，局部路段设有矩形混凝土边沟，部分路段雨天积水严重。

1.1.5.2 工程重难点分析

总线路长 协调难度大	改造路线总长45.284km，共计24条线路。遍布高州市东北部农村，涉及多个村道，各工区之间间隔距离远，人员、材料、机械的转运要求高，施工组织是重难点。
1. 将24条线路按地理分布划分为3个工区，每工区设现场管理小组并明确责任人，实行“工区负责、统一调度”管理模式，提升响应与执行效率。设立项目指挥部，配备信息化平台，实时掌握进度、资源及问题，实现跨区域协调与动态调配。 2. 根据施工进度编制周、日运输计划，合理安排车辆调度，避开农忙和村民出行高峰，减少对村道交通的影响。 3. 提前对接沿线村委会和村民代表，通报施工安排、交通导改及可能影响，争取理解与支持，防范阻工事件； 4. 各工区明确安全责任人，定期开展安全巡查和培训，重点管控机械转运、村道交叉作业等高风险环节，确保施工安全。	
交通疏解 安全风险高	本项目范围内沿线存在多所小学，人流量大，做好行人及车辆的交通疏解工作是重难点。
1. 在学校出入口及周边50 - 100米范围设置施工管控区，设置临时围挡，实行封闭或半封闭施工； 2. 预留安全、宽敞的行人通道，并与车行道有效隔离，在主要路口及施工区域设置清晰导行标志，在夜间或视线不良区域配备临时照明与反光设施； 3. 加强现场交通组织，与交通、交警部门紧密联动，按照政府要求设置专人疏导交通； 4. 联合学校、社区发放安全告知书，通过广播、公告等形式提醒家长和居民注意施工区域安全。	

环境敏感 水土保持	本项目路线范围多条道路位于高州水库二级饮用水水源保护区，做好环境保护、水土保持是重难点。 1. 通过“源头防控、过程监管、末端治理、应急保障”全过程管控，严格落实各项水土保持与水源保护措施； 2. 实行“开挖一段、施工一段、回填一段”的作业模式，缩短土体裸露时间，裸露土方及时用防尘网或植被垫覆盖，防止雨水冲刷造成泥沙入水； 3. 设置多级沉淀池和临时排水沟，对施工废水、雨水径流进行拦截、沉降处理，达标后方可排放，严禁直接排入水源保护区； 4. 联合环保部门定期对施工影响区域的水质、土壤进行监测，及时掌握环境变化，发现问题立即整改。
道路桥涵修缮 病害多样	现状道路大部分需加宽处理，且存在路基掏空、路面破损及排水不畅等路基路面病害；另构造物修复复杂，需处理78道涵洞（接长/新建/拆除）及5座桥梁，确保病害类施工质量是重难点。 1. 对现有路基、路面及构造物进行全面排查，建立“一路一档”病害台账，明确病害类型、范围及成因，针对不同病害类型（如路基掏空、沉陷、裂缝、排水不畅等），结合地质条件和交通荷载要求，制定差异化处治方案； 2. 避免全线开挖，采用“分段作业、逐段成型”方式，减少对既有道路通行的影响，同时便于质量控制与验收； 3. 合理安排路基、路面、排水、构造物等各专业施工顺序，避免交叉干扰，确保各环节衔接顺畅、质量受控。

图1.1.5-1 重难点工程分析

1.1.5.3 关键工程分析

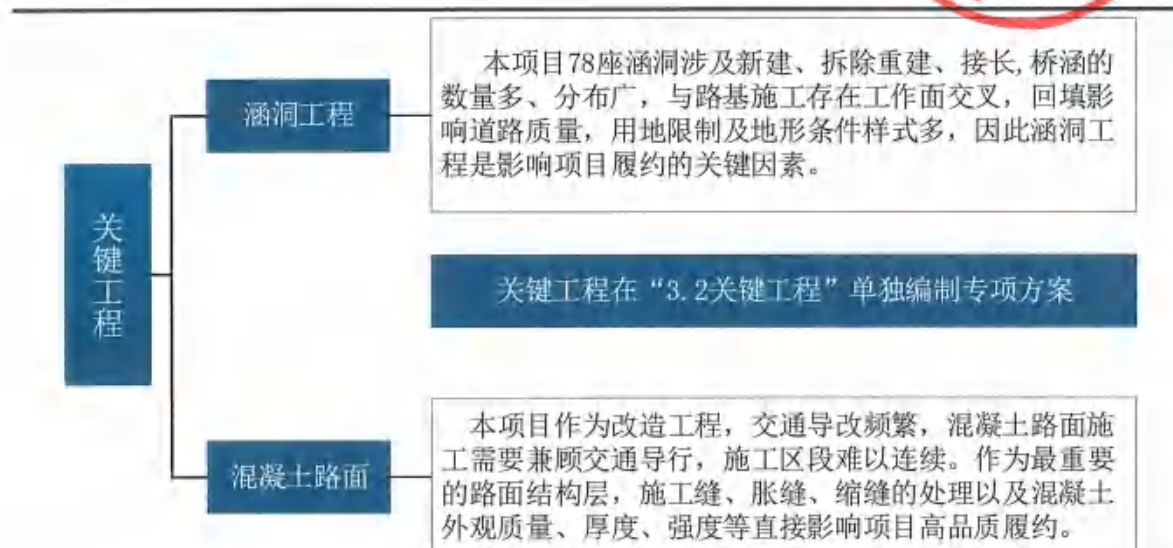


图1.1.5-2 关键工程分析

1.2 施工组织安排

1.2.1 总体施工计划

项目建设拟成立项目部 1 个，划分 3 个工区，配备路基施工队、路面施工队共 13 个施工班组。

道路施工：3 个工区各安排 2 个道路施工班组，共计 6 个施工班组，一工区整体按照谢鸡镇→金山街道→泗水镇施工，土方路基班组优先 Y746、Y669 长线施工，路面施工队优先修缮 CJ26、CD55、Y906、Y945 线损坏路面，减少工作面交叉；二工区整体按照南塘镇→宝光街道施工，土方路基班组优先 Y803、YA79、CG20、Y579 长线施工，路面施工队优先修缮 Y524、C36、C823、C830、CC36、CL06、C780 损坏路面；三工区整体按照长坡镇→谢鸡镇施工，土方路基班组优先 Y693、Y697 长线施工，路面施工队优先修缮 C205、X806、Y690、Y685 线损坏路面。优先施工桥涵数量多的道路，为后续交安施工提供充足工作面。

涵洞施工：一工区安排 1 个涵洞施工班组，二工区安排 2 个涵洞施工班组，三工区安排 2 个涵洞施工班组，共计 5 个施工班组，根据路基开展工作面情况，在填方完成前做好涵洞施工。改建段根据路基施工情况选择左、右幅施工。涵洞背部回填分层回填压实，与前后 20m 范围内路基同步施工。

桥梁施工：桥梁修缮位于泗水镇、南塘镇与长坡镇，设置 1 个桥梁队伍由一工区管理、二三工区设桥梁工长配合，按泗水镇→长坡镇→南塘镇由南向东北再向西北施工。

交安及沿线工程：设置 1 个交安队伍由一工区管理、二三工区设交安工长配合，在保护好已建工程前提下随施工进展穿插交安施工，整体顺序由一工区向二工区、三工区推进。

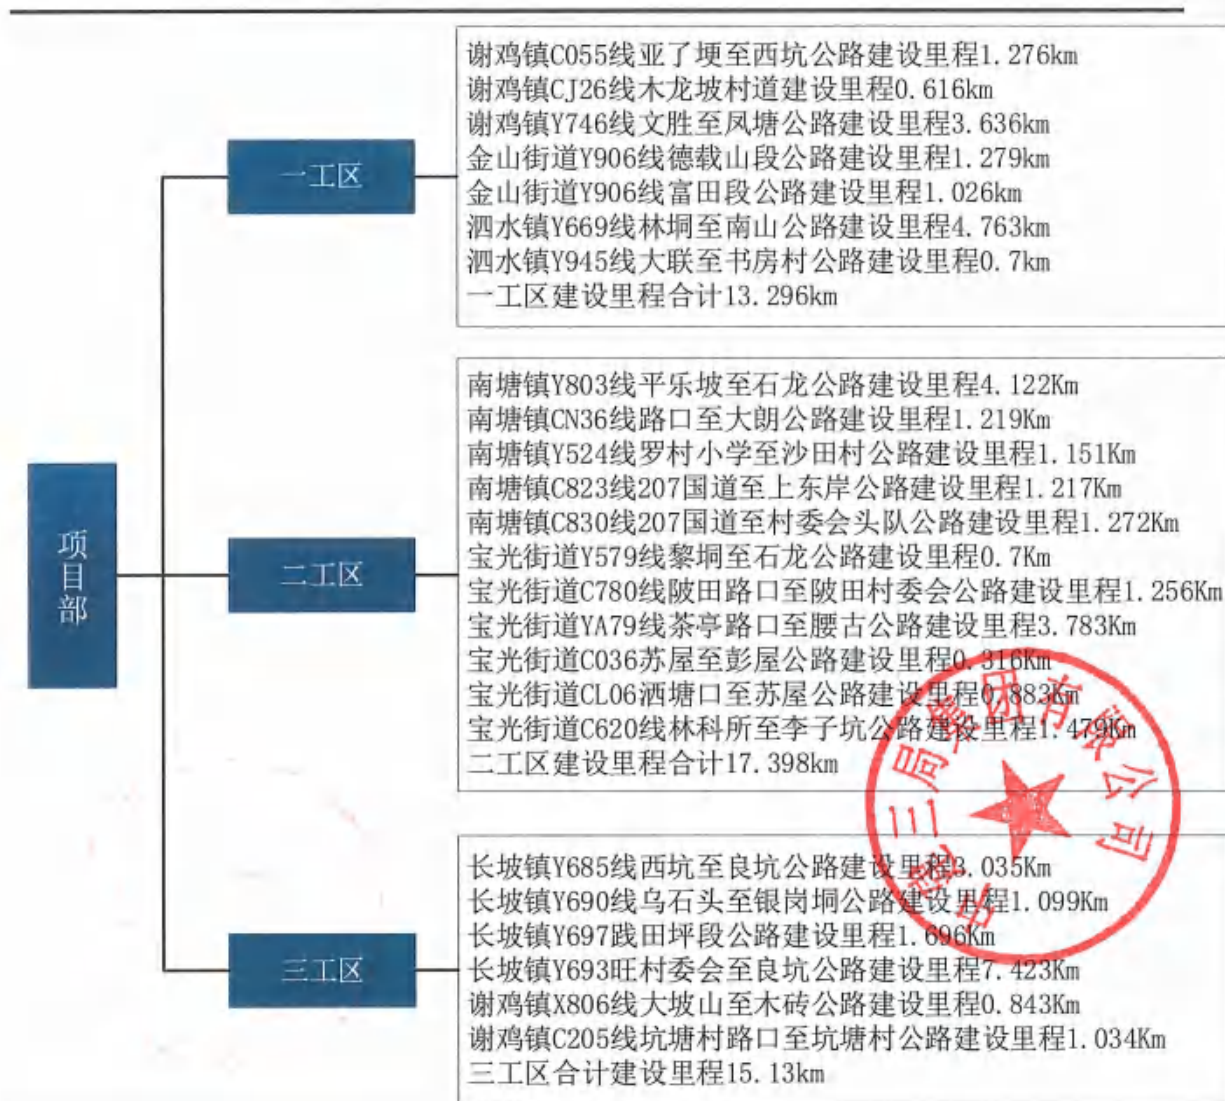


图1.2.1-1 工区划分

1.2.2 施工管理组织机构

项目部采用“1+3+2+N”模式进行组建，按项目施工区位设立1个项目经理部、3个工区、2个施工队、13个施工班组，多点位同时开工，提高管理效率、加快施工进度。

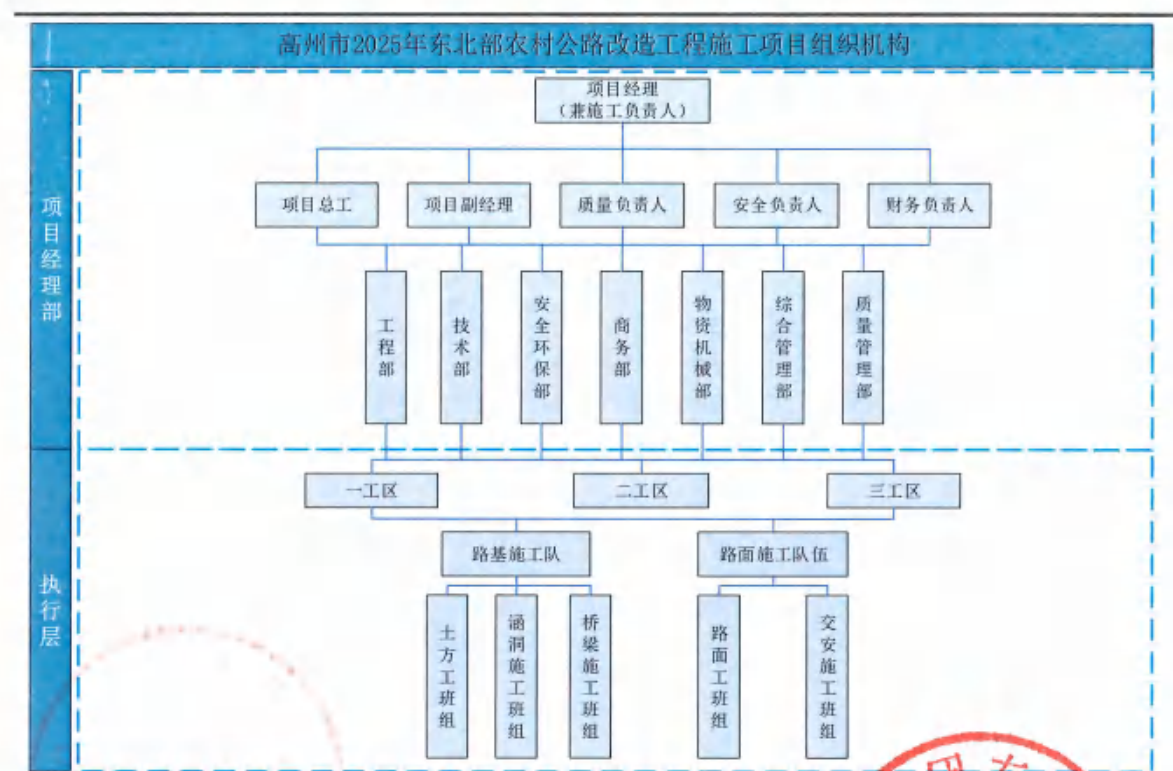


图1.2.2-1 施工管理组织机构图

表1.2.2-2 部门及岗位表

序号	部门	岗位	数量	备注
1	项目领导	项目经理	1	兼施工负责人
2		项目总工	1	
3		项目副经理	1	
4		质量负责人	1	
5		安全负责人	1	
6		财务负责人	1	
7	工程部	道路工程师	1	
8		桥梁工程师	1	
9	技术部	试验工程师	1	
10		计划工程师	1	
11		测量工程师	1	
12		资料员	1	
13	质量管理部	质检工程师	1	
14	商务部	预算员	1	
15	安全环保部	专职安全员	2	

序号	部门	岗位	数量	备注
16	物资机械部	材料员	1	
17	综合管理部	综合管理员	1	
合计			18	

1.2.3 作业队伍及施工区域划分

本工程拟划分 3 个工区，配备 2 个施工队、13 个施工班组。具体划分情况见下图表。

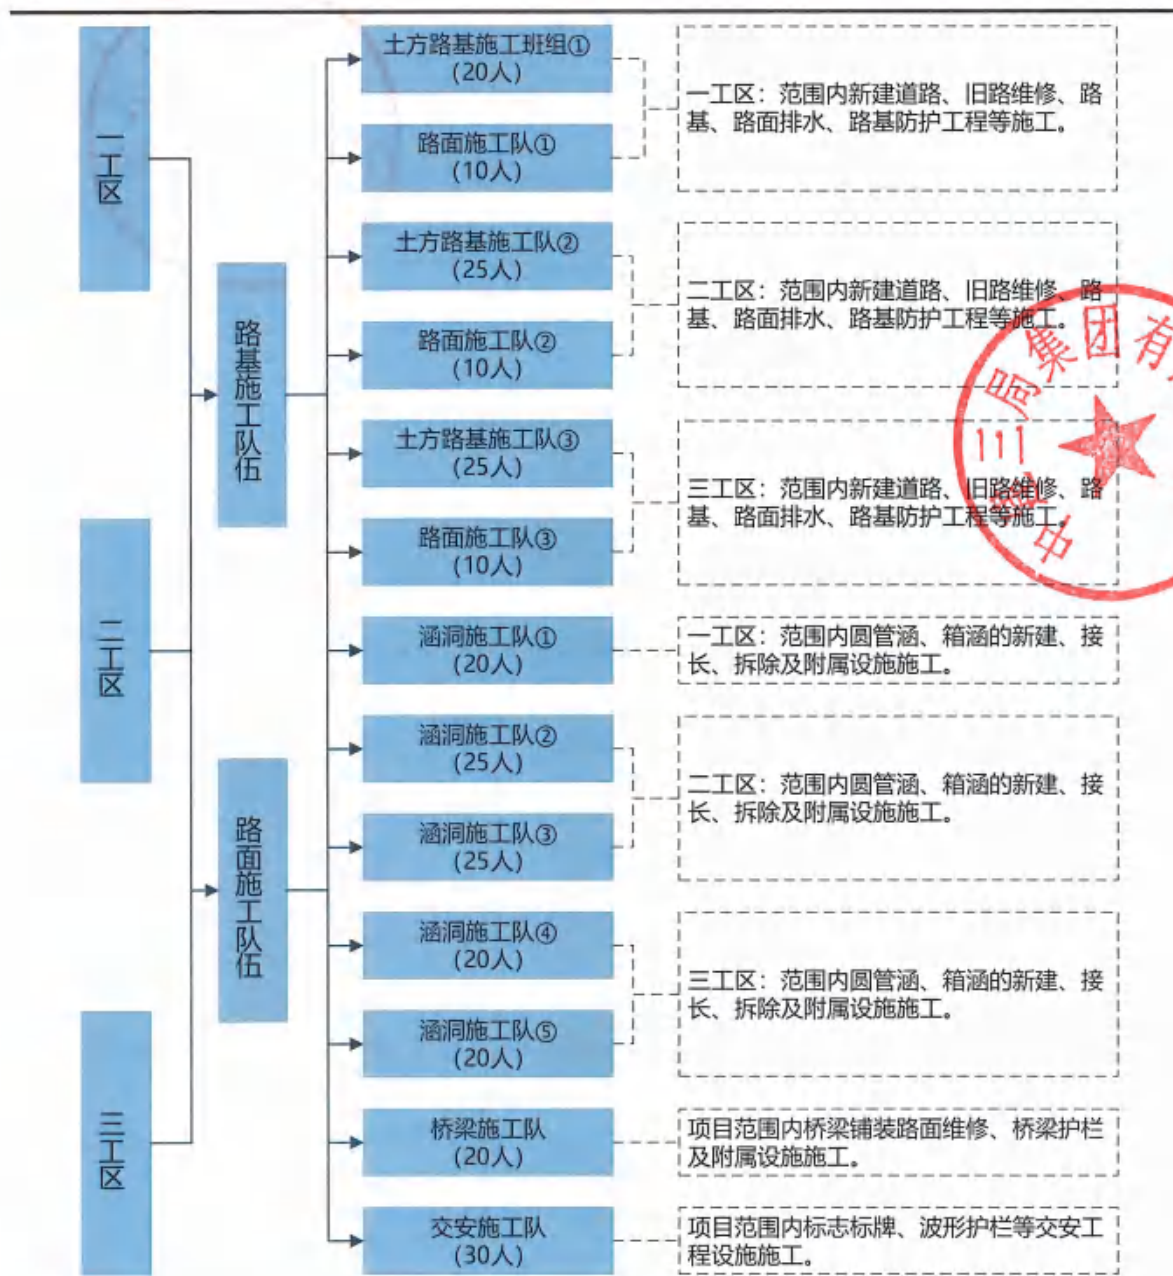


图1.2.3-1 作业队伍及工点

1.2.4 作业人数配置

表1.2.4-1 劳动力配置计划表

时间		工种									合计
		普工	电工	钢筋工	木工	混凝土工	模板工	机械操作手	电焊工	测量工	
2025年	9月	40	5	60	20	60	60	20	10	7	282
	10月	60	5	60	20	80	80	20	10	7	342
	11月	40	5	40	20	60	40	20	5	7	237

10月为人数高峰期，最多为342人。

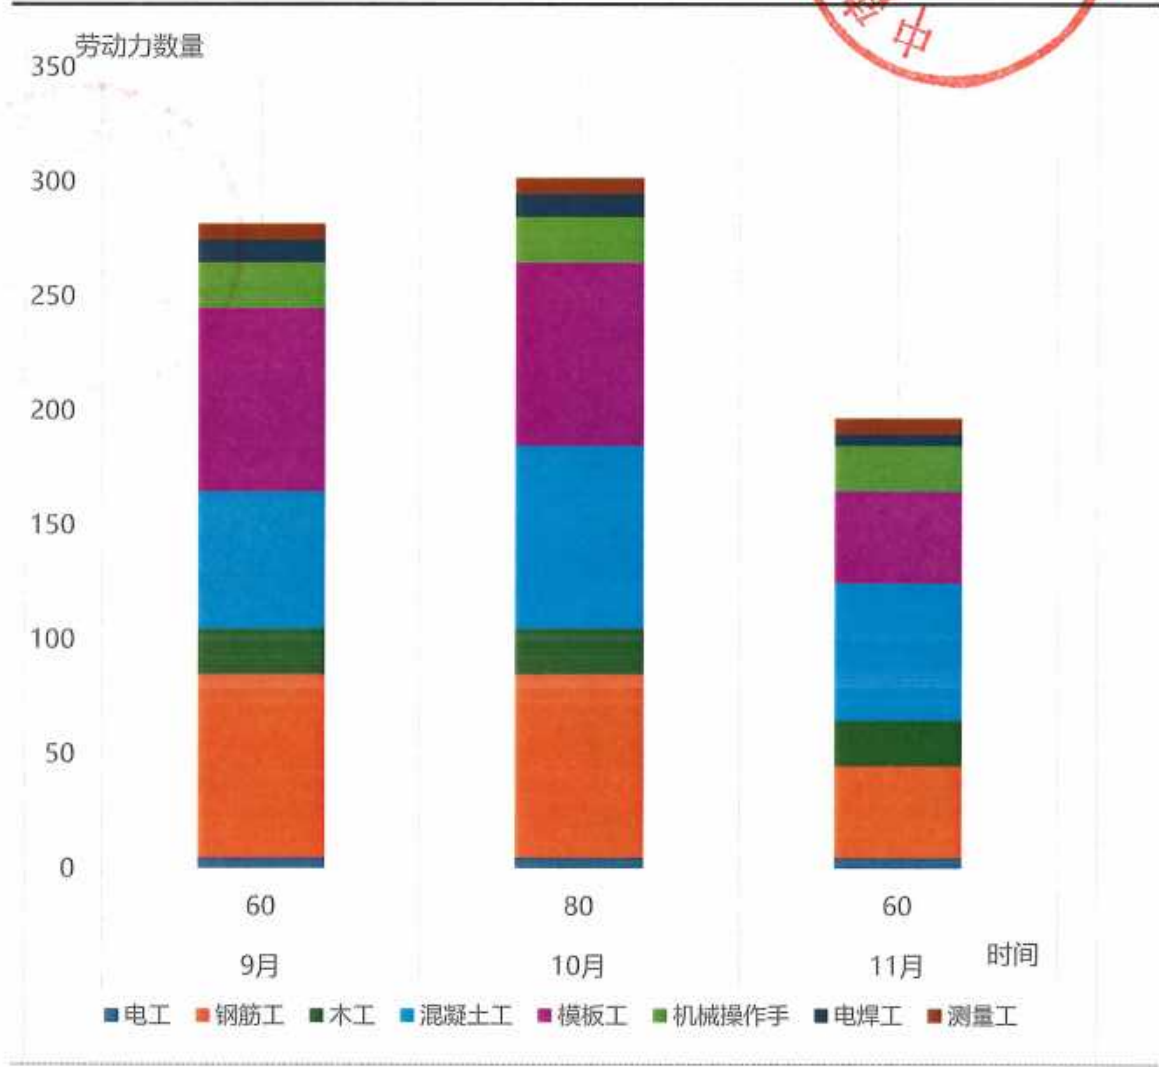


图1.2.4-1 作业人数配置图

在

▲

1

考虑项目施工范围、交通条件等,项目占地面积应不小于 100 m²) 作为项目。

1

20



四

1.2.5.2 工区管理点

考虑项目施工范围较大，三个工区相距较远，故在各工区单独设置管理点，租赁周边空置房屋并加以布置，满足工区常驻管理人员办公、生活需求。

工区管理点重点考虑交通便利性，根据项目施工点位分布，一工区管理点选择县道 X632 与包茂高速交叉口，二工区管理点选择省道 S277 与县道 X631 交叉口，三工区管理点选择五星路与高凉路交叉口，满足 30 分钟到达任意施工点的需求。

1.2.5.3 工人驻地

本项目施工工点呈现多区域分散分布的特点，各施工区域均不具备建设工人驻地的基础条件。为保障施工人员的住宿需求与安全管理，三个工区的工人住宿均采用在施工工点周边租赁民房的解决方案。

项目管理团队对民房租赁实施全程把控、严格筛选，确保房屋结构安全、消防设施齐全，组织专业人员对租赁房屋进行安全隐患排查与整改。建立完善的住宿管理制度，由专人负责日常管理，包括消防安全巡查、用电规范监督、环境卫生维护等工作。通过集中登记、统一调配、定期检查等措施，切实落实工人住宿安全管理，防范消防等各类风险，为施工生产提供坚实保障。

1.2.5.4 临时堆场

本项目施工钢筋、混凝土随配随用，不设堆场；圆管涵、交安等少量材料需设堆放场地，将与乡道公路同步施工，在交通疏解时予以考虑，根据材料用量封闭半幅用于堆放，不再单独设置硬化场地。

1.2.5.5 钢筋加工场

项目总钢筋用量预计 66.5 吨，根据项目施工范围及工区划分，评估各路线钢筋需求量及交通运输条件，由单个钢筋加工厂进行加工运输难以满足现场工作需求，故分别在一工区谢鸡镇 Y746 线 K3+636、二工区南塘镇 Y803 线 K4+122、三工区长坡镇 Y693 线 K0+000 设置三个钢筋加工棚，供应各工区钢筋生产需求。



图1.2.5-2 钢筋加工棚平面图

1.2.6 主要材料供应计划

表1.2.6-1 主要材料供应计划表

序号	主材	单位	数量	计划进场时间
1	C35 水泥混凝土	m ³	6817.2	2025/8/31
2	Φ14 拉杆	Kg	19754	2025/8/31
3	Φ28 传力杆	Kg	2855	2025/8/31
	路肩培土	m ³	1684	2025/8/31
4	C35 水泥混凝土	m ³	2596.6	2025/8/31
5	Φ14 拉杆	Kg	1087	2025/8/31
	Φ28 传力杆	Kg	4552	2025/8/31
8	钢筋	kg	37000	2025/9/5
9	混凝土	m ³	2000	2025/9/5
10	示警桩	个	580	2025/9/20
11	标志牌	m ³	181	2025/9/20
12	波形钢护栏	m	4586	2025/9/20
13	标线	m ²	6763	2025/9/20

1.2.7 主要设备供应表

表1.2.7-1 主要设备供应表


序号	设备名称	规格、功率及容量	数量	单位
1	小型压路机	10t	3	台
2	装载机	≥2m³	6	台
3	挖掘机	1.0m³	6	台
4	推土机	≥165kw	3	台
5	载重汽车	15t	10	辆
6	载重汽车	25t	3	辆
7	洒水车	10m³	3	辆
8	吊车	25t	2	台
9	混凝土搅拌运输车	10m³	6	台
10	混凝土泵车	SYM-620S	1	台
11	自卸汽车	20m³	10	辆
12	发电机	10kw	3	台
13	钢筋调直切断机	SWG12	3	台
14	电弧焊机	BX-200	6	台
15	数控钢筋弯箍机	GT6-14	3	台

1.2.8 临时工程用地计划

表1.2.8-1 临时工程用地计划表

序号	工程名称	位置及桩号	土地类别及数量	需用时间	备注
			旱地(平方米)		
1	一工区钢筋加工棚	谢鸡镇 Y746 线 K3+636	200	2025 年 8 月至 2025 年 11 月	
2	二工区钢筋加工棚	南塘镇 Y803 线 K4+122	200	2025 年 8 月至 2025 年 11 月	
3	三工区钢筋加工棚	长坡镇 Y693 线 K0+000	200	2025 年 8 月至 2025 年 11 月	
合计			600		

1.2.9 施工总平面布置

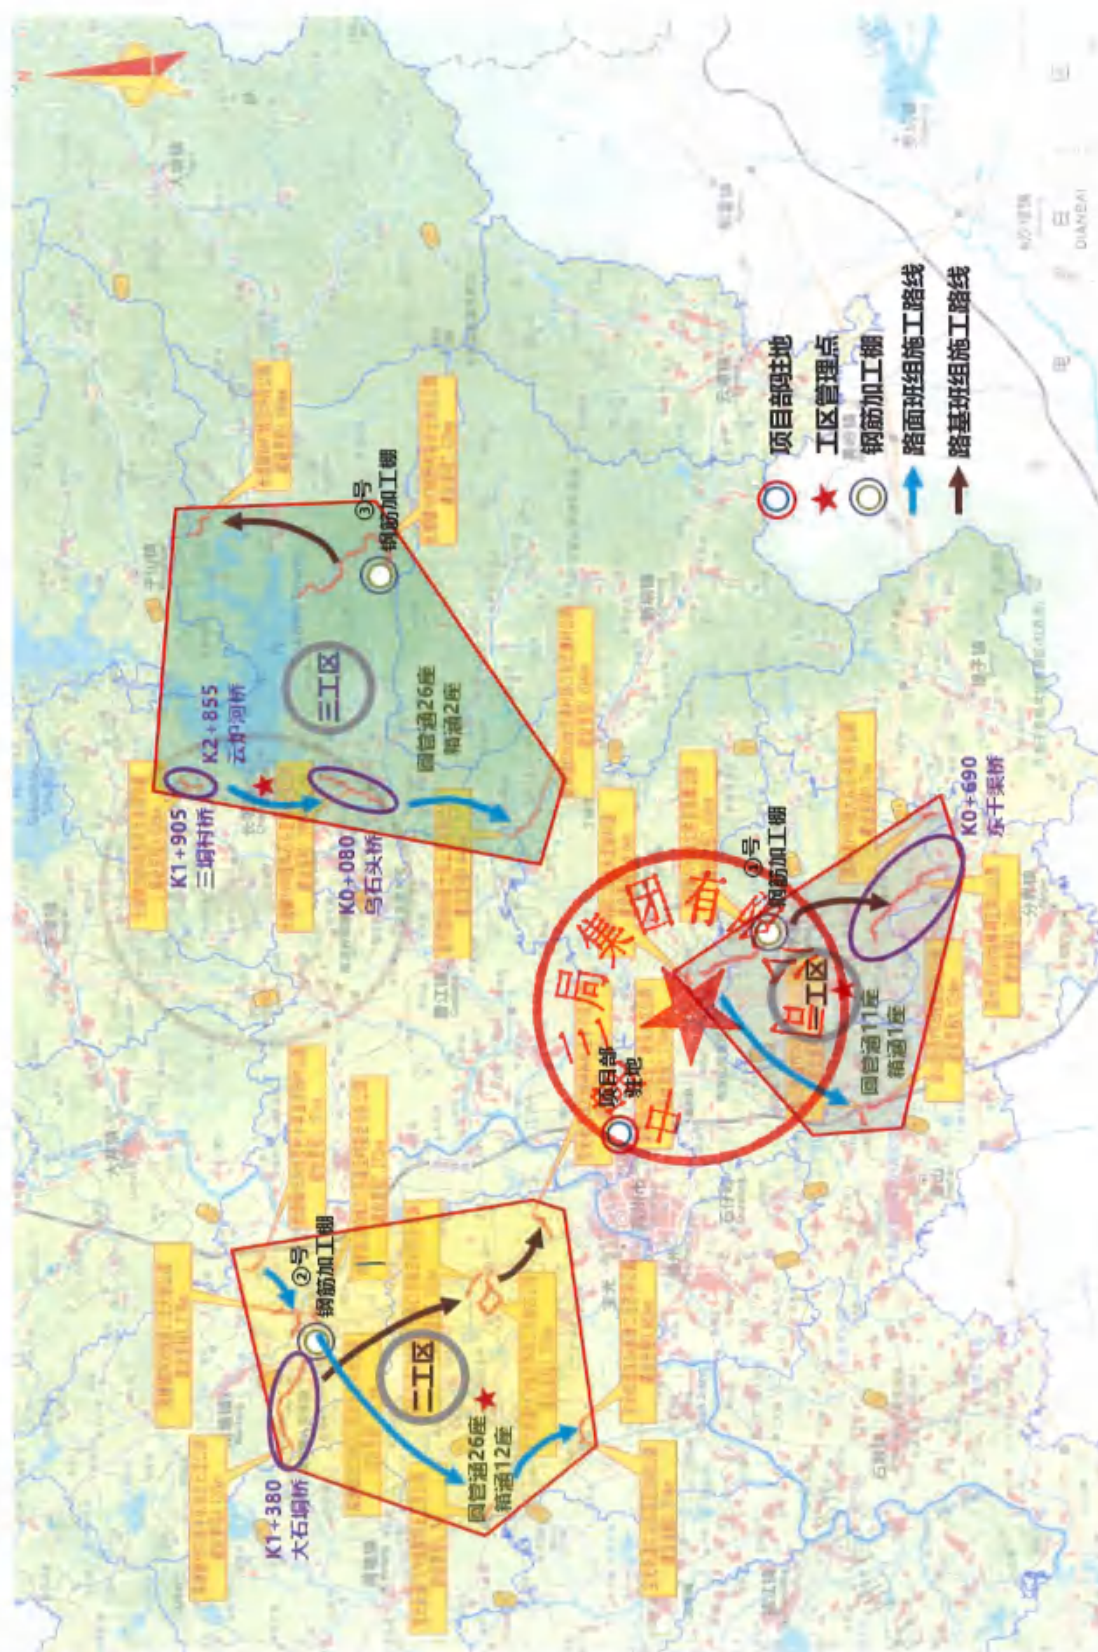

高州市2025年东北部农村公路改造工程总平面布置图



新地修复。

對德場三國美卡。隨十七日歐戰四時本

渠川、新坎坪等。新坎坪渠，新修渠长120米。

设置1个桥隧队任由一工区管理。二、三



项目经费用部及工区管理点。

通过现场量测, 结合本工程跨度大、作业点分散的特点, 项目

[illegible]

明細加工費:

根据《四川省公路工程施工安全技术规程》(DB51/T 1153-2017)的要求,高速公路施工安全技术交底应遵循以下原则:



精工製作

[illegible]

一工区安排十個涵洞施工队伍，二工区安排六個涵洞施工队伍，三工区安排两个涵洞施工队伍，共計三个涵洞。根据施工进度开展工程进展情况，在竣工之前，各涵洞的施工情况已告一段落。

右岸涵洞：涵洞自年初开始施工，与左岸涵洞同时施工，至五月底完成全部涵洞施工。



“五一”劳动节

[illegible]

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

1.3 施工进度计划

1.3.1 工期总目标

计划 2025 年 8 月 30 日开工，2025 年 11 月 27 日完工，工期 90 日历天。

1.3.2 关键线路工期安排



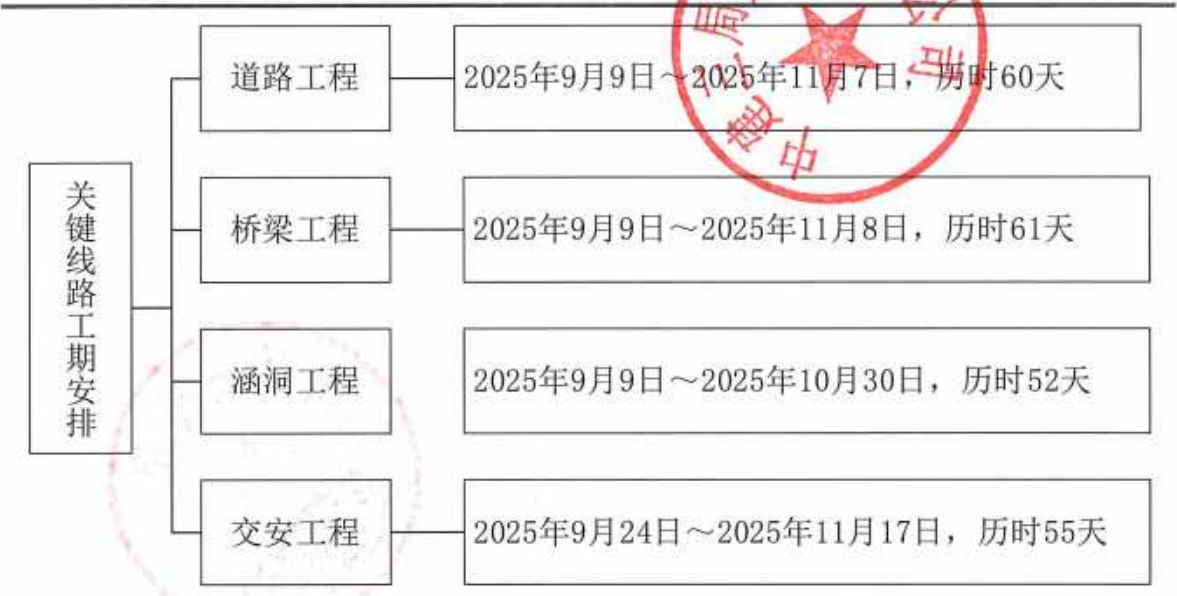


表1.3.2-1 关键线路工期安排

1.3.3 各分项工程工期安排

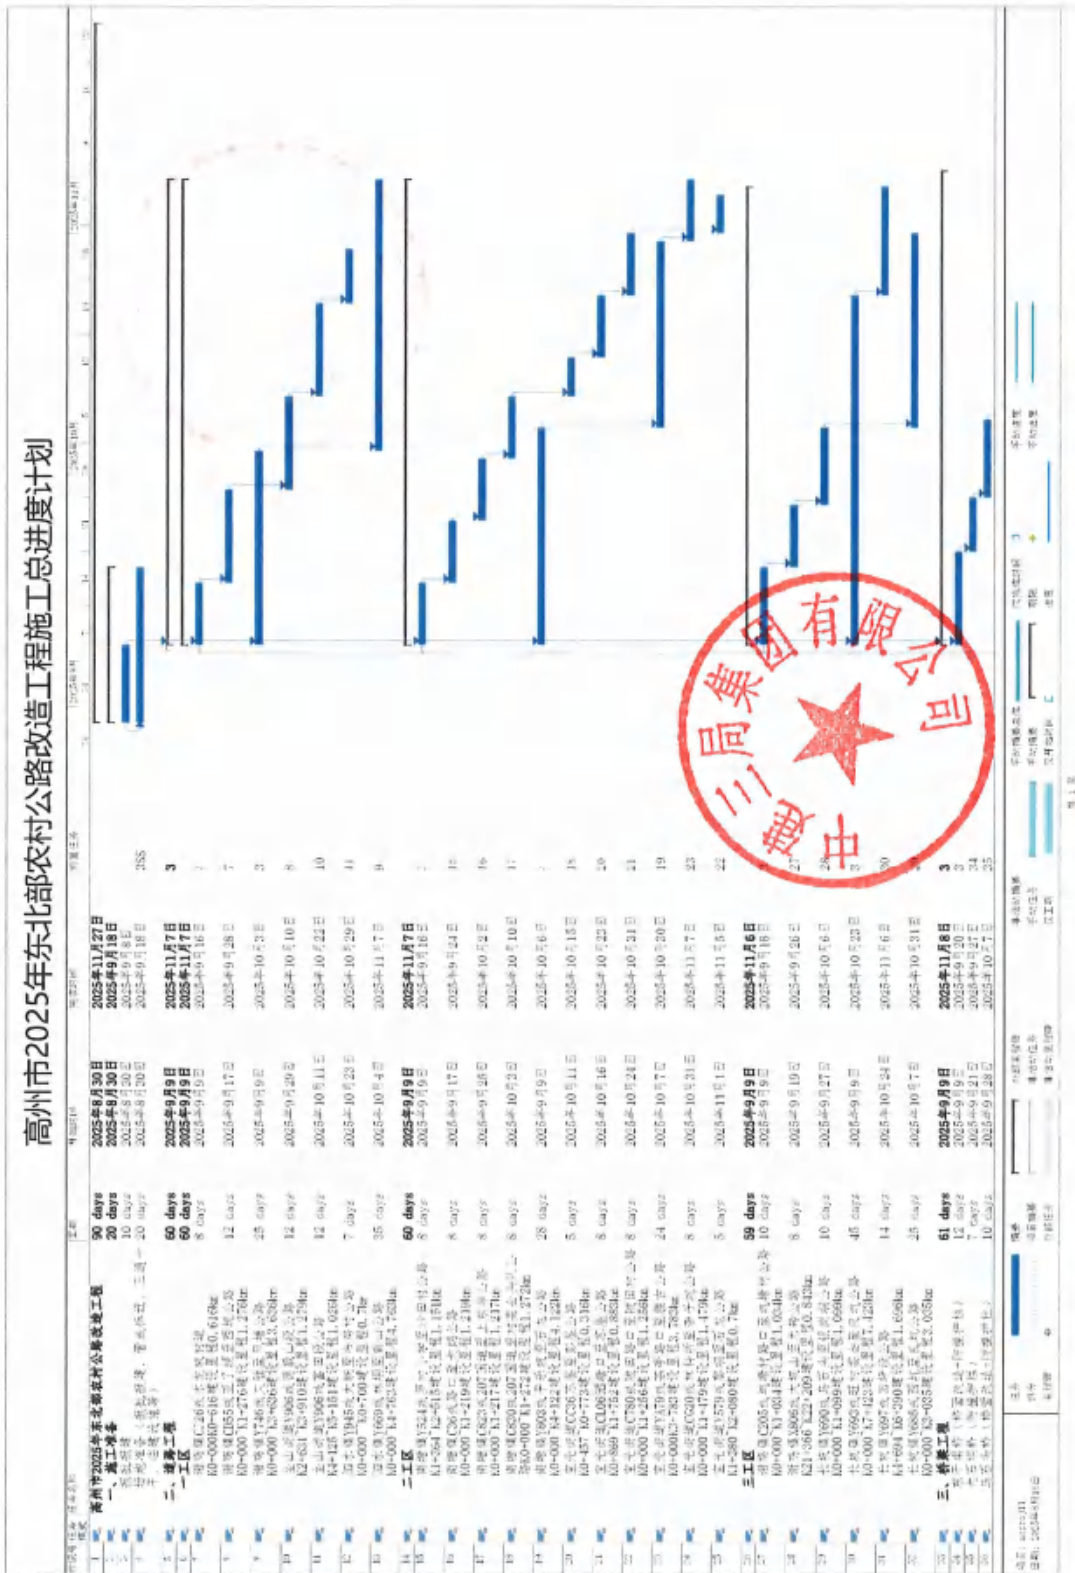

高州市2025年东北部农村公路改造工程施工总进度计划

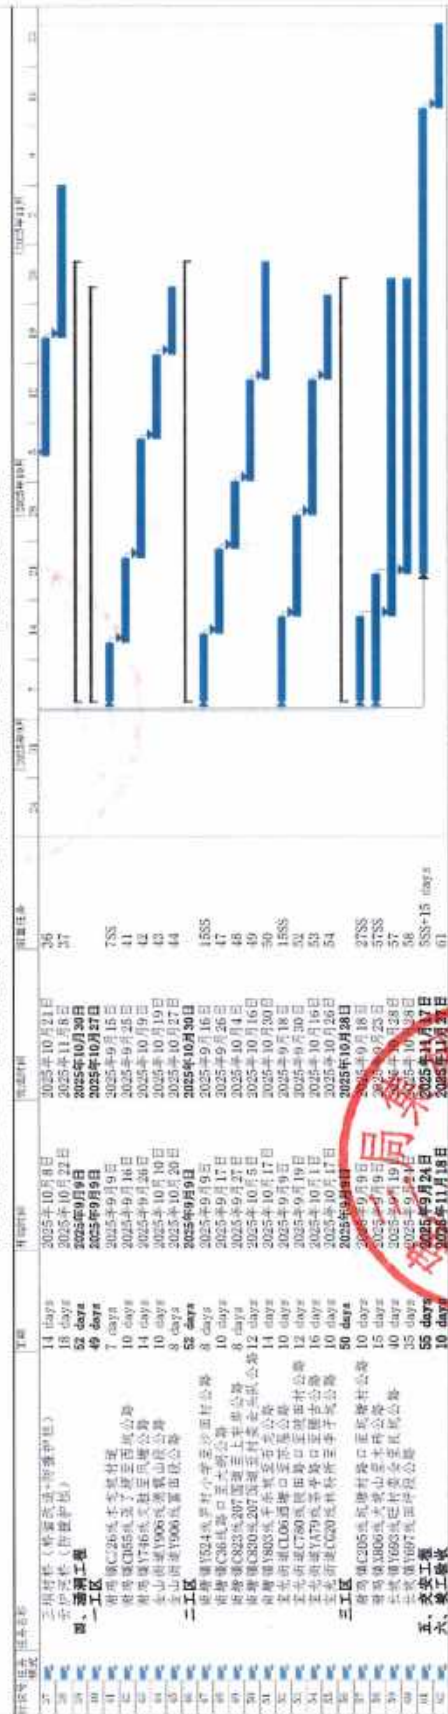

第2章 主要工程项目的施工方案与技术措施

2.1 路基工程

2.1.1 清表

工程概况	在路基开挖或填筑前，先清除表层耕植土、腐殖土等，清表厚度按 20cm 计，共计清表 7197m ³ 。	
施工方法	根据施工范围，对该段路基用挖掘机进行清表，清除的表土应结合临时堆放场集中堆放，以用于边坡绿化。	



2.1.2 路基土石方

工程概况	路基土石方	路床处理	铺筑路面前对路床进行CBR 值和压实度检测，上路床30cm范围要求CBR值不小于5%、压实度不低于94%，否则换填30cm。
		涵背回填	圆管涵、盖板涵开挖坡度大于1:1，底部设碎石垫层，管涵设混凝土包封，两侧回填砂砾土，分层对称夯实，每侧长度不小于洞身填料高度2倍，压实度 $\geq 96\%$ ，涵顶填土0.4~0.9m。
		旧路破除	水泥路面破碎板及中等、严重裂缝板需换板修复处理，挖除原路面20cm厚混凝土板，共计12953m ² 。
		路基防护	C20混凝土挡土墙埋置深度：土质地基 $\geq 1\text{m}$ ，岩质地基 $\geq 0.5\text{m}$ 。墙背填料采用透水性良好的砂砾类土，轻型机具分层夯实。
		路基挖方	当边坡高度 $H \leq 12\text{m}$ 时，只设一级边坡，土质边坡坡率1:1，石质边坡根据地质条件，坡率1:0.3~1:0.75。当边坡高度 $\geq 12\text{m}$ 时，维持现状不改造，在具备条件位置设置错车道。
		路基填方	填方高度 $H \leq 8\text{m}$ ，边坡坡率1:1.5； $8\text{m} < H \leq 12\text{m}$ ，上面8m 1:1.5，下面1:1.75。 $H \geq 12\text{m}$ 时，维持现状不改造，在具备条件位置设置错车道。

施工 方法	路基挖方	(1) 采用挖掘机挖装，自卸汽车运输，推土机配合的机械化施工方法。 (2) 不同的路段采取不同的施工方法，对较短的路堑采用横向开挖法，路堑深度不大时，一次挖到设计标高。 (3) 路堑施工采用“分级开挖、分级防护”的原则，自上而下，开挖一级，防护一级。	 
	路基填方	(1) 采用挖、装、运、平、压等大型设备，按“三阶段、四区段、八流程”方法施工，采用水平分层填筑法。 (2) 路基两侧超填部分应与路基一起分层填筑压实，不得出现贴坡施工情况。压路机安装智能碾压设备，实时检测碾压质量。 (3) 施工两作业段的交接处，若不在同一时间填筑，先填筑的路段按1:1坡度分层留台阶，若两路段同时铺筑，则应分层互相衔接，其搭接长度不得小于3.0m。	 

2.1.3 路基防护

工程 概况	边坡防护以生态植被防护为主，道路边坡型式采用弧化处理，填方边坡设计成过渡均匀的弧形，挖方边坡在边坡的坡顶和边坡的坡脚进行圆弧化处理。一般路基段坡面采取自然复绿。 混凝土防护有混凝土护肩或仰斜式路肩挡土墙两种，总长 385m，采用 C20 混凝土浇筑，C20 混凝土共计 1415m³。
----------	---

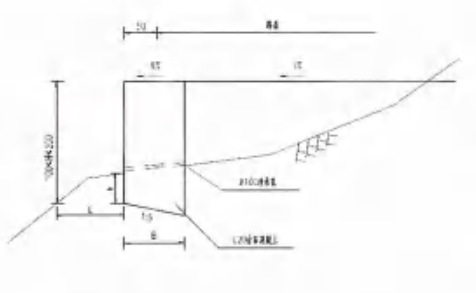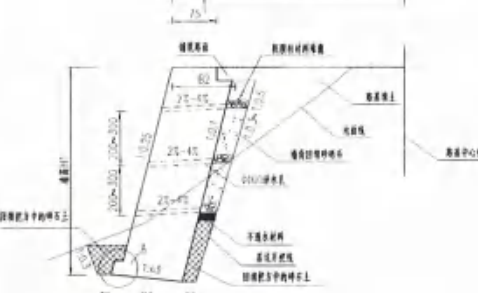
		
	图2.1.3-1 混凝土护肩	图2.1.3-2 仰斜式路肩挡土墙
	基础采用挖掘机开挖，混凝土采用沿槽分层进行浇筑，挡土墙纵向每 10~15m 长设一道沉降（伸缩）缝，缝宽 2cm，沉降（伸缩）缝必须垂直且全断面断开，并在缝内填塞深度大于 15cm 的沥青麻絮。施工时待墙体圬工强度达到设计强度 80%以上，墙背填土方可用轻型机具分层夯实，以确保墙体稳定；挡土墙基础部分基坑施工完成后，必须回填夯实。	
施工方法		

2.2 路面工程

工程概况	20cm 厚 C35 混凝土面层，路面拓宽、路面挖补、错车道路面均采用该路面结构，面层混凝土总量 34086m³。 既有水泥路面加宽，加宽宽度一般在 0.5~3.0m，横缝尽量与原老路混凝土面板贯通。纵向接缝采用设拉杆的假缝形式，拉杆采用 $\Phi 14$ 螺纹钢，设在板厚中央，并应对拉杆中部 10cm 范围内进行防锈处理，拉杆长 70cm、间距 90cm。纵缝上部锯切槽口灌塞填缝料。
------	---

施工方法	混凝土面层 (1) 面层C35混凝土购买自当地口碑良好的混凝土拌合站，确保混凝土供应稳定、质量可控。 (2) 摊铺机采用带DBI装置的滑模摊铺机，半幅路面一次摊铺成型，利用配备自动抹平板装置抹平。 (3) 刻槽机抗滑纹理做毕，应立即开始保湿养护。 (4) 未达到设计强度前，不得开放交通。	
-------------	--	--


2.3 排水工程

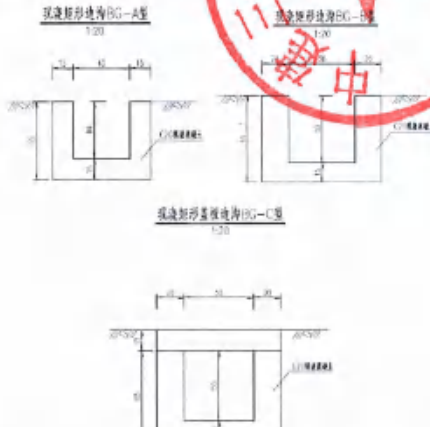工程概况	边沟：共有三种规格，BG-A、BG-B 型为矩形敞开式边沟，BG-C 型为矩形盖板边沟，长度共计 12248m，沟身 C20 现浇混凝土 3010m³，预制盖板 C30 混凝土 44.2m³，挖基土方 5225m³。	
施工方法	排水系统：采用机械开挖沟槽，吊车配合人工拼装钢平模，浇筑时采用吊车配合料斗浇筑，按沉降缝位置分段现浇的施工方法。  	

2.4 交安工程

2.4.1 交安设施

工程概况	(1) 标线：热熔式 6143m²，震荡式 620m²。 (2) 标志标牌：181 个。 (3) 波形护栏：Gr-C-4E 4586m。 (4) 轮廓标：De-Rbw-At1 466 个 (5) 道口标注：Vc-IP-E 244 根。 (6) 警示桩：Vc-Wp-E 580 根 (7) 凸面镜：单柱式 24 个。 (8) 爆闪灯：太阳能 18 个。	
施工方法	(1) 标线：采用人工清洗路面后，热熔划线机施工，两种不同粒径的玻璃珠采用双撒布器工艺进行施工。	
	(2) 标志标牌：标志标牌基础采用小型挖机开挖基坑，加工制作好的立杆和标志牌采用吊车配合人工现场安装的施工方法。各类型反光膜采用数码打印膜工艺打印。	
	(3) 护栏：成品波形护栏采用运输车运至现场后，用多功能护栏打桩机进行打桩安装，维护清洗采用波形梁钢护栏清洗设备。中央混凝土护栏在预制场预制，板车运抵现场人工配合机械安装，渐变段位置采人工安装模板、钢筋，料斗浇筑砼。	

(4) 轮廓标: 采用双向双色轮廓标, 其反光片颜色: 行车道左侧为黄色, 右侧为白色。直线段按 50m 间距、曲线段按 20m 间距 (根据道路曲率加密) 放样, 距路面高度统一为 60cm, 确保纵向线性平顺	
(5) 道口标注: 每处交叉路口两侧各设两根, 地面以上部分贴红白间隔反光材料, 每箍 20 厘米。	
(6) 示警桩: 示警桩柱体为镀锌钢管, 管内灌注 C20 水泥砼, 表面涂以黄黑相间的反光膜 (顶端为黄色)。 示警桩外侧路基坡面应用与路缘石相同的材料和厚度, 现浇混凝土以稳定示警桩。 示警桩安装间距为 6 (4)m, 直线段为 6m, 小半径段为 4m。	
(7) 凸面镜: 基础采用小型挖机开挖基坑, 加工制作好的立杆和凸面镜采用吊车配合人工现场安装的施工方法。凸面镜采用 $\Phi 800\text{mm}$ 形式	
(8) 太阳能爆闪灯: 基础采用小型挖机开挖基坑, 加工制作好的立杆和爆闪灯采用吊车配合人工现场安装的施工方法。	

2.5 四新技术运用

2.5.1 路基工程四新技术运用

序号	项目	内容	照片
1	智能碾压设备	配备振动传感器、行走记录仪的智能碾压设备,实现对整个碾压面压实质量的实时动态检测与控制。项目路基施工中将采用此项技术对路基压实进行实时监测。	
2	无人机土石方测量	通过无人机采集高清影像数据,准确模拟地形,土石方量测理论误差明显减小。项目进场后地形地貌复测、土方复核采用此技术完成。	

2.5.2 路面工程四新技术运用

序号	项目	内容	照片
1	高压水力破除混凝土工艺	采用高压水力破除,具有低噪声、无扬尘、安全高效的优势。本项目部分道路区域拆除拟采用此工艺,保护环境。	

2.5.3 涵洞工程四新技术运用

序号	项目	内容	照片
1	涵洞拉杆孔封堵施工工艺	涵洞拉杆孔封堵施工工艺主要应用于涵洞墙身拉杆孔封堵,提升墙身混凝土外观质量。本项目盖板涵拉杆封堵将采用此法。	

2.5.4 交安工程四新技术运用

序号	项目	内容	照片
1	双撒布器工艺	该工艺可以更好地控制宽级配玻璃珠撒布器的撒布不均匀性,既保证了撒布量,又保证了撒布的均匀性,标线施工拟采用此法。	
2	数码打印膜工艺	数码打印技术是依据《道路交通反光膜》(GB/T18833-2012)中“反光膜应具有颜色的可印刷功能,将数字、图像等通过油墨打印的方式使其附着在承印材料上的一种技术。本项目永久及临时标志标牌反光膜用此法打印。	
3	多功能护栏打桩机	多功能护栏打桩机,适用于各类路面,可以完成多种功能,如打桩、拔桩,在路基的稳定层上钻孔再打桩等。项目拟采用此法完成波形护栏桩基施工。	
4	波形梁钢护栏清洗设备	改(扩)建施工期间波形梁钢护栏使用周期长,采用清洗设备进行彻底清洗保洁。简易高效,确保了护栏板最终营运时洁净、无油污。	

第3章 重点、难点和关键工程施工方案

3.1 重难点工程施工方案

3.1.1 交通疏解

3.1.1.1 工程概况

本项目是对原高州市 CC36 线、CL06 线、C780 线、CG20 线、YA79 线、Y579 线、Y524 线、Y803 线、C823 线、C830 线、CN36 线、Y669 线、Y945 线、Y906 线德载山段、Y906 线富田段、CD55 线、Y746 线、CJ26 线、C205 线、X806 线、Y690 线、Y693 线、Y697 线、Y685 线共计 24 条线路改扩建。施工过程中要做好道路临时交通组织和保通方案设计，尽可能降低改扩建工程对老路交通的干扰、方便沿线群众出行、减少社会负面影响。因道路红线狭窄，在充分利用现有道路基础上，采用分阶段、分幅施工以便交通疏解。

3.1.1.2 工期安排

本项目交通疏解时间段主要为路基处理、路面改造、桥涵修复、交安工程等施工期间。交通疏解期间为：2025 年 9 月 9 日~2025 年 11 月 17 日。

3.1.1.3 交通疏解方式

交通疏解方案要做到：减少堵塞，确保畅通，安全施工。总体思路如下：

(1) 对于新建路段，从两侧推进依次全幅施工道路各结构层，利用周边现有道路进行交通导行、疏解。

(2) 对于改扩建路段，第一阶段先施工未通车半幅，确保既有道路正常通行。第二阶段待新建半幅路面达到通车条件后，将车辆导改到新建道路上，施工另外半幅。

(3) 改扩建路段跨桥涵部分，第一阶段先施工未通车半幅桥梁/涵洞，确保旧桥、旧涵正常通行。第二阶段待新建半幅桥梁、涵洞达到通车条件后，将车辆导改到新建路线上，施工另外半幅。

3.1.1.4 主要设备

表3.1.1-1 交通疏解主要设备

序号	机械名称	规格、功率及容量	数量	用途
1	洒水车	10m ³	2	洒水降尘
2	指挥车辆	皮卡	2	交通指挥、疏解
3	雾炮车	8m ³	1	洒水降尘
4	热熔釜	300kg×2	1	临时标线
5	划线机	CL-15DM	1	临时标线

3.1.1.5 交通疏解方案

(1) 交通组织管理措施

- 1、成立交通协调管理小组。为使交通组织方案全面落实、责任到人。
- 2、配置交通协管员 8 人，佩戴值勤袖章，手拿红旗，装备指挥旗和对讲机。
- 3、加强各封锁路口与施工现场的联系，配备对讲机和手提电话等必要的通讯器材。
- 4、做好施工人员的交通安全教育。

(2) 施工区段交通导行

交通疏解控制区一般分为下列六个部分：

警告区：警告区长度不小于 200m。警告区内每隔一定距离应设置有关标志。

过渡区：一般分上游过渡区和下游过渡区。当车辆行驶至上游过渡区时，车速应小于 30km/h，上下游过渡区长度不小于 15m。

缓冲区：缓冲区的长度应大于 20m。其与上游过渡区之间应设置道路封闭标志和设置路障。设置防撞水马、铁马、导向标志，路拦牌（带示警灯）、交通锥封闭施工车道。

工作区：作业区是施工作业人员活动和工作的地方。

终止区：终止区的长度不应小于 30m。设置交通锥，渐变解除封闭施工车道。

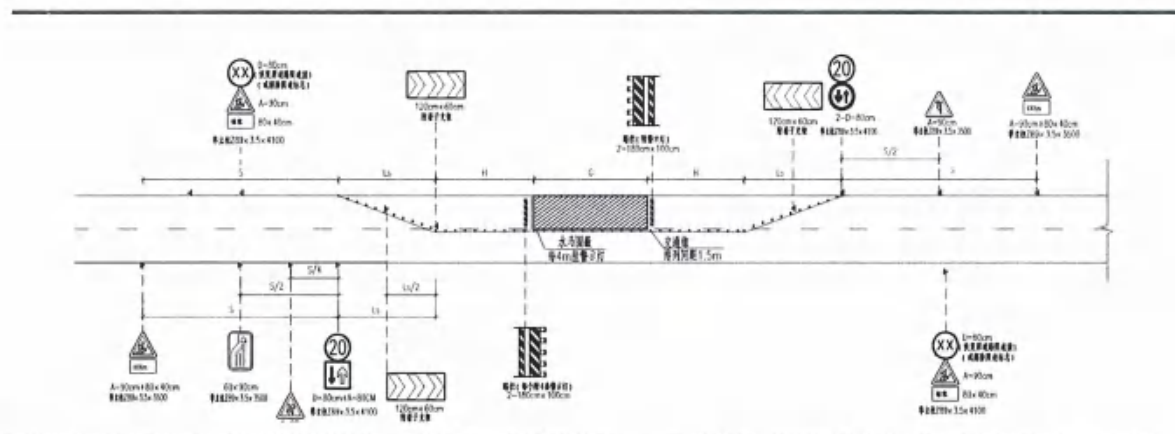


图3.1.1-1 占道施工交通导行形式①

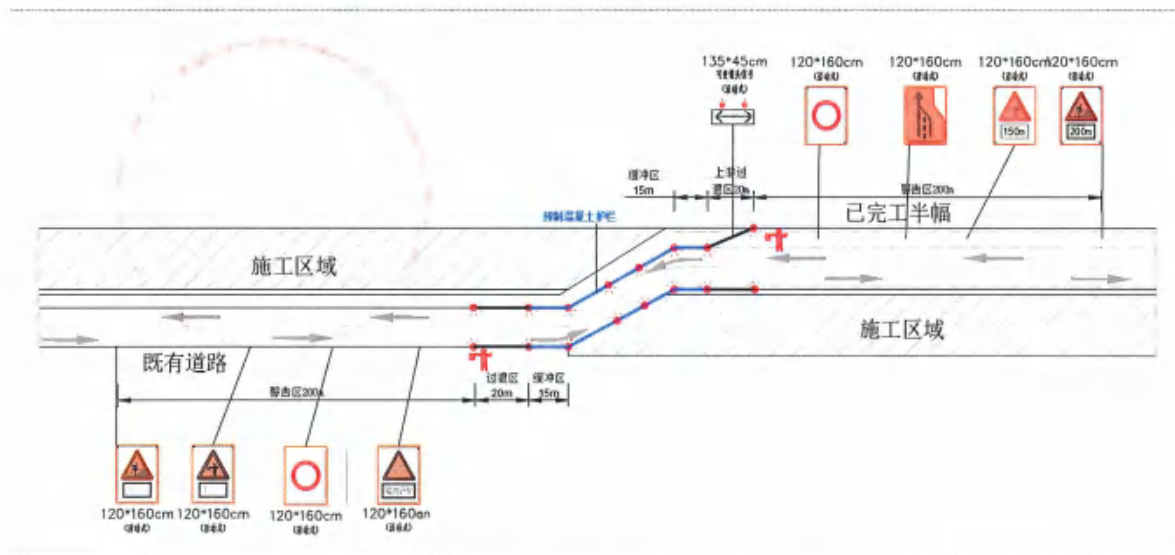


图3.1.1-2 占道施工交通导行形式②

3.1.2 旧桥破除修复

3.1.2.1 工程概况

大石垌桥、东干渠桥、乌石头桥、三桐村桥、云炉河桥桥面混凝土铺装破损，栏杆附属设施老化或断裂，进行附属结构修复，共计 20cmC40 混凝土面层改造 367.8m²，防撞护栏修复 320 米。

3.1.2.2 工期安排

工期：2025 年 9 月 7 日~2025 年 11 月 8 日，历时 61 天。



3.1.2.3 施工组织方式

先进行旧桥护栏拆除至现浇板顶，凿除旧桥面铺装，再重新浇筑护栏，护栏施工完成再新建 20cm 厚 C40 混凝土路面。


3.1.2.4 主要设备

序号	机械名称	规格、功率及容量	数量	用途
1	砼运输车	辆	2	混凝土摊铺
2	泵车	台	1	混凝土摊铺
3	三辊轴摊铺机	TBZDQ	1 台	混凝土摊铺
4	风镐	G20	4	拆除护栏
5	高压水混凝土破碎机	富森	2	路面破除
6	GPS	S82	1 台	定位
7	全站仪	TCR402	1 台	定位
8	水准仪	苏光 DSZ3	1 台	定位

3.1.2.5 主要施工方案

表3.1.2-1 护栏更新施工方案

项目	施工方法
----	------

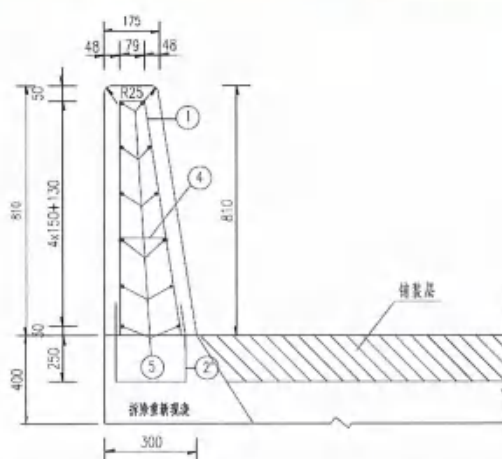

旧护栏拆除	采用人工配合小型机械拆除护栏，拆除护栏至现浇板顶。严禁使用炮机等大型机械设备和重型机械设备。
桥面清理	在浇注水泥砼桥面铺装前，必须保证预制梁顶面混凝土拉毛并清洗干净，。首先凿除梁顶浮浆、砂浆块等杂物，用水冲洗并用空压机吹干净。对凿毛深度不够、

项目	施工方法
	宽度不够的地方要重新凿毛。
钢筋加工及安装	钢筋加工全部在钢筋加工场进行集中加工，加工完成后再运输到施工现场进行焊接及绑扎，钢筋加工安排专人进行质量控制。 D10 冷轧带肋朝：网采用 CRB550 钢筋制作；施工时应在全联焊网连续不得断开，焊网搭接采用平搭法。
模板安装	模板采用在现场拼装，按照模板长度进行调整，分节段进行安装。模板安装之前首先清理、打磨模板，保证模板表面无污物、砂浆等杂物，清理干净后涂抹脱模剂，脱模剂不能用废机油等不合格材料，保证混凝土外观质量以及易于脱模。
混凝土浇筑	护栏采用 C30 混凝土，浇筑采用罐车运输，吊车吊斗到模板内进行浇筑。混凝土采用集中拌合，混凝土罐车运至现场进行浇筑。

图3.1.2-1 桥面铺装施工方案

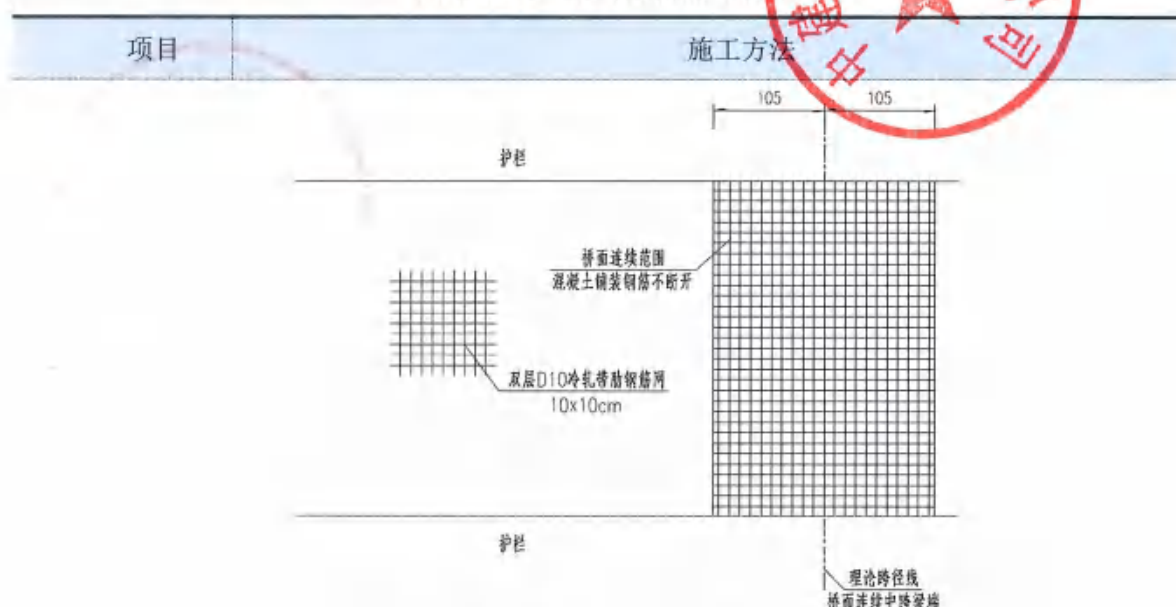


图3.1.2-2 桥面铺装示意图

旧桥面拆除	采用人工配合小型机械拆除路面，拆除护栏至现浇板顶。严谨使用炮机等大型机械设备和重型机械设备。
桥面清理	为使护栏与梁板紧密结合，梁板顶面要彻底清理干净。首先凿除梁顶浮浆、砂浆块等杂物，用水冲洗并用空压机吹干净。对凿毛深度不够、宽度不够的地方要重新凿毛。
焊接钢筋网绑扎	D10 冷轧带肋朝临网采用 CRB550 钢筋制作；施工时应在全联焊网连续不得断开，焊网搭接采用平搭法。钢筋网吊运上桥面按设计图纸搭接绑扎。

项目	施工方法
设立振捣梁轨道	砼振捣梁轨道采用三排槽钢 5 沿桥纵向铺设在预埋支撑螺杆上，沿护栏和护栏底座分别向内侧 1 米处预埋布设轨道支撑螺杆，桥面中间设置一道支撑螺杆，支撑螺杆由 $\Phi 10$ 钢筋制作。为保证振捣梁轨道具有足够的刚度和稳定性，轨道每 0.5 米布设一道支撑螺杆。支撑螺杆预埋结束后，严格按照测量班提供的高程数据调节下螺帽确定标高，轨道槽钢 5 按支撑螺杆开孔，铺设在螺帽上，其顶面高程既是桥面铺装砼的控制标高。轨道槽钢内用土工布塞满，防止混凝土进入槽钢，减少拆除轨道时的工作量。三条轨道的平整度、高程、纵坡和横坡的坡度等级技术要求都严格控制在桥面铺装对应的各项技术标准内。
调整保护层、固定钢筋网	振捣梁轨道铺设完毕后，在同一里程桩号振捣梁轨道顶带线调整钢筋网的平面位置，调整是钢筋网顶面距拉线垂直距离 3.2cm，并将钢筋网与预埋保护层钢筋点焊连接牢固。钢筋网距轨顶拉线的垂直距离按照钢筋网保护层技术标准控制。
混凝土浇筑	桥面铺装采用 C40 防水砼，坍落度 100mm-140mm。钢筋网绑扎锚固完毕后，测量人员对中线位置，轨道顶标高、轨道顶横纵坡进行复核，确认无误后即可浇筑砼。砼施工前需先将桥面板洒水润湿。



3.2 关键工程

3.2.1 涵洞工程

3.2.1.1 工程概况

本项目共设置圆管涵 63 道，其中接长 44 道、新建及拆除新建 19 道，管涵基础采用 C25 砼垫层及碎石垫层，洞口及墙身采用 C20 混凝土现浇，管涵外购 C40 二级钢筋混凝土管。盖板涵共 15 道，拆除新建 1 道、旧涵接长 11 道、旧涵增设护栏 3 道，洞口墙身、基础、铺砌、隔水墙采用 C20 混凝土现浇，涵身、基础采用 C30 混凝土现浇，碎石垫层，盖板采用 C40 混凝土预制。

3.2.1.2 工期安排

工期：2025 年 9 月 7 日~2025 年 10 月 30 日，历时 52 天。

3.2.1.3 施工组织方式

拆除重建涵洞：拆除原有涵洞的结构物，包括基础、涵身等，然后进行新建涵洞的基础、涵身、洞口等施工，并做好附属设施施工，如防水层、伸缩缝等。

涵洞接长：对原有涵洞基础进行检测，如有损坏，进行修复或加固。清除基础周围的杂草、杂物，确保基础表面平整。根据设计图纸，进行涵洞接长部分的施工放样，采用模板、支架等施工设备，对涵洞接长部分进行浇筑，严格控制混凝土配合比、浇筑速度和振捣密实度，做好混凝土养护工作。

3.2.1.4 主要设备配置

表3.2.1-1 设备配置表

序号	名称	型号	单位	数量	用途
1	发电机	台	3	50kW	
2	自卸车	辆	6	20m ³	
3	压路机	台	3	20t	
4	洒水车	辆	1	10t	
5	平板车	辆	2	/	
6	小型夯实机	辆	8	YZS0.6	
7	铲车	台	3	50	
8	挖掘机	台	3	CAT220	
9	吊车	辆	3	25t	
10	水泵	台	9	2.2kW	
11	插入式振动棒	台	12	50	
12	砼运输车	辆	12	12m ³	
13	泵车	台	3	/	

3.2.1.5 主要施工方案

表3.2.1-2 盖板涵施工方案

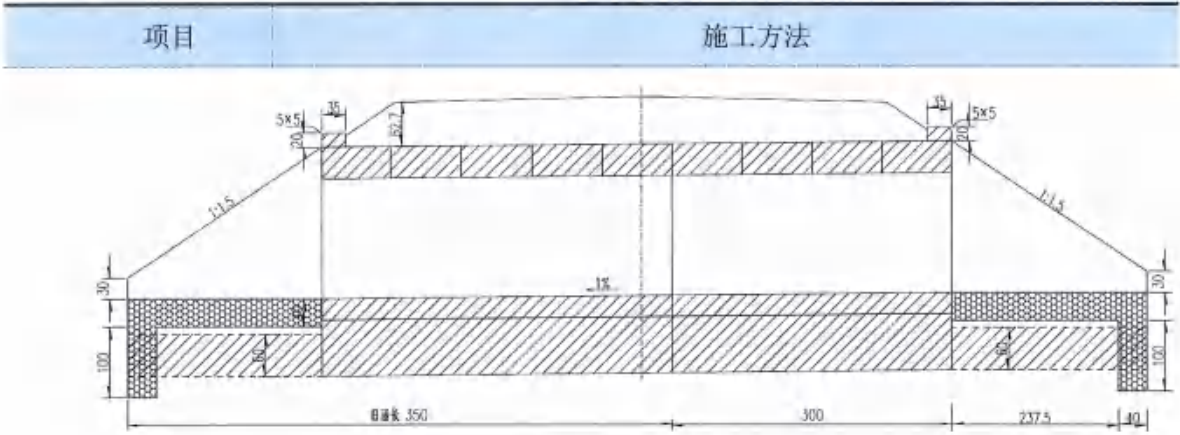


图3.2.1-1 盖板涵一般布置图

测量放样	用全站仪对涵洞基础进行测量定位。首先准确定出涵洞中心位置及进出口方位，再确定出开挖轮廓线，基坑四周设置控制桩控制基坑方位、尺寸、标高，控制桩设在比较稳固的位置，防止毁坏，便于施工过程进行复位。同时测量出开挖深度，测量放样需监理工程师检测合格后方可开始基坑的开挖。
基坑开挖	根据技术人员放样出的涵洞中线桩、涵洞基础大小、现场地质情况和放坡要求及基坑底的工作宽度（每边至少放宽 50cm），确定基础开挖位置，用石灰撒出开挖边线，现场测量原地面标高，计算出基坑下挖深度，并在开挖边线旁打好标高控制桩。涵洞基础采用机械开挖，开挖时严格按设计的尺寸进行，严禁超宽超深开挖，再用虚土回填。在基坑开挖的同时，应将涵洞端头八字墙基坑一并挖好，同时做好基坑支护和围挡工作。
垫层施工	基础处理采用砂砾垫层处理方式，处理后地基承载力满足设计要求，方可浇筑涵台基础，地基承载力采用轻型动力触探方法进行检测。
基础施工	基础模型采用组合钢模板一次拼装成型，混凝土水平分层浇筑，插入式振动器振捣密实，混凝土浇筑完毕，及时覆盖、洒水养生；拆模后经检验合格，及时回填基坑，填料和密实度均要符合技术规范要求。
涵身施工	基础混凝土施工完成并且混凝土达到一定强度后进行涵身施工，弹出涵身位置线，人工凿除涵身位置内的基础表面混凝土浮浆，并清扫冲洗干净，然后支立涵墙模板。涵洞墙身模板采用组合钢模板，钢管架支撑加固，模板支立要牢固、稳定、接缝严密、平顺，模板支立的平整度与垂直度必须满足规范要求。分层浇注，并振捣密实。浇注过程中派专人看护，防止模板漏浆、跑模。台身浇筑完成后顶面须拉毛，保证台身与台帽的连接。

项目	施工方法
台帽施工	台身与台帽接触面在台身施工时须预埋钢筋,让预埋钢筋伸入台帽。台帽所用的钢筋在钢筋加工场集中下料、加工,现场绑扎,自检合格后报监理工程师签字验收。支立模板时要准确测量出两台背墙之间净距,使盖板能够顺利吊装。然后支立模板,模板采用钢模板。最后浇筑混凝土,从一端向另一端一次性浇筑。
盖板施工	盖板采用现浇施工。 (1) 钢筋的加工、绑扎成型:钢筋统一在钢筋场地按图纸要求下料、弯曲、制作,严格按照规范要求进行焊接、绑扎,安装时做到尺寸准确。 (2) 模板的支立:模板采用木模板,同时应具备有足够的刚度以防浇筑混凝土时有明显的挠曲变形。模板安装前,在其表面涂刷脱模剂,不得使用易粘在混凝土上或使混凝土变色的油料。在支立过程中,要注意检查模板内侧是否与钢筋接触,以确保结构物构件有足够的保护层厚度。 (3) 混凝土的拌合、浇筑:严格按配合比进行配料,浇筑前先对模板进行检查,清除模板内的杂物、积水,模板如有缝隙必须填塞严密。在浇筑混凝土期间,应设专人检查模板、钢筋的稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。 混凝土浇筑采用分层浇筑,厚度不超过 30cm,采用插入式振捣棒振捣,插入点按梅花型或等边三角形布置,移动间距不应超过振捣器作用半径的 1.5 倍,棒头应插入下层混凝土 5~10cm,保证上下层的整体性,振捣过程中应使混凝土密实表面泛浆,不再有气泡冒出时,停止振捣,振捣棒应垂直提落,施工中应及时填写混凝土施工记录。 (4) 混凝土的养生:混凝土浇筑完成之后,待表面收浆后尽快对混凝土进行人工洒水养生,洒水养生最少保持 7 天时间,结构物在拆模前应连续保持湿润。
八字墙	出入口八字墙混凝土基础,满槽浇筑。八字墙墙身采用定型钢模板一次拼装成型,混凝土利用汽车吊运与人工配合入模,顶面一次浇筑到位,抹平收光,一次成型。混凝土浇筑完毕后,及时覆盖,洒水养生。 洞口铺砌、上游边坡检查梯浆砌片石按常规方法施工,并按设计和规范要求做好沉降缝,覆盖洒水养护。
沉降缝	沉降缝的防水措施在基础襟边以下,填嵌沥青木板或沥青砂,也可以用粘土填入捣实。
台背回填	涵台台后填砂应在盖板安装完毕后进行,并应严格按水平分层填筑碾

项目	施工方法
	压，对涵台较高、不易达到碾压效果的涵洞，采用在该范围内填筑碎石材料，并注意两边对称进行。

表3.2.1-3 圆管涵施工方案

项目	施工方法
----	------

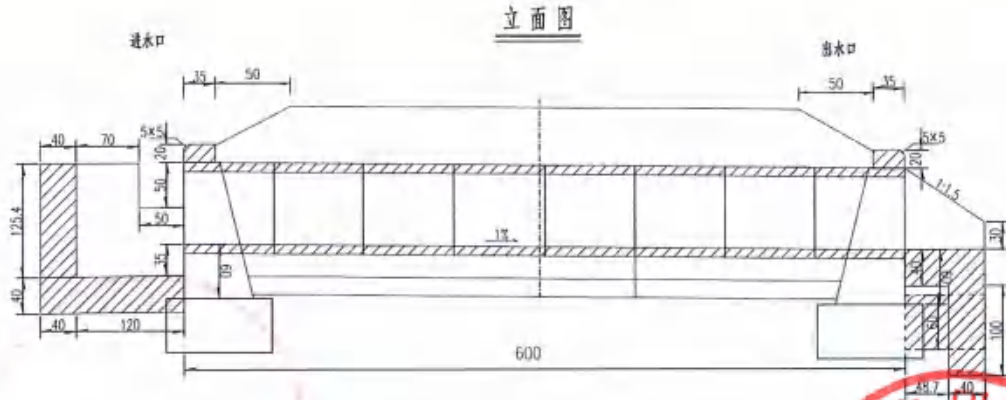


图3.2.1-2 圆管涵一般布置图

测量放样	圆管涵在施工之前，首先要通过测量放样来确定涵洞平面轴线位置、涵长以及施工宽度，并用石灰放出边线。
地基处理	在管座基础施工之前，必须对基础地基进行处理。进行基底的清理与整平，夯实至符合设计要求。
垫层施工	基础处理采用砂砾垫层处理方式，处理后地基承载力满足设计要求，方可浇筑涵台基础，地基承载力采用轻型动力触探方法进行检测。
基础施工	基础采用 C25 混凝土，混凝土基础分两次浇筑，管节安装后再浇筑管底以上部分的管座基础。此时应注意预留节壁厚度及安放管节座浆混凝土 2~3cm，待安装好管节后才浇筑管底以上部分混凝土。浇筑混凝土时应保证新旧混凝土的结合及节基混凝土与节壁的结合。
管节安装	涵管采用预制件。应待基础强度合格后方可进行管节安装。管节安装应先在基础上标示出涵管的中心线，并先安装进、出水口处的端部管节以控制涵管全长，然后逐节安装中部管节。并保持整体轴线不出现偏位。各相邻管节应保持底面不出现错口，安装时应用水平尺对接头处进行检查。相邻管节的接缝宽度应不大于 1~2 厘米。
接缝处理	为防止圆管接头漏水，应对接缝处进行防水处理。管节采用对头拼接，节间的缝隙外侧铺设两层油毛毡，内侧填充沥青麻絮，
洞口砌筑	洞口采用端墙式洞口（也称为一字墙洞口），用 C20 混凝土浇筑。端墙

项目	施工方法
	式洞口在端墙外用八字墙洞口。八字墙混凝土基础采用满槽浇筑。八字墙墙身采用定型钢模板一次拼装成型，混凝土利用汽车吊运与人工配合入模，顶面一次浇筑到位，抹平收光，一次成型。混凝土浇筑完毕后，及时覆盖，洒水养生。 洞口铺砌按常规方法施工，并按设计和规范要求做好沉降缝，覆盖洒水养护。
涵背回填	涵管每侧填土不少于两倍孔径范围内，需人工分层对称夯实其密实度不小于 96%。

3.2.2 混凝土路面

3.2.2.1 工程概况

本项目新建及维修道路面层均采用 20cm 厚 C35 混凝土，挖除原路面破碎板及中等、严重裂缝混凝土板 12983 m²，加宽新建 34086 m²，采用带 DBI 装置滑模机半幅一次摊铺成型。

3.2.2.2 工期安排

工期：2025 年 9 月 9 日～2025 年 11 月 7 日，历时 60 天。

3.2.2.3 施工组织方式

面层混凝土供应来自商品拌合站，混凝土通过罐车运至现场，采用带 DBI 装置滑模摊铺机摊铺，滑模速度控制在 1m/min～2m/min。根据混凝土单日最大供应量，单日最大可摊铺 500～600m（半幅）。缩缝拉杆、传力杆采用 DBI 插入装置法施工，胀缝传力杆应采用前置钢筋支架法施工，拉杆均采用 DBI 装置法安装。摊铺完成后，采用刻槽机施作抗滑纹理，及时保湿养护。

3.2.2.4 主要设备配置

表3.2.2-1 设备配置表

序号	机械名称	规格、功率及容量	数量	用途
1	水泥砼滑模摊铺机	带 DBI 装置	2 台	混凝土摊铺
2	混凝土搅拌运输车	10m ³	6 台	混凝土运输
3	钢筋调直切断机	SWG12	2 台	钢筋加工
4	数控钢筋弯箍机	GT6-14	2 台	钢筋加工
5	平板运输车	10t	1 台	材料运输
6	洒水车	10m ³	1 台	养护、降尘
7	雾炮车	8m ³	1 台	养护

3.2.2.5 主要施工方案

(1) 试验段

正式摊铺水泥混凝土路面前, 铺筑长度不小于 200 米的试验段。通过试验段检测: 试拌检验搅拌性能、混凝土配合比、滑模摊铺机的适宜参数、施工及设备操作人员熟悉并掌握各主要机械操作要领和全套施工工艺流程。

(2) 混凝土摊铺

1) 滑模摊铺机一侧履带行走在中央分隔带, 另一侧行走在土路肩。半幅面层一次性摊铺, 最大摊铺宽度 11.45m。

2) 摊铺机缓慢匀速前进, 前进速度控制在 1m/min~2m/min, 并根据混凝土稠度灵活调整速度和振捣频率, 如发现路面有过振、漏振的现象及时调整。

3) 人工将传力杆按一定顺序排放在布料小车的料槽内, 然后手动启动小车卷扬机, 小车便从 DBI 装置一侧沿着滑动轨道, 滑动到另一侧。在滑动过程中传力杆便自动落入卡槽内。启动另一侧卷扬机收回小车, 进行下一循环的布料。


4) 胀缝传力杆应采用前置钢筋支架法施工, 提前安装。

(3) 接缝施工

表3.2.2-2 接缝施工

项目	施工方法	构造图
纵向缩缝	(1) 面层半幅一次性摊铺, 仅需设置纵向缩缝。缩缝为假缝形式, 填缝料可采用聚氨酯焦油、改性热沥青等材料, 灌入深度 $1/3h \geq b \geq 2/5h$。 (2) 纵向缩缝处均设拉杆, 拉杆设在板厚中央, 平行顶面, 严格与行车方向垂直。最外侧拉杆距横向接缝的距离 b_1 不小于 10cm。 (3) 纵向缩缝拉杆通过人工配合滑模摊铺机 DBI 装置一次性安装。	纵向缩缝构造图
横向施工缝 横向缩缝	(1) 每日施工结束或者中断施工时, 必须设置横向施工缝, 位置尽可能选在缩缝或者胀缝处。 (2) 横向施工缝、缩缝需设传力杆, 传力杆设置在板厚中央, 平行于板顶面并严格与接缝垂直。 (3) 横向缩缝、施工缝传力杆通过人工配合滑模摊铺机 DBI 装置一次性安装。	
横向胀缝	(1) 胀缝处均应设置传力杆与支架钢筋。 (2) 传力杆设置在板厚中央, 可以自由滑动, 传力杆平行于板顶面并严格与接缝垂直, 传力杆套子在相邻板中交错布置。支架与横向架立钢筋均采用螺纹钢筋。	胀缝构造图

项目	施工方法	构造图
	(3) 胀缝传力杆应采用前置钢筋支架法安装。	胀缝传力杆布置图

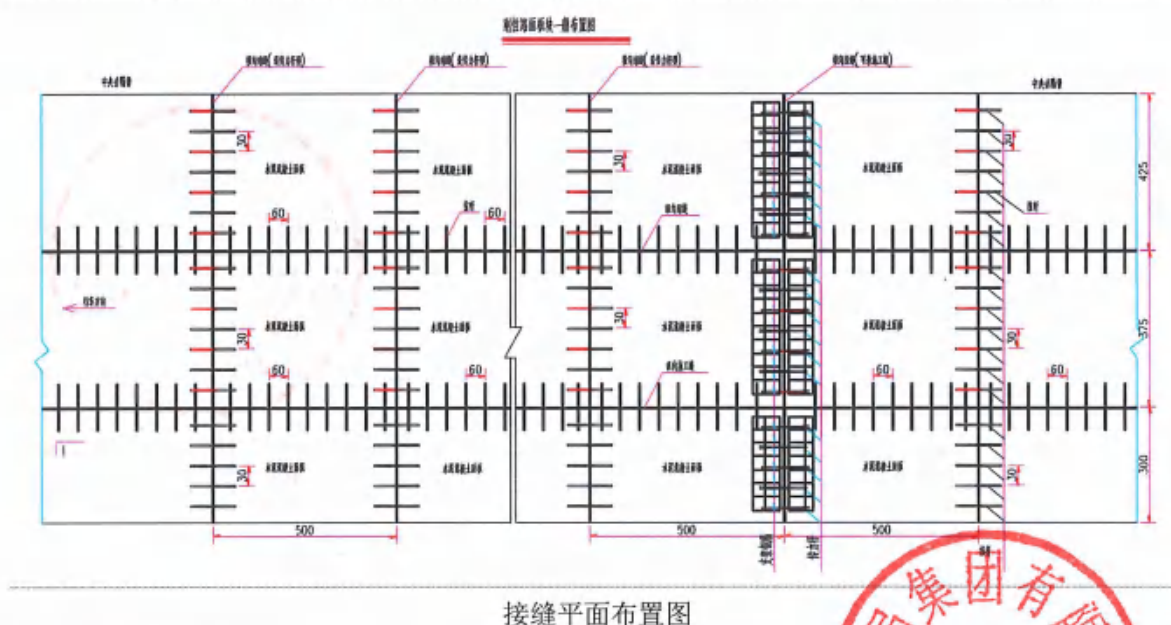

(5) 刻槽、养护

刻槽机适时制作纹理，使混凝土面满足抗滑要求，路面整幅纹理方向一致。达到初凝后及时养护。养护期满，达到混凝土设计强度后，方可开放交通。

第4章 工期保障措施

4.1 工期目标

我方承诺目标:2025 年 8 月 30 日开工（具体以开工令为准），2025 年 11 月 27 日竣工验收，总工期 90 日历天。

4.2 影响工期主要因素及相关应对措施

序号	影响工期因素及应对措施
1	征地拆迁 管线迁改 组建征拆工作小组，项目经理担任组长，项目班子成员全员参与，按权属单位分类开展征拆协调工作 进场后摸排项目红线范围内的征拆、迁改内容，厘清权属单位和对接人 根据征拆、迁改计划，督促各方及时组织征拆、迁改工作
2	季节性 施工 掌握气象资料，综合组织全过程的均衡施工，制定雨季、大风天气的施工措施 合理安排工序施工时间，在旱季完成受雨季影响重大的工序施工，是确保施工进度 现场设置完备的排水系统

序号	影响工期因素及应对措施
3	设备与材料供应 各类型施工机械按照充足、实用、配套、性能稳定原则成套配备，确保工期 各作业队在工地设配件库，备足易损配件，加强对设备的维修和保养 充分发挥机械施工效率高的特点，做到施工、保养统筹兼顾，关键控制性工程必须利用大型机械设备的优势，以缩短节点工期
4	施工组织与协调 有序组织施工，合理穿插作业，分区组织资源同步进行施工 按照施工先后顺序，均衡流水节拍，避免不必要的窝工 配备充足的人力、机械、物资等资源，提高计划的可实施性。在保障上道工序质量的前提下，下道工序提前插入施工
5	经验与技术水平 选用公路工程建设经验丰富的管理人员和施工队伍，确保更高效地完成施工任务 及时做好技术预案、施组以及施工交底等，并推进四新技术应用，降低施工难度，从而缩短工期

第5章 工程质量保证措施

5.1 工程质量管理目标

标段工程交工验收的质量评定：合格；

竣工验收的质量评定：合格。

5.2 工程质量通病及控制措施

5.2.1 路基工程质量通病及控制措施

序号	质量通病及预防控制措施
1	路基压实度不足 填料应经检验满足要求后，方可使用 控制填料含水率在最佳含水率$\pm 2\%$以内 填方路基应分层填筑，填筑厚度不得大于试验段总结是试验的厚度 分层填筑，分层碾压，控制好压实遍数，提高路基边缘带压实遍数，确保边缘带碾压频率不低于行车带
2	路基顶面开裂 认真调查现场并彻底清表，及时发现路基基底暗沟、暗塘，消除软弱层 彻底清除暗沟、暗塘淤泥，严格分层回填，严格控制压实度满足设计要求 严格控制路基基底施工质量，特别是软基、鱼塘、低洼路段

5.2.2 桥梁护栏工程质量通病及控制措施

序号	质量通病及预防控制措施
1	钢筋植筋抗拔力不足 选用专业钻孔设备进行钻孔。 加强植筋钻孔孔深、孔径过程检查。 选用空气压缩机清理植筋孔灰尘。 对要植入钢筋上的锈迹、油污进行除锈与清理。
2	混凝土外观质量差 混凝土拌和均匀，和易性好，加强混凝土坍落度检测 混凝土浇筑过程充分均匀振捣，且不得过振 选用脱模剂验证其效果，并涂刷均匀 墩柱混凝土下料高度超过2m设串筒 墩柱及盖梁模板缝采取贴止浆条 结构物成品加强保护，防止二次污损

5.2.3 涵洞工程质量通病及控制措施

序号	质量通病及预防控制措施
1	墙身几何尺寸偏差 - 提前进行技术交底，加强工序验收，模板安装完成后对照图纸复核，确保墙身的几何尺寸与设计一致 - 确保模板支撑具有足够的强度、刚度和稳定性 - 确保支撑牢固，浇筑时安排专人进行模板盯控，防止模板在浇筑混凝土时产生移位
2	混凝土强度不足 - 加强对砂石材料进场检测 - 浇筑墙身和盖板采用吊车，控制混凝土到场后的坍落度 - 加强外加剂相容性和稳定性检验 - 施工过程卸料高度不超2m，分层浇筑，加强混凝土振捣工作 - 浇筑完成后及时覆盖土工布，进行洒水养护工作

序号	质量通病及预防控制措施
3	涵背回填压实度不足 选用符合设计和规范要求的回填材料 涵背回填前，在墙身外侧做好分层回填刻度线，按分层厚度回填 涵洞两侧对称分层回填材料，分层压实 分层检测验收，合格后再进行下一层回填

5.2.4 路面工程质量通病及预防控制措施

序号	质量通病及预防控制措施
1	水泥稳定级配碎石基层松散 采用双拌缸拌和，提高基层混合料的均匀性 定期对拌和机计量系统标定，保证水泥的计量符合要求 摊铺好的碎石基层及时覆盖，加强洒水养生 水泥稳定级配碎石基层松散进行交通管制，养生期间禁止车辆在基层上通行

序号	质量通病及预防控制措施
2	路面拼接不良 摊铺扩建路面水稳层时,宜对既有道路水稳层铣刨台阶垂直面、水平面均匀撒布水泥净浆 防反射裂缝材料应铺设平整顺直并固定,保证宽度足够 拼接部位水泥稳定级配碎石基层摊铺、碾压过程中,应采用人工补料等方式 拼接缝位置空隙过大、碾压不密实。控制压路机碾压的速度、振动频率 合理选择软弱路床补强施工方案,并加强施工质量控制
3	水泥路面平整度不佳 加强后场材料管理,拌和前应抽检材料含水率 选用减水效果好、性能稳定的高效减水剂,保证混凝土施工和易性 施工过程中应做好施工组织,保持速摊铺,严禁过振,防止漏振 施工前仔细调试摊铺机械,施工后及时清洗维护。及时更换混凝土接缝材料,做好日常养护工作

5.2.5 交安工程质量通病及预防控制措施

序号	质量通病预防控制措施
1	标线工程: 1、涂料发黄、发污或褪色,划线后在涂料未干前受尘埃污染。 2、车辆油污、车轮胎制动致黑。 3、标线逆反射亮度系数不足。 4、标线脱落、起 泡、毛边。 加强原材料质量控制,通过首件制确定最佳配比 雨天、尘埃大、风大时停止施工 在涂料未干透凝结之前控制交通,不得故意碾压标线行驶 加强标线涂料及玻璃珠的质量验收 路面、下涂剂应完全干燥,控制施工温度
2	波形钢护栏: (1) 护栏立柱偏位。 (2) 护栏立柱打不下去,柱顶塌边、碎裂、变形。 (3) 护栏立柱有效埋入深度不足。 (4) 波形梁板不顺直,部件松动。 (5) 波形梁板高低起伏,平面线形不顺。 (6) 波形梁板烧焊扩孔安装。 放样准确,打入柱偏位时,应将其全部拔出,用路基土回填压实后,重新打入 遇到石头应前后避让或清除,打桩时控制好锤高和锤速 重视施工界面交接,加强高程和压实度控制 严格控制立柱的高程和位置,托架位置准确,安装要平顺、连续 严格按照控制点进行放样,安装立柱时加强对立柱间距的复核

序号	质量通病预防控制措施
3	混凝土护栏: (1) 混凝土护栏损边、掉角、蜂窝麻面、气泡、错台等。 (2) 混凝土护栏线形凹凸、起伏。 (3) 钢筋保护层合格率偏低。 通过首件制掌握合理拆模时间,拆模过程中注意对边角保护 选用合适的混凝土配合比,施工中严格控制水灰比、坍落度;严格把握振捣深度、间距、时间,及时养生 经常性地对模板变形情况进行检查,加强模板安装后线形和接缝位置检查及验收。严格控制保护层垫块安装数量和牢固性

第6章 安全生产保证措施

6.1 安全生产管理目标

严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无安全生产事故发生。

6.2 主要安全风险点及预防保障措施

序号	主要风险点及预防保障措施
1	临近构筑物及管线保护 编制详细拆除方案并专家评审后实施施工期间做好附近建（构）筑物、管线的监控量测工，数据异常时立即停止施工 作业现场外围设置警戒区，设立安全警示标志标牌，派专人值守本项目沿线与国防光缆、通讯管线及供水管多次平行或交叉，施工前应确定管线位置，做好防护措施，避免施工对管线造成影响 司机和指挥人员经过专业培训，并经有关部门颁发合格证后上岗作业，专机专人制定应急预案并进行演练，对可能发生的紧急情况制定应急预案
2	交通疏解 工程开工前，要对全体施工人员进行交通安全教育，切实落实交通疏解方案 在施工期内设立专职疏导员8名，成立交通管理小组，保证道路交通顺畅 施工区域导向车流采用铁马、水马、路锥相结合的方式，同时在迎车方向摆放警示牌、减速牌、导向牌、警示灯 施工作业人员必须穿反光衣、戴安全帽

序号	主要风险点及预防保障措施
3	临时用电 临时用电开关箱应按“一机一箱一闸一漏一锁”设置，严禁一闸多用、一漏多机 配电柜装电源隔离开关及短路、过载、电保护电器 临时用电工程应定期检查，电工必须持证上岗
4	恶劣环境施工 制定雨季、台风季节、高温季节、冬季及夜间施工的安全技术措施，并编制应急预案 储备特定环境施工时的应急物资，及时收集当地气象、水文等信息，并采取相应的预防措施 遇到大雨、雷雨、高温、六级及以上大风等恶劣天气时，立即停止高处露天作业、吊装、拆除作业及起重吊装等作业



第7章 环境保护、水土保持保障措施

7.1 环境保护、水土保持保障措施

序号	环境保护、水土保持保障措施
1	环境保护 - 严格按照属地扬尘治理要求做好相应管控措施 - 旧桥拆除后的混凝土经破碎处理后可用作便道填料,废旧钢筋可回收处理。桥下场地复绿、排水系统应与桥梁主体结构施工同步实施 - 路基施工完成后,路基预压卸载土方以及清理边坡的土方可用于回填土路肩培土、路外工程及美化绿化用土,多余土方可用于取土场回填 - 在拌合站、工地大门出入口设置洗车池和沉淀池,并配备高压冲洗水枪,对驶离工地的机动车辆冲洗干净,防止污染城镇道路 - 运输土方、砂石应采取遮盖措施。施工便道应经常洒水降尘,减少扬尘对沿线居民生产生活造成的影响 - 扬尘区域宜采取雾炮等降尘措施,减少对周边环境的影响

序号	环境保护、水土保持保证措施
2	水源保护 - 桥梁桩基施工期间，泥浆池应按“两池一墙”建设，不得向江河排放泥浆 - 拌合站、预制梁场生产废水需经过处理，不得直接排放 - 项目部驻地、工人驻地等集中住宿生活区配备污水处理设施 - 油料、化学品等施工物资远离沿线河流，妥善保管、堆放，施工废料不得倒入水体中
3	永久基本农田 - 严格控制施工营地等临时工程用地规模，避让基本农田保护区和主要经济作物区，保护土地资源 - 尽量保持该路段填挖基本平衡，既减少了公路永久用地 - 现场各类废弃物，施工垃圾、工程渣土需要临时存放现场的，采用覆盖等措施 - 土石方调配尽量做到就近移挖作填，取弃土、石位置尽量利用荒山、空地和劣地，少占耕地 - 路基施工时，设置好临时排水和永久排水，做到永临结合，防止雨水冲刷边坡，污染地方农田 - 路基及附属施工，机械设备行走，桥梁施工的材料堆放等，严格遵守红线意识，不侵占基本农田

第8章 文明施工、文物保护保证措施

8.1 文明施工、文物保护保证措施

序号	环境保护、水土保持保证措施
1	文明施工 邻近学校、居民区等路段，采取控制施工时段、采用低噪声设备等措施，减少噪声对周边居民生产生活的影 响，必要时设置临时的隔声设施 拌合站采取雾炮等降尘措施，施工现场采用洒水车降尘，减少扬尘对周边环境的影响 建立驻地文明、卫生责任制，并落实相关负责人管理 在施工现场每个工点醒目位置设置施工铭牌、施工提示牌，并张贴有关许可证件 各省道、县道、乡道进入施工工地处，工地周围设置统一、连续、密闭、牢靠的围挡，并设置足够的安全标识标牌和警示灯 合理地安排施工工序，尽量避免夜间进行产生环境噪声污染的工序施工作业
2	文物保护 本项目建设区域内暂无文物保护单位。施工中若发现有历史文物或有考古、地质研究价值的物品时，立即停止施工，并向文物保护部门、业主、监理和公安等有关部门报告

第9章 其他应说明的事项

9.1 其他应说明的事项

序号	其他应说明的事项
1	路基施工质量控制措施 严格按清表厚度20cm执行，清除腐殖土后采用压路机分层碾压（每层≤30cm）。 边沟与路基同步开挖，坡度>0.5%。对积水路段优先施工排水沟 路床换填采用级配碎石（最大粒径≤10cm），CBR值≥5%。水泥混凝土路面施工要求C35混凝土抗折强度≥4.5MPa 采用压路机碾压时，应遵循先轻后重，先稳后振，先高后低，先慢后快以及轮迹重叠等原则。 压路机施工受限的部位，应采用小型机械或人力夯夯实。必须防止漏夯，并要求夯击面积重叠1/4~1/3。
2	道路安全施工措施 制定专项交通疏解施工方案，采用分幅施工，分幅开放交通。设置交通引导标志标牌、爆闪警示灯等。 安排专人到路口指挥交通，减少施工对交通影响。 临近村庄、学校路段加强交通引导及设置减速慢行标识牌。 特别关注陡坡路段，做好施工安全防护及边坡监测，若超出预警值及时向上级单位报告。

序号	其他应说明的事项
3	征 地 协 调 措 施 提前公示加宽段征地范围，联合村委实地指界，采用“现场确认+影像存档”方式核定青苗补偿。 农忙季（如6月水稻收割期），预留临时耕作通道。 对敏感工点，施工前组织各相关方召开现场说明会，说明施工方案。 每月10日在村委会公告栏张贴进度计划（如涵洞接长时序），附施工负责人联系方式。
4	树 木 保 护 措 施 仅对影响施工机械通行、管线安全或交通视线的枝条进行修剪，禁止过度修剪或砍伐选用专业钻孔设备进行钻孔。 修剪时设置警戒区，非工作人员不得进入作业范围 因道路红线拓宽、管线铺设等工程无法避让的树木需迁移而需向绿化部门申请。 树干包裹草绳或麻布缓冲层，减少施工损伤


序号	其他应说明的事项
5	雨季施工措施 在拓宽路基坡顶外2米处增设临时土质截水沟（断面$0.3 \times 0.3\text{m}$），每50米设集水井，接入天然水系。 新填路基边坡覆盖彩条布+沙袋压边，暴雨前采用草袋临时拦挡（高度$\geq 0.5\text{m}$）。 雨前对挖除旧板区域（S3-10）覆盖防雨布，坑内积水抽干后回填级配碎石（掺30%石屑）。 圆管涵/盖板涵基坑周边设环形排水沟（$0.4 \times 0.4\text{m}$） 项目部成立抢险小组，现场储备砂袋500个、水泵10台。

附表一：施工总体计划表


月份 主要工程项目	2025年					
	8	9	10	11	12	
施工准备	■					
道路工程		■	■			
(1) 一工区		■	■			
(2) 二工区		■	■			
(3) 三工区		■	■			
桥梁工程		■	■			
涵洞工程		■	■			
(1) 一工区		■	■			
(2) 二工区		■	■			
(3) 三工区		■	■			
交安工程			■	■		
竣工验收				■		



附表二：分项工程进度率计划（斜率图）

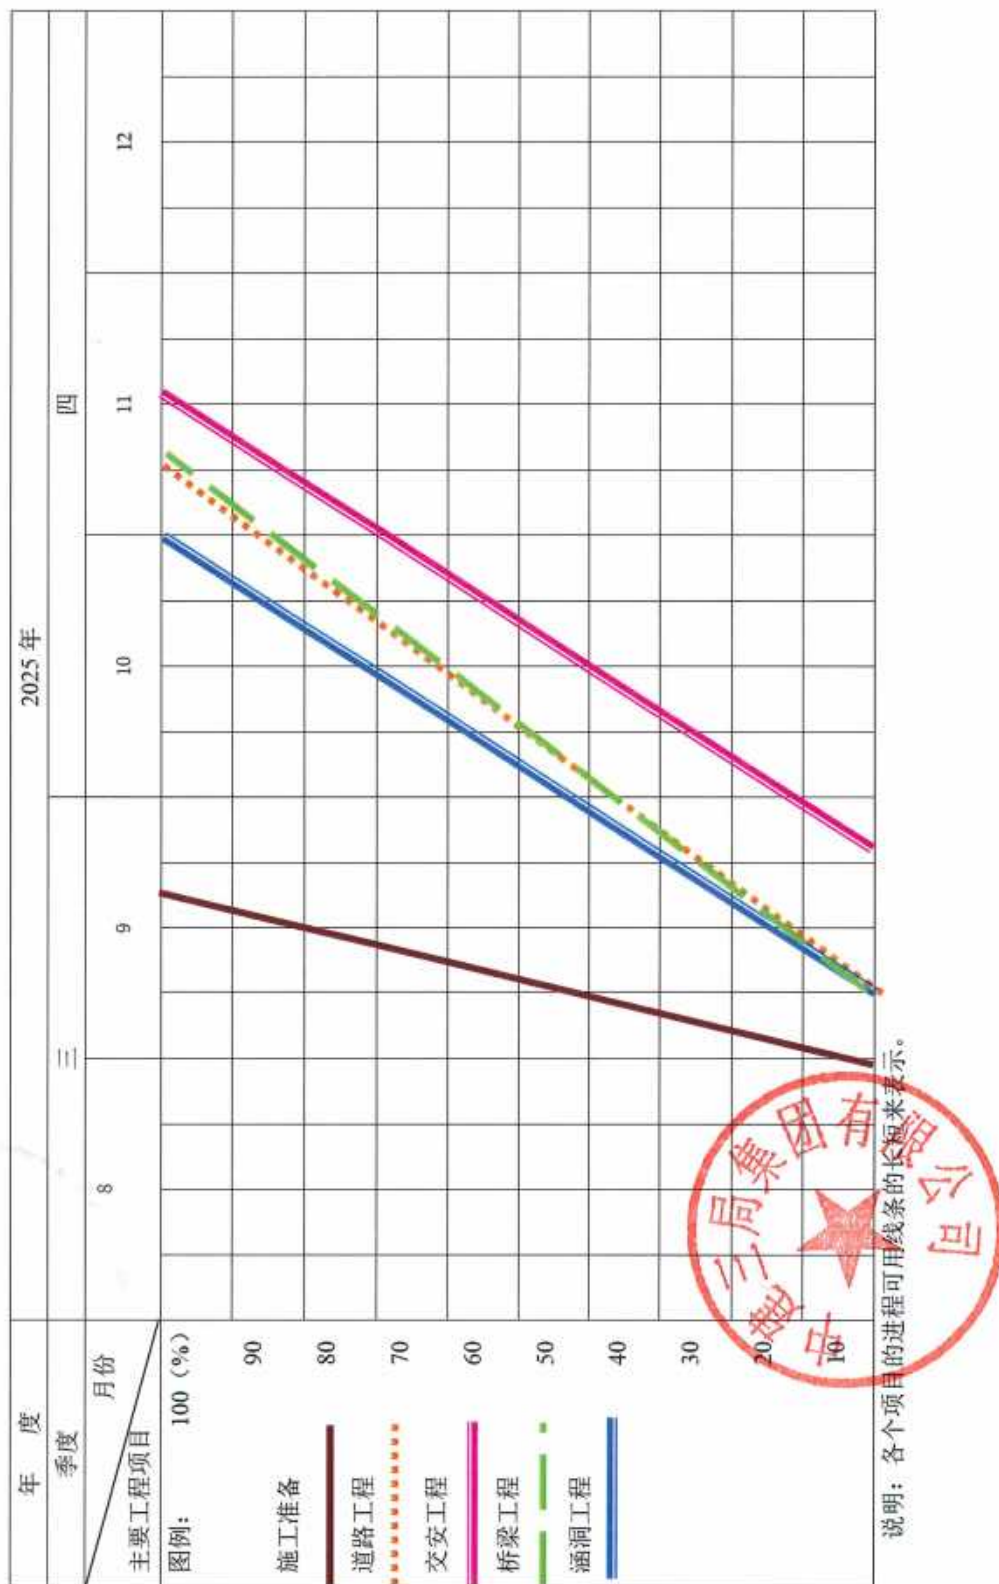


附表三：工程管理曲线

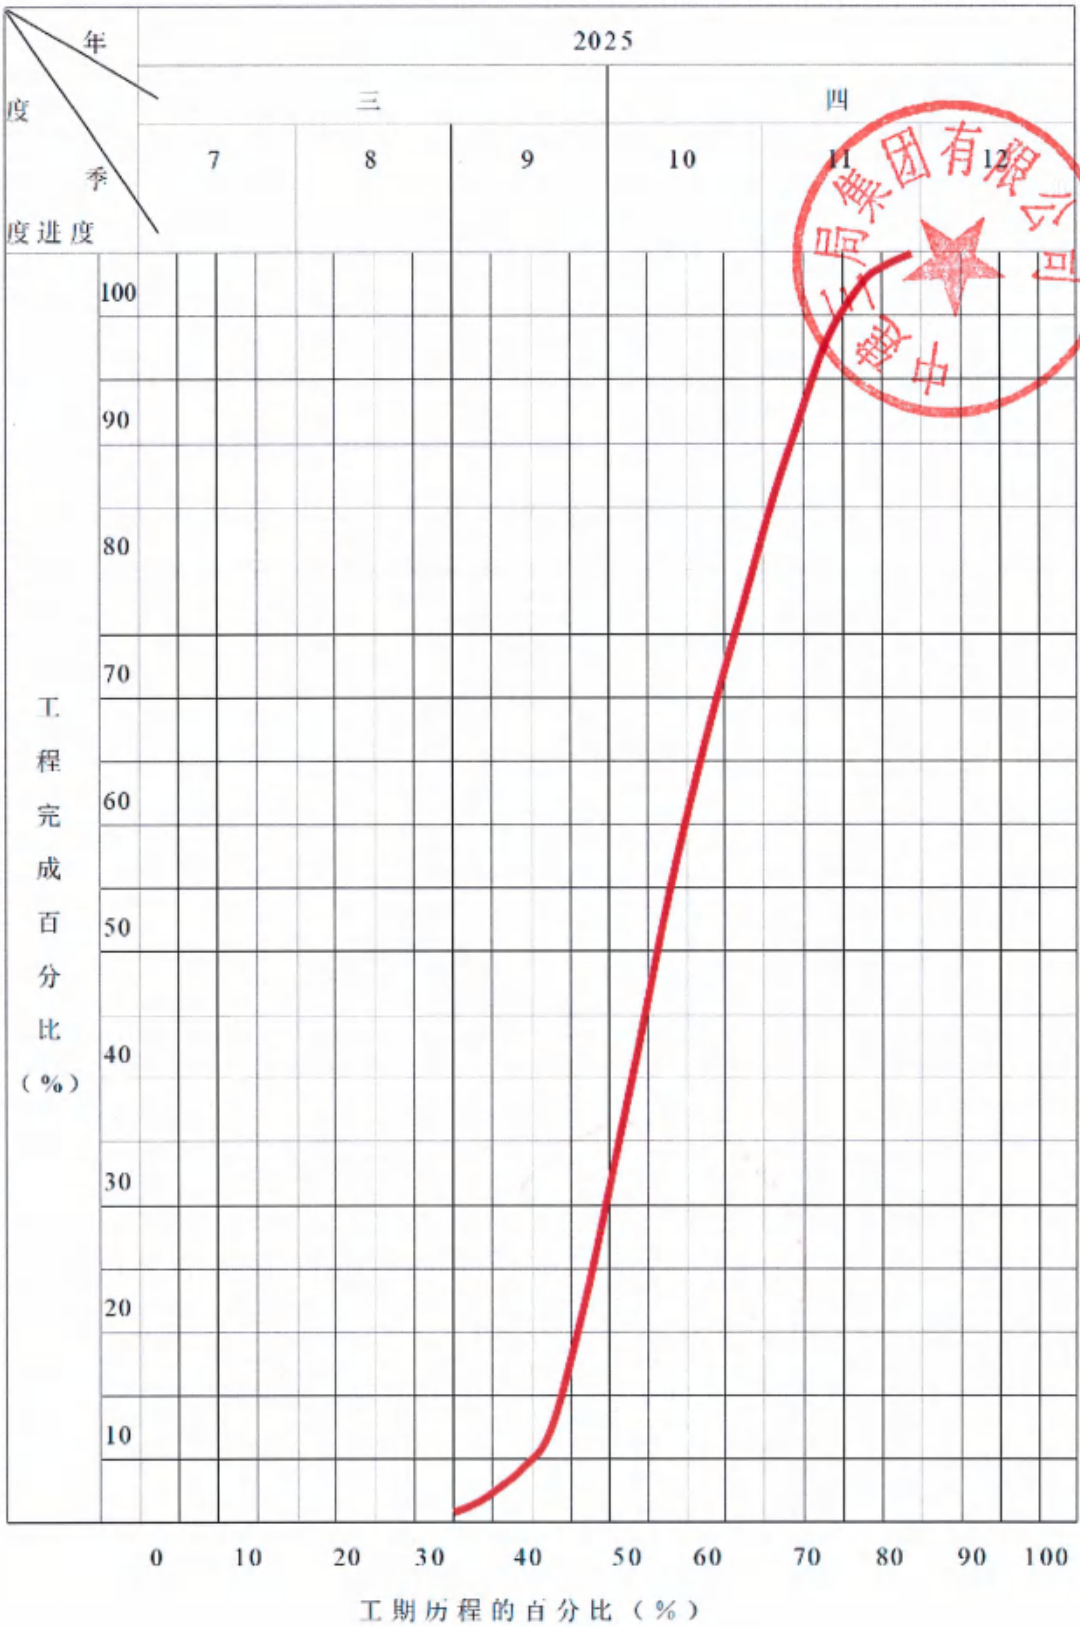

附表四：分项工程生产率和施工周期表


序号	工程项目	单位	数量	平均每生产单位规模 (人, 各种机械_台)	平均每单位生产率 (数量、每周)	每生产单位平均施工 时间(周)	生产单位总数 (个)
1	路基填筑	万m ³	2.0767	20人, 5台	0.104	10	2
2	路面	万m ²	0.9414	25人, 11台	0.047	10	2
3	路基防护及排水	km ²	12.248	30人, 10台	0.612	10	2
4	桥梁	座	5	20人, 2台	0.625	8	1
5	涵洞	道	78	40人, 10台	2.785	7	4

附表五：施工总平面图

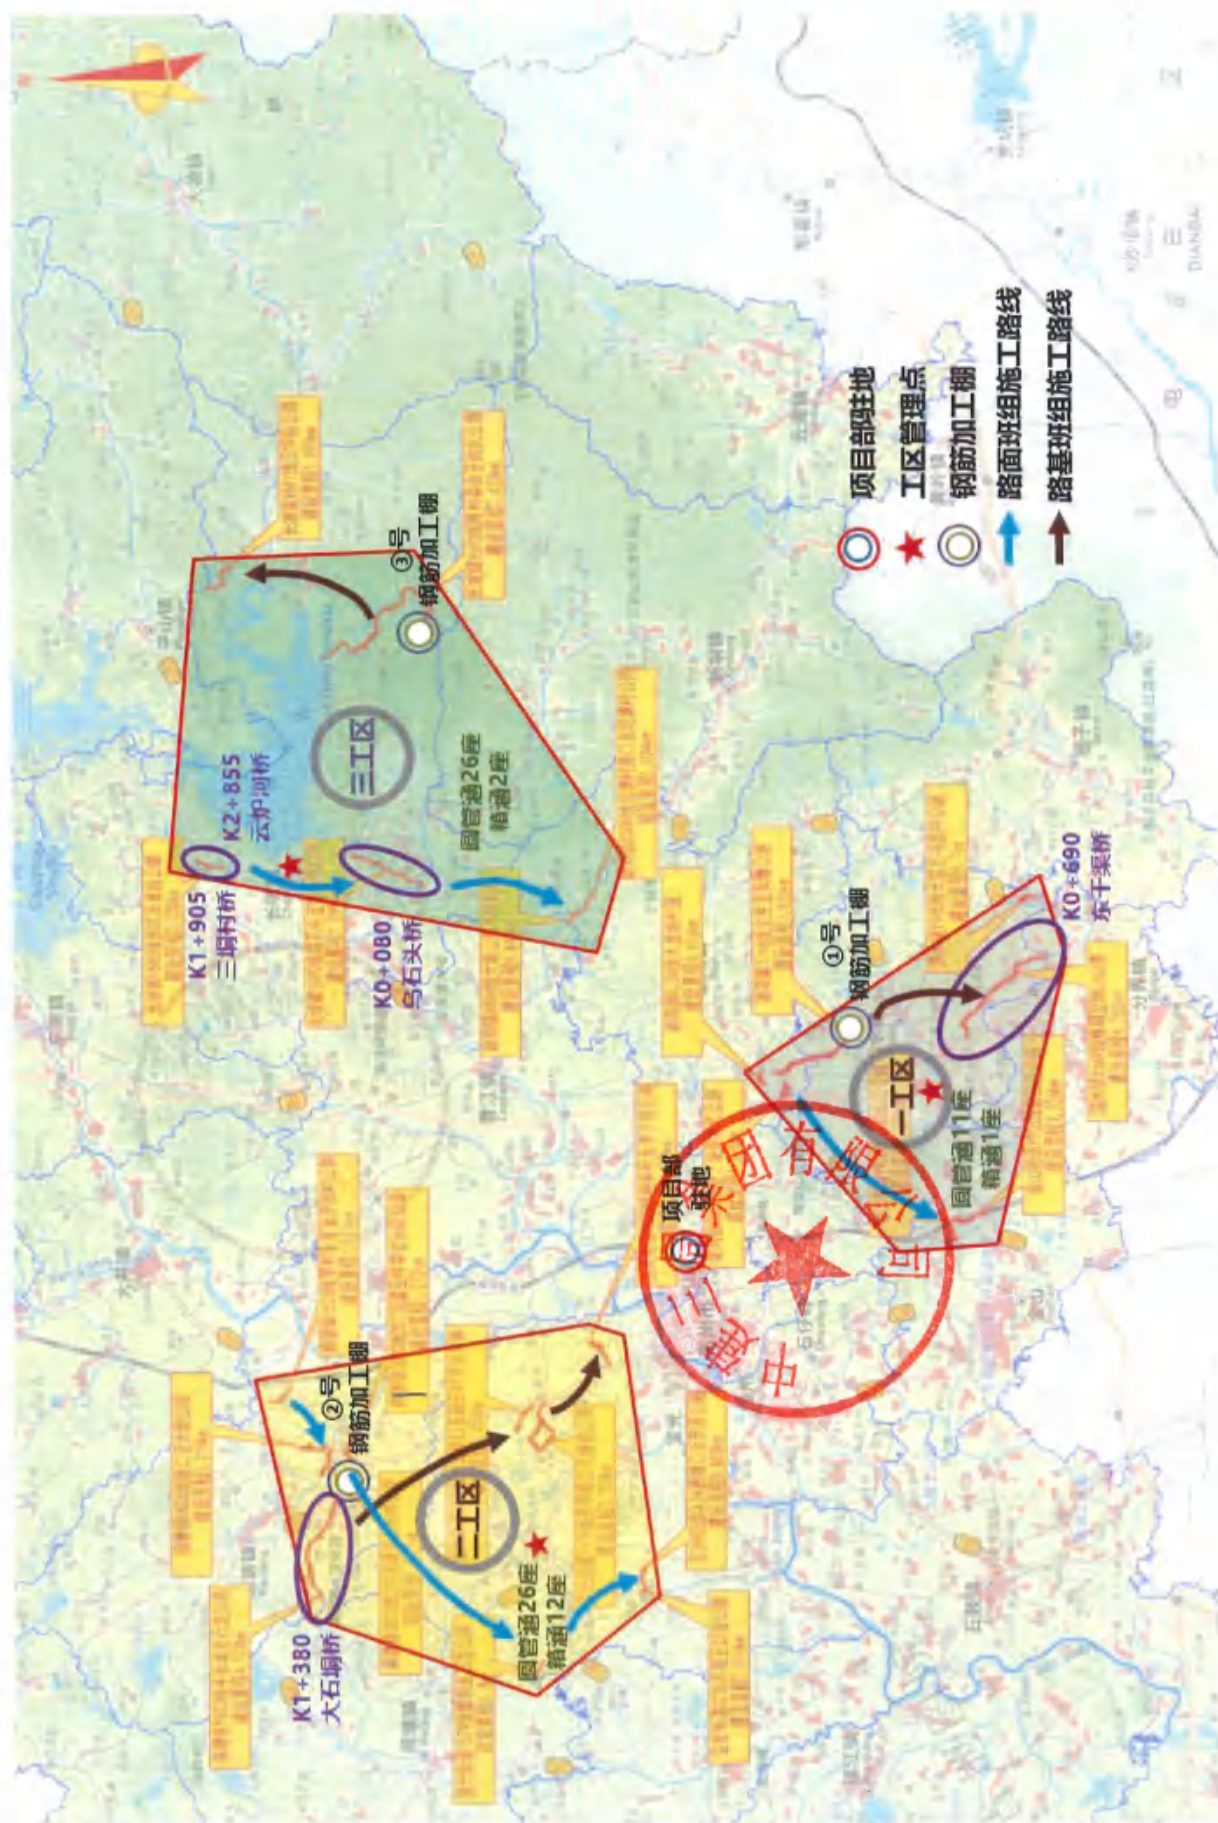

六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

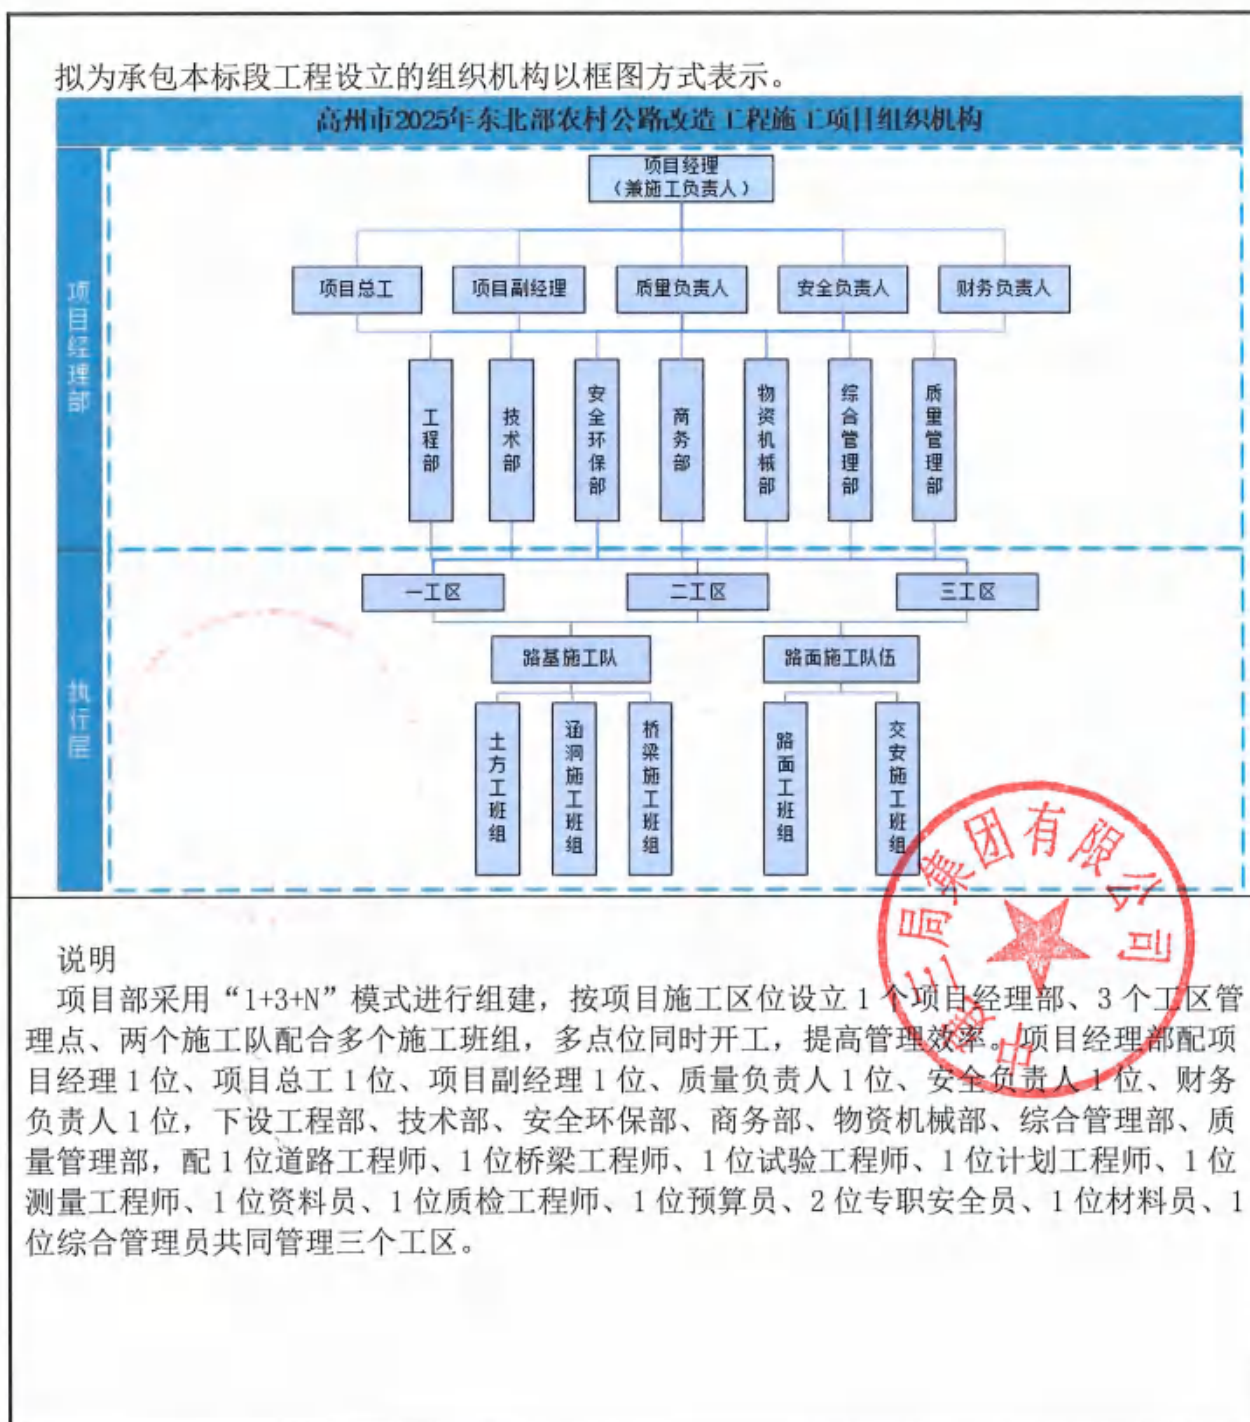

七、拟分包项目情况表

拟分包的工程项目	主要工程内容	预计造价（万元）	备注
无	无	无	 注：若无分包计划， 则投标人应在本表填 写“无。”
拟分包工程造价合计（万元）		无	

注：1、若投标人中标须按本招标文件的约定执行。

2、本表填写的造价不属于投标报价的内容。

3、如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或投标人如有分包计划，应符合招标文件第二章“投标人须知”第 1.11 款规定，且按本表的要求填写。

八、资格审查资料(适用于未进行资格预审的)

- (一) 投标人基本情况表
- (二) 投标人企业组织机构框图
- (三) 近年财务状况表
- (四) 近年完成的类似项目情况表
- (四)-1完成的类似项目情况表
- (四)-2 完成的类似项目情况汇总表
- (五) 投标人的信誉情况表
- (六) 拟委任的项目经理和项目总工情况表
- (六)-1 拟委任的项目经理和项目总工汇总表
- (六)-2 拟委任的项目经理和项目总工资历表

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	中建三局集团有限公司				
注册地址	武汉市关山路 552 号		邮政编码	430073	
联系方式	联系人	杨羽珩		电 话	
	传 真			电子邮件	
法定代表人	姓名	陈卫国	技术职称	教授级高级工程师	电话
技术负责人	姓名	侯玉杰	技术职称	教授级高级工程师	电话
营业执照号	91420000757013137P		员工总人数: 47868 人		
企业资质等级	市政公用工程施工总承包特级, 桥梁工程专业承包壹级, 钢结构工程专业承包壹级, 水利水电工程施工总承包壹级, 公路工程施工总承包壹级, 公路工程施工总承包特级, 建筑工程施工总承包特级, 公路路基工程专业承包壹级, 冶金工程施工总承包壹级, 机电工程施工总承包壹级, 电力工程施工总承包壹级, 石油化工工程施工总承包壹级, 隧道工程专业承包壹级		其中	项目经理	5361 人
注册资本	壹佰伍拾叁亿壹仟捌佰万圆人民币			高级职称人员	9410 人
成立日期	2003 年 12 月 29 日			中级职称人员	13559 人

基本账户 开户银行	中国建设银行股份 有限公司武汉省直 支行		初级职称人员	15268 人
基本账户 银行账号	4200186860805300 1499		技工	5361 人
经营范围	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至 2022 年 8 月 2 日）；建筑材料（设备）销售；机电设备销售；污水处理设备销售及环保设备销售。			
投标人关联企业 情况	投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 <u>50%</u> 以上的所有股东名称及相应股权比例； 中国建筑第三工程局有限公司 100% （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； 中建三局第一建设工程（杭州）有限责任公司 100% 中建云控（苏州）智能技术有限公司 88.8889% 中建三局集团（成都）建设有限公司 100% 宜昌中建三局城市投资运营管理有限公司 100% 中建三局集团基础设施建设投资（江苏）有限公司 100% 中建三局（江苏）建设发展有限公司 100% 中建三局（淮安）投资建设有限公司 100% 敦煌润建新能源有限公司 51% 中建三局（杭州）建设有限公司 100% 中建三局集团（温州）建设投资有限公司 100% 中建三局（北京）建设发展有限公司 100% 中建三局（陕西）投资建设有限公司 100% 中建三局（泉州）投资建设有限公司 100% 中建三局集团（宁波）投资建设有限公司 100% 中建三局集团（芜湖）建设投资有限公司 100% 中建三局甘肃建设有限公司 100% 湖北省城市生命线建设发展有限公司 75%			



	中建三局集团（天津）投资建设有限公司 100%
	中建三局集团（上海）建设工程有限公司 100%
	中建三局新型基础设施投资建设有限公司 100%
	中建三局集团（江苏）投资建设有限公司 100%
	中建（厦门）海沧南道路工程建设运营有限公司 60%
	中建三局云采西部供应链有限公司 100%
	湖北省城市生命线科技有限公司 90%
	中建三局广西投资建设有限公司 100%
	中建三局（重庆）城建有限公司 100%
	中建三局集团（东莞）投资建设有限公司 100%
	中建三局第三建设工程（福建）有限责任公司 64.3312%
	中建三局集团（佛山）有限公司 100%
	中建三局第一建设（深圳）有限责任公司 85.8959%
	中建三局钢构科技有限公司 100%
	中建三局集团（新疆）有限公司 100%
	中建三局集团（浙江）投资建设有限公司 100%
	中建三局第一建设工程（浙江）有限责任公司 85.8959%
	中建三局第三建筑工程（山东）有限责任公司 64.3312%
	大连馨伟置业有限责任公司 64.3312%
	中建三局（厦门）民生建设投资有限公司 60%
	中建三局集团（中山）有限公司 100%
	中建三局第二建设（酒泉）有限责任公司 73.822%
	中建三局第二建设工程（江苏）有限责任公司 73.822%
	中建三局第一建设工程（荆门）有限公司 85.8959%
	中建三局第二建设工程（山东）有限责任公司 73.822%
	中建三局云居科技有限公司 50%
	中建三局（吕梁）市政基础设施建设运营有限公司 90%
	中建三局集团（安徽）建设投资有限公司 100%
	中建三局集团四川有限公司 100%
	中建三局黄河投资建设有限公司 100%
	中建三局第二建设工程（广州）有限责任公司 73.822%
	中建三局（深圳）科创有限公司 100%
	中建三局（烟台）城市建设运营有限公司 79%
	中建三局第一建设工程（青岛）有限责任公司 85.8959%



	中建三局第一建设（四川）有限责任公司 85.8959%
	北京左岸兴城城市建设发展有限公司 90%
	中建三局（山东）建设有限公司 85.8959%
	中建三局信息科技有限公司 65%
	中建三局第三建设投资（广东）有限公司 64.3312%
	中建三局第三建设发展（襄阳）有限公司 64.3312%
	中建三局总承包建设有限公司 100%
	中建三局集团（浙江）有限公司 100%
	中建三局云采供应链有限公司 65%
	中建三局第三建设发展（鄂州）有限公司 64.3312%
	中建三局（烟台）投资建设有限公司 100%
	中建三局集团长江有限公司 100%
	中建三局江西建设投资有限公司 100%
	中建三局集团（德阳）有限公司 100%
	中建三局集团山东投资建设有限公司 100%
	中建三局集团重庆投资建设有限公司 100%
	中建三局第一建设工程（上海）有限责任公司 85.8959%
	中建三局第三建设安装（浙江）有限公司 64.3312%
	中建三局第三建设发展（广东）有限公司 64.3312%
	中建三局第一基础设施建设有限公司 85.8959%
	中建三局第二建设安装有限公司 73.822%
	武汉中建三局绿色置业有限公司 95.7688%
	中建三局第一建设安装有限公司 85.8959%
	中建三局科创发展（江苏）有限公司 100%
	中建三局集团（海南）有限公司 100%
	中建三局建筑科技（四川）有限公司 98.5191%
	中建三局集团（江苏）有限公司 100%
	中建三局第二建设（深圳）有限公司 73.822%
	中建三局集团（深圳）有限公司 100%
	武汉千子山能源有限公司 67%
	武汉中建三局开元珞珈房地产开发有限公司 100%
	中建三局建筑科技湖北有限公司 98.2229%
	中建三局水利水电开发有限公司 95.7688%
	武汉中建壹品绿建置业有限公司 95.7688%



中建三局雄安城市建设发展有限公司 100%
 衡水中建哈院项目管理有限公司 60%
 武汉中建壹品澜荟置业有限公司 72.6688%
 武汉市壹品蓝郡房地产开发有限公司 57.4613%
 武汉中夏园林建设工程有限公司 90%
 乌鲁木齐中城丝路体育管理有限公司 65.34%
 中建三局湖北大东湖深隧工程建设运营有限公司 55%
 中建三局建筑科技荆门有限公司 57.8844%
 中建三局咸宁城市管廊建设运营管理有限公司 90%
 中建三局集团西北有限公司 100%
 中建三局绿色产业投资有限公司 95.7688%
 中建三局襄阳城市管廊建设运营管理有限公司 80%
 中建三局武汉江汉六桥接线工程建设运营有限公司 50%
 中建三局（宜都）市民活动中心投资建设有限公司 85%
 武汉中建盘龙交通发展有限公司 89.9%
 中建三局十堰新能源汽车产业园建设管理有限公司 80%
 中建三局工程设计有限公司 92.1466%
 中建众邦（黄石）城市管廊建设运营管理有限公司 70%
 西安兴楚建设有限公司 98%
 中建三局成都高新建设有限公司 100%
 武汉中建紫城房地产开发有限公司 73.822%
 中建三局成都建设投资有限公司 100%
 武汉中建壹品绿色置业有限公司 85.8959%
 中建三局集团西南有限公司 100%
 中建三局十堰城市运营有限公司 70%
 中建十堰城市管廊建设运营管理有限公司 66.6667%
 中建绿苑（杭州）建设有限公司 85.8959%
 中建三局（福建）投资建设有限公司 100%
 中建三局集团（珠海）有限公司 100%
 中建三局四川建筑装备有限公司 100%
 北京沿中建海投资管理有限责任公司 85.8959%
 武汉中建宝谷商业运营管理有限公司 73.822%
 中建三局第一建设工程（珠海）有限责任公司 85.8959%
 中建武汉桥隧发展有限公司 70%



	武汉中建华城房地产开发有限公司 73.822% 中建武汉环线建设有限责任公司 70% 荆门中建三局房地产开发有限公司 77.3063% 武汉中建三局龙城房地产开发有限公司 59.0576% 湖北长安设备安装有限公司 73.822% 中建三局基础设施建设投资（湖北）有限公司 100% 中建三局第三桥隧发展（宜昌）有限公司 64.3312% 武汉中建工程管理有限公司 73.822% 中建三局基础设施建设工程有限公司 100% 中建三局第二建设工程有限责任公司 73.822% 中建三局安装工程有限公司 100% 中建三局第三建设工程有限责任公司 64.3312% 中建三局第一建设工程有限责任公司 85.8959% 中建三局建隆工程有限公司 100% 中建三局智能技术有限公司 73.822% 中建三局集团华东建设有限公司 100% 湖北中建三局建筑工程技术有限责任公司 100% 中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司深圳实业公司 85.8959% 广州中建三局第一建设工程有限责任公司 85.8959% (3) 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 中国建筑第三工程局有限公司
备注	/

注：1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

3. 上述信息如经调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。

			
统一社会信用代码 914200000757013137P		扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统” 了解更多登记、备案、许可、监管信息。	
营业执照 (副本)		20 - 20	
名称	中建三局集团有限公司	注册资本	壹佰伍拾叁亿壹仟捌佰万圆人民币
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	2003年12月29日
法定代表人	陈卫国	住所	武汉市关山路552号
经营范围	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备的租赁、路桥工程、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产、销售和供应、园林绿化工程、橡胶作业设计施工、房屋建筑工程、室内外装饰装修工程、建筑材料(设备)销售、(四)机电设备、污水处理设备销售及环保设备销售。		
			
登记机关		2023 年 6 月 5 日	

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址

<http://www.gsxt.gov.cn>

变更（备案）信息

企业名称：中建三局集团有限公司

统一社会信用代码：91420000757013137P

变更（备案）事项	变更（备案）日期	变更（备案）前内容	变更（备案）后内容
投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	2023-06-05 16:01:19	股东名称：中国建筑第三工程局有限公司，认缴出资额：2100000万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2042-12-31；	股东名称：中国建筑第三工程局有限公司，认缴出资额：1531800万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2050-12-31；
注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	2023-06-05 16:01:19	2100000 万元（币种：人民币）	1531800 万元（币种：人民币）
章程备案	2023-06-05 16:01:19		章程备案
高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	2023-04-14 09:35:31	姓名：甘明生，职务：监事；姓名：张琨，职务：董事；姓名：王胜民，职务：董事；姓名：陈卫国，职务：董事长；姓名：胡金国，职务：董事；姓名：李琦，职务：董事；姓名：李琦，职务：经理	姓名：罗加琳，职务：监事；姓名：杨红亮，职务：董事；姓名：王胜民，职务：董事；姓名：陈卫国，职务：董事长；姓名：胡金国，职务：董事；姓名：李琦，职务：董事；姓名：李琦，职务：经理
注册资本（或外资中方认缴资本）	2022-10-26 09:53:28	1500000	2100000.000000
章程	2022-10-26 09:53:28		章程备案
股东名录	2022-10-26 09:53:28	中国建筑第三工程局有限公司；100%；	中国建筑第三工程局有限公司；100%；
注册资本（或外资中方认缴资本）	2022-06-14 14:47:15	1350000	1500000.000000

章程	2022-06-14 14:47:15		章程备案
股东认缴出资	2022-06-14 14:47:15	中国建筑第三工 程局有限公司: (出资额: 1350000.0000 万 元, 出资比例: 100%);	中国建筑第三工 程局有限公司: (出资额: 1500000.0000 万 元, 出资比例: 100%);
股东名录	2022-06-14 14:47:15	中国建筑第三工 程局有限公司: 100%;	中国建筑第三工 程局有限公司: 100%;
章程	2021-07-16 10:28:44		章程备案
章程	2021-05-08 09:29:39		章程备案
股东名录	2021-03-19 10:26:09	中国建筑第三工 程局有限公司: 100%;	中国建筑第三工 程局有限公司: 100%;
注册资本(或外 资中方认缴资本)	2021-03-19 10:26:09	1500000	1350000.000000
章程修正案	2021-03-19 10:26:09		章程修正案备案
章程	2021-02-23 14:39:46		章程备案
管理人员	2021-02-23 14:39:46	陈文健(董事长)、 张鼎(董事)、胡 全国(董事)、李 德磊(董事)、朱 建辉(监事)、孙 晓惠(监事)、曹 庆和(监事)、陈 卫国(董事)	张鼎(董事)、胡 全国(董事)、李 德磊(董事)、朱 建辉(监事)、孙 晓惠(监事)、曹 庆和(监事)、陈 卫国(董事)
法定代表人(负 责人、独资投资 人)	2021-02-23 14:39:46	陈文健	陈卫国
股东名录	2020-11-06 16:01:49	中国建筑第三工 程局有限公司: 100%;	中国建筑第三工 程局有限公司: 100%;
注册资本(或外 资中方认缴资本)	2020-11-06 16:01:49	800000	1500000.000000




管理人员	2020-04-13 10:31:26	陈华元（董事长）、张琨（董事）、胡金国（董事）、李森磊（董事）、朱建辉（监事）、孙晓惠（监事）、曹庆和（监事）、陈卫国（董事）	陈文健（董事长）、张琨（董事）、胡金国（董事）、李森磊（董事）、朱建辉（监事）、孙晓惠（监事）、曹庆和（监事）、陈卫国（董事）
法定代表人（负责人、独资投资人）	2020-04-13 10:31:26	陈华元	陈文健
多证合一	2020-04-13 10:31:26		公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
经营范围	2020-04-13 10:31:26	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）；建筑材料（设备）销售；机电设备销售；污水处理设备销售及环保设备销售。
经营范围	2019-08-21 17:19:47	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥

		建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程。（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东名录	2019-01-16 09:02:25	中国建筑第三工程局有限公司；99.9954%；中建三局房地产开发有限公司；0.0046%；	中国建筑第三工程局有限公司；
详细企业类型	2019-01-16 09:02:25		有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
章程	2019-01-16 09:02:25		章程备案
管理人员	2019-01-16 09:02:25	何晓博、田涛、丰典、陈华元、易文权、陆仁星、邵良军、张琨、胡金国	陈华元、张琨、胡金国、李森磊、朱建辉、孙晓慧、曹庆和、陈卫国
经营范围	2019-01-16 09:02:25	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）。	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）



			可经营)
股东名录	2016-03-28 15:23:42	中建三局房地产开发有限公司: 0.01%;中国建筑第三工程局有限公司:99.99%;	中建三局房地产开发有限公司: 0%;中国建筑第三工程局有限公司: 99.99%;
注册资本(或外 资中方认缴资本)	2016-03-28 15:23:42	300000	800000,000000
详细企业类型	2013-11-26 16:39:53	股份有限公司	有限责任公司
管理人员	2013-11-26 16:39:53	易文权,	陈华元, 易文权, 陆仁星, 鄢良军, 张磊, 胡金国, 李 勇, 何晓梅, 田涛,
股东名录	2013-11-26 16:39:53	中国建筑第三工程局有限公司, 31276.24(万元) 85.38%;中国建筑 科学研究院, 195.09(万元) 0.53%;武汉钢铁 集团鄂城钢铁有 限责任公司, 195.09(万元) 0.53%;中国华闻 投资控股有限公司, 650.29(万元) 1.78%;香港协兴 建筑有限公司, 3663.0(万元) 10%;中国光大 (澳门)有限公司, 650.392(万元) 2%;	中国建筑第三工 程局有限公司 299963.37(万元) 99.99%;中建三局 房地产开发有限公司, 367.63(万元) 0.1%;
企业名称	2013-11-26 16:39:53	中建二局建设工程股份有限公司	中建三局集团有 限公司
章程	2013-04-07 00:00:00		章程备案
注册资本(或外 资中方认缴资本)	2012-12-20 00:00:00	注册资本: 36630.0 币种: 156,	注册资本: 300000.0 币种: 156,

实收资本(或外 资中方实收资本)	2012-12-20 00:00:00	35639.0	300000.0
章程	2012-12-19 00:00:00		章程备案
章程	2012-12-10 00:00:00		章程备案
章程	2012-12-03 00:00:00		章程备案
章程	2012-08-24 00:00:00		章程备案
法定代表人(负 责人、独资投资 人)	2011-10-13 00:00:00	证件号码: 370102195011292 913,姓名:熊德荣, 家庭住址:	证件号码: 420122196108280 059,姓名:陈华元, 家庭住址:
经营范围	2011-07-03 00:00:00	经营范围(主营): 各类建筑工程总 承包、施工、咨 询、建筑技术开 发与转让、机械 设备租赁、路桥 建设、商品混凝 土的生产和批发 (需持许可证、 资质证经营的, 凭许可证、资质 证经营)。	经营范围(主营): 各类建筑工程总 承包、施工、咨 询、建筑技术开 发与转让、机械 设备租赁、路桥 建设、建筑工程、 人防工程设计、 商品混凝土的生 产和批发(需持 许可证、资质证 经营的,凭许可 证、资质证经营)。
详细企业类型	2009-12-22 00:00:00	股份有限公司(台 港澳与境内合资、 未上市)	股份有限公司
章程	2009-12-22 00:00:00		章程备案
股东名录	2008-03-24 00:00:00	中国建筑第三工 程局, 出资 31276.24 万人民 币, 占 85.38% 中国建筑科 学研究院, 出资 195.00 万人民币, 占 0.53% 武 汉钢铁集团鄂城	香港协兴建筑有 限公司, 出资 3605 万人民币, 占 10% 中国光大 (澳门)有限公 司, 出资 650.292 万人民币, 占 2% 中国建筑第 三工程局有限公



		钢铁有限责任公司, 出资 195.09 万人民币, 占 0.53% 中国华闻投资控股有限公司, 出资 650.29 万人民币, 占 1.78% 香港协兴建筑有限公司, 出资 3663 万人民币, 占 10% 中国光大(澳门)有限公司, 出资 650.292 万人民币, 占 2% 司, 出资 31276.24 万人民币, 占 85.38% 中国建筑科学研究院, 出资 195.09 万人民币, 占 0.53% 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司, 出资 195.09 万人民币, 占 0.53% 中国华闻投资控股有限公司, 出资 650.29 万人民币, 占 1.78%	
投资者名称(姓名)	2008-03-24 00:00:00	中国建筑第三工程局;	中国建筑第三工程局有限公司;
其他	2007-09-10 00:00:00	企股鄂总字第 003135 号	420000400000435
经营范围	2007-09-10 00:00:00	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设(需持许可证、资质证经营的, 凭许可证、资质证经营)。	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、商品混凝土的生产和批发(需持许可证、资质证经营的, 凭许可证、资质证经营)。
股东名录	2007-09-10 00:00:00	中国建筑第三工程局, 出资 31276.2434 万人民币, 占 85% 中国建筑科学研究院, 出资 195.0876 万人民币, 占 1% 鄂城钢铁集团有限责任公司, 出资 195.0867 万人民币, 占 1% 中国华闻投资控股	中国建筑第三工程局, 出资 31276.24 万人民币, 占 85.38% 中国建筑科学研究院, 出资 195.09 万人民币, 占 0.53% 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司, 出资 195.09 万人民币, 占 0.53% 中国

		有限公司, 出资 650.292 万人民币, 占 2% 香港协兴建筑有限公司, 出资 3663.9974 万人民币, 占 10% 中国光大(澳门)有限公司, 出资 650.292 万人民币, 占 2%	华闻投资控股有限公司, 出资 650.29 万人民币, 占 1.78% 香港协兴建筑有限公司, 出资 3663 万人民币, 占 10% 中国光大(澳门)有限公司, 出资 650.292 万人民币, 占 2%
备案事项	2006-08-28 00:00:00	熊德荣 王祥明 郑 锦超 陈 华元 赵亨平 梅合理 易 文权 裴 晓 陆仁星 高平平 王 洪成 程 宇 梅景涛 姚 嵩 石 谭华 费 庆和 郑小强 程海波	熊德荣 王祥明 郑 锦超 陈 华元 赵亨平 姚 嵩 陶 盛发 梅 景涛 戴 韩英南 郑 庆和 郑 小强 程海波
法定代表人(负责人, 独资投资人)	2005-05-19 00:00:00	洪可柱	熊德荣



国务院国有资产监督管理委员会办公厅

证 明

各有关单位:

中建三局建设工程股份有限公司系经我委批准(国资改革函[2003]435号),由我委监管的中国建筑工程总公司所属原中国建筑第三工程局主营业务资产改制设立的股份有限公司。公司已经按照有关规定就位房屋建筑工程施工总承包特级等资质,并在中国建筑工程总公司明确,全面承继了资质范围内原中国建筑第三工程局以往的所有业绩及相关荣誉。

特此证明。

二〇〇五年一月二十八日

办公厅

湖北省工商行政管理局

证 明

中建三局建设工程股份有限公司经国家工商总局批准，企业性质变更为有限责任公司，企业名称变更为中建三局集团有限公司，并于2013年11月26日经湖北省工商局完成工商变更工作。经建设部批准，中建三局集团有限公司继承了原中建三局建设工程股份有限公司的全部资质，全面继承了资质范围内原中建三局建设工程股份有限公司的所有业绩及相关荣誉。

特此证明

二〇一三年十一月二十八日



NF-22-002

公司变更通知书

中建三局集团有限公司经我局办理变更登记，其注册号为420000000000435，现将变更项目通知如下：

变更类别	变更前内容	变更后内容	核准日期
企业类型变更	股份有限公司	有限责任公司	2013-11-26
名称变更	中建三局建设工程股份有限公司	中建三局集团有限公司	2013-11-26
其他人员备案	易文权，	陈华元，易文权，胡星，鄧良军，张瑞国，李勇，何晓娟，	2013-11-26

登记机关：湖北省工商行政管理局

2013年11月26日
(1)



准予变更登记通知书

(鄂市监) 登记内变字[2020]第53号

中建二局集团有限公司：

经审查，提交的经营范围、法定代表人(负责人、独资投资人)的变更登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

变更信息：

变更事项	变更前	变更后
经营范围	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）；建筑材料（设备）销售；机电设备销售；污水处理设备销售及环保设备销售。
法定代表人(负责人、独资投资人)	陈华元	陈文健

(印章)

核准日期 2020年04月13日

准予变更登记通知书

(鄂市监)登记内变字[2021]第64号

中建三局集团有限公司：

经审查，提交的法定代表人(负责人、独资投资人)的变更登记申请，
申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

变更信息：

变更事项	变更前	变更后
法定代表人(负责人、独资投资人)	陈文健	陈卫国



中建三局集团有限公司资质证书复印件



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 中建三局集团有限公司

详细地址: 武汉市关山路552号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 91420000757013137P

法定代表人: 陈卫国

注册资本: 1531800万元人民币

经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D142011823

有效期至: 2026年05月06日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包特级;

公路工程施工总承包特级;

市政公用工程施工总承包特级;

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电、矿山、冶金、石油化工、电力各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

水利水电工程施工总承包壹级;

电力工程施工总承包壹级;

冶金工程施工总承包壹级;

石油化工工程施工总承包壹级;

机电工程施工总承包壹级;

桥梁工程专业承包壹级;

隧道工程专业承包壹级;

钢结构工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级。



发证机关



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00087428

统一社会信用代码: 91420000757013137P		编号: (鄂)JZ安许证字[2005]000115	
企业名称: 中建三局集团有限公司		法定代表人: 陈卫国	
单位地址: 武汉市关山路552号		经济类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	
许可范围: 建筑施工		有效期至: 2025年09月16日	
发证机关: 湖北省住房和城乡建设厅		发证日期: 2022年11月11日	

中建三局集团有限公司基本存款账户信息复印件

基本存款账户信息

账户名称: 中建三局集团有限公司

账户号码: 42001868608053001499

开户银行: 中国建设银行股份有限公司武汉省直支行

法定代表人:
(单位负责人) 陈卫国

基本存款账户编号 J5210000816609



中建三局集团有限公司在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”公路工程
施工资质企业名录中的网页截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

所有企业名称或统一社会信用代码查询

中建三局集团有限公司

搜索

序号	企业名称	企业类型	企业资质	法人代表
1	中建三局集团有限公司	施工企业	电力工程[总承包]壹级 冶金工程[总承包]壹级 石油化工工程[总承包]壹级 消防设施工程[专业承包]壹级 建筑机电安装工程[专业承包]壹级 地基基础工程[专业承包]壹级 公路路基工程[专业承包]壹级 钢结构工程[专业承包]壹级 电子与智能化工程[专业承包]壹级 建筑装饰装修工程[专业承包]壹级 建筑幕墙工程[专业承包]壹级 隧道工程[专业承包]壹级 水利水电工程[总承包]壹级 桥梁工程[专业承包]壹级 环保工程[专业承包]壹级 机电工程[总承包]壹级 公路工程[总承包]特級 市政公用工程[总承包]特級 起重设备安装工程[专业承包]壹级 防水防腐保温工程[专业承包]壹级 古建筑工程[专业承包]壹级 城市及道路照明工程[专业承包]壹级 建筑工程[总承包]特級	陈卫国
2	中建三局集团有限公司	设计企业	工程设计行业资质[公路行业]甲级	陈卫国

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

中建三局集团有限公司

搜索

资质名称:

资质类型: 请选择

资质等级: 请选择

注册地省份: --请选择省份--

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转籍历史记录

基本信息

统一社会信用代码	91420000757013137P	企业名称	中建三局集团有限公司
注册省份	湖北省	注册城市	武汉市
曾用名	中建三局建设工程股份有限公司	注册资金(万元)	1531680
企业类型	施工	企业性质	国有企业
营业执照注册日期	2003-12-29	成立日期	2003-12-29
法定代表人	陈卫国	法定代表人职称	教授级高工
企业负责人	陈卫国	企业负责人职称	教授级高工
技术负责人	侯玉杰	技术负责人职称	教授级高级工程师
营业范围	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和销售；园林绿化工程、道路作业设备施工（出租，有效期至2022年8月21日）；建筑材料（设备）销售；机电设备销售；污水处理设备销售及环保设备销售。		

打印

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转籍历史记录

企业变更信息

序号	原企业名称	新企业名称	变更时间
无记录			

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

主项资质

资质名称:	公路工程	资质承包范围:	总承包
资质等级:	特级	资质证书号:	D142011823
发证机关:	中华人民共和国住房和城乡建设部	发证日期:	2025-05-06
申报			

增项资质

序号	资质证书编号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	备注	申报
1	D142011823	电力工程	总承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-05-06		申报
2	D142011823	冶金工程	总承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-05-06		申报
3	D142011823	石油化工工程	总承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-05-06		申报
4	D242002084	消防设施工程	专业承包	壹级	湖北省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
5	D242002084	建筑机电安装工程	专业承包	壹级	湖北省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
6	D242002084	地基基础工程	专业承包	壹级	湖北省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
7	D142011823	公路路基工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-05-06		申报
8	D142011823	钢结构工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-05-06		申报
9	D242002084	电子与智能化工程	专业承包	壹级	湖北省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
10	D242002084	建筑装饰装修工程	专业承包	壹级	湖北省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
11	D242002084	建筑幕墙工程	专业承包	壹级	湖北省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
12	D142011823	隧道工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-05-06		申报
13	D142011823	水利水电工程	总承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-05-06		申报
14	D142011823	桥梁工程	专业承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-05-06		申报
15	D242002084	环保工程	专业承包	壹级	湖北省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
16	D142011823	机电工程	总承包	壹级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-05-06		申报
17	D142011823	市政公用工程	总承包	特级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-05-06		申报
18	D242002084	起重设备安装工程	专业承包	壹级	湖北省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
19	D242002084	防水防腐保温工程	专业承包	壹级	湖北省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
20	D242002084	古建筑工程	专业承包	壹级	湖北省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
21	D242002084	城市及道路照明工程	专业承包	壹级	湖北省住房和城乡建设厅	2024-06-28		申报
22	D142011823	建筑工程	总承包	特级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2025-05-06		申报

中建三局集团有限公司在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东）的网页截图复印件



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

Q



中建三局集团有限公司

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

集团名称：中建三局集团 集团简称：

统一社会信用代码：91420000757013137P

注册号：

法定代表人：陈卫国

登记机关：湖北省市场监督管理局

成立日期：2003年12月29日

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：91420000757013137P

企业名称：中建三局集团有限公司

注册号：

法定代表人：陈卫国

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2003年12月29日

注册资本：1531800.000000万人民币

核准日期：2023年06月05日

登记机关：湖北省市场监督管理局

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：武汉市关山路552号

经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产与销售；园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）；建筑材料（设备）销售；机电设备销售；污水处理设备销售及环保设备销售。

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自：2003年12月29日

营业期限至：

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国建筑第三工程有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91420100177738297E	详情

共查询到 1 条记录 共 1 页

1

■ 主要人员信息

共计 7 条信息

陈珍敏	陈卫国	周圣	王胜民	罗加琳	周圣	杨红亮
董事	董事长	经理	董事	监事	董事	董事

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ “多证合一” 信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	公章刻制备案	
2	单位办理住房公积金缴存登记	

共查询到 2 条记录 共 1 页

1

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案		章程备案	2023年6月5日
2	投资人变更 (包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	股东名称: 中国建铁第三工程有限公司, 认缴出资: 21000000万, 币种: 人民币, 认缴出资: 更多	股东名称: 中国建铁第三工程有限公司, 认缴出资: 1531800万, 币种: 人民币, 认缴出资: 更多	2023年6月5日
3	注册资本变更 (注册资金、资金数额等变更)	21000000万元 (币种: 人民币)	1531800万元 (币种: 人民币)	2023年6月5日
4	高级管理人员备案 (董事、监事、经理等)	姓名: 甘明生, 职务: 监事; 姓名: 张瑞, 职务: 董事; 姓名: 王胜民, 职务: 董事; 姓名: 陈卫国, 职务: 更多	姓名: 罗加明, 职务: 监事; 姓名: 杨红英, 职务: 董事; 姓名: 王胜民, 职务: 董事; 姓名: 陈珍, 职务: 更多	2023年4月14日
5	注册资本变更 (注册资金、资金数额等变更)	1500000	2100000.000000	2022年10月26日

共查询到 33 条记录 共 7 页

首页 上一页 1 2 3 ... 7 下一页 末页

动产抵押登记信息

提示: 根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》(国发〔2020〕18号)和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》(〔2020〕第23号), 自2021年1月1日起, 本模块信息不再更新, 详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看 (https://www.zhongdengwang.org.cn)。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	抵押担保债权额	详情
----	------	------	------	---------	----

暂无动产抵押登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
----	------	-----	---------	--------	-----	---------	------------	----	------	----

暂无股权出质登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
1	旋转换轨装置	CN201520162582.3	2015年3月20日	中建三局集团有限公司	查看
2	一种用于角度检测的自适应精确定位装置	CN201520161731.4	2015年3月20日	中建三局集团有限公司	查看
3	智能群控调度及安全控制系统	CN201520162378.1	2015年3月20日	中建三局集团有限公司	查看
4	一种施工电梯基础转换桁架平台	CN201520030642.6	2015年1月16日	中建三局集团有限公司	查看
5	一种可拆卸式钢管接长器	CN201520025095.2	2015年1月14日	中建三局集团有限公司	查看

共查询到 48 条记录 共 10 页

首页 上一页 1 2 3 ... 10 下一页 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记日期	状态	公示日期	详情
----	----------	----	----	-------	-------	--------	----	------	----

暂无知识产权出质登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■ 商标注册信息

共计6条信息 [查看全部](#)

	商标注册号: 25658386 类别: 医药 注册公告日期: 2018年8月21日 查看详情		商标注册号: 25648355 类别: 医药 注册公告日期: 2018年8月21日 查看详情
	商标注册号: 25648707 类别: 医药 注册公告日期: 2018年8月14日 查看详情		商标注册号: 25658386 类别: 医药 注册公告日期: 2018年8月21日 查看详情

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
1	荆州市消防救援支队	检查	2019年9月30日	复查不合格。中建三局集团有限公司负责施工的高层住宅二期施工现场未设置临时消防水源。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第5.3.15条之规定。限期未改。
2	荆州市消防救援支队	抽查	2019年9月19日	不合格。中建三局集团有限公司负责施工的高层住宅二期施工现场未设置临时消防水源。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第5.3.15条之规定。
3	荆州市消防救援支队	检查	2019年9月19日	中建三局集团有限公司施工的荆州市中心医院荆北新院一期在建工程施工现场消防安全检查情况。检查发现问题: 1.临时室内消防给水系统未设置消防水泵接合器。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第5.3.11条之规定。2.临时消防水泵停用。临时消防给水系统直接接市政给水管网。临时消防给水压力不满足要求。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第5.3.15条之规定。3.临时消防给水管道未断开。后栋楼等建筑临时消防给水系统未接通。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第5.3.8条之规定。未整改问题: 住院楼未设置临时消防车道。门诊医技及93儿中心楼未设置临时消防救援场地。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第3.3.3条之规定。
4	荆州市消防救援支队	检查	2019年8月20日	不合格。中建三局集团有限公司施工的荆州市中心医院荆北新院一期在建工程施工现场存在以下问题: 1.住院楼未设置临时消防车道。门诊医技及93儿中心楼未设置临时消防救援场地。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第3.3.3条之规定。2.临时室内消防给水系统未设置消防水泵接合器。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第5.3.11条之规定。3.临时消防水泵停用。临时消防给水系统直接接市政给水管网。临时消防给水压力不满足要求。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第5.3.15条之规定。4.临时消防给水管道未断开。后栋楼等建筑临时消防给水系统未接通。不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)第5.3.8条之规定。
5	荆州市消防救援支队	抽查	2019年4月28日	复查不合格。

共查询到 10 条记录 共 2 页

[首页](#)
[上一页](#)
[1](#)
[2](#)
[下一页](#)
[末页](#)

■ 产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							
共查询到 0 条记录 共 0 页							
首页 < 上一页 下一页 > 末页							

■ 认证监督抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称(标称)	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的证书处理结果	证书撤销日期
暂无认证监督抽查检查信息									
共查询到 0 条记录 共 0 页									
首页 < 上一页 下一页 > 末页									

■ 食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽查结果
暂无食品抽查检查信息					
共查询到 0 条记录 共 0 页					
首页 < 上一页 下一页 > 末页					

■ 双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
1	42282820231852	2023年度鹤峰县劳动力市场监督年度抽查计划	422828202310091867	2023年度鹤峰县对住建领域保障农民工工资支付抽查检查	定向	劳动保障监察股	2023-10-10	合格
2			422828202310091867	2023年度鹤峰县对住建领域保障农民工工资支付抽查检查	不定向	鹤峰县人力资源和社会保障局	2023-10-10	合格
3	42282620231###	2023年度咸丰县建筑市场监管执法检查	422826202310101745	2023年度咸丰县建筑市场监管执法检查	定向	咸丰县住房和城乡建设局	2023-10-26	合格
4	42282620231###	2023年度咸丰县建筑市场监管执法检查	422826202310101745	2023年度咸丰县建筑市场监管执法检查	不定向	咸丰县住房和城乡建设局	2023-10-26	合格
5	42280020241313	2024年度恩施州建筑市场监管执法检查1(10)	422899202411011437	2024年度恩施州建筑市场监管执法检查	定向	恩施州发展研究中心	2024-11-08	合格
6	42080020221194	2022年度荆门市对建设工程安全生产的监督检查	420899202208101192	2022年度荆门市市辖区对建设工程安全生产的监督检查	定向	荆门市建筑工程管理处	2022-12-12	合格
7	42080020221182	2022年度荆门市市辖区对建设工程质量的监督检查	420899202206241141	2022年度荆门市市辖区对建设工程质量的监督检查	定向	荆门市建筑工程管理处	2022-11-10	合格
8	42071020231415	2023年度葛店开发区对建筑节能与绿色建筑监督检查	420710202307131285	2023年度葛店开发区对建筑节能与绿色建筑监督检查	定向	葛店市场监管所	2023-08-24	合格
9			420710202307131285	2023年度葛店开发区对建筑节能与绿色建筑监督检查	不定向	葛店经济开发区市场监督管理局	2023-08-24	合格
10	42071020231404	2023年度葛店开发区建筑市场监管执法检查	420710202307041275	2023年度葛店开发区建筑市场监管执法检查	不定向	鄂州葛店经济技术开发区住建局	2023-08-30	合格
共查询到 32 条记录 共 4 页								
首页 < 上一页 1 2 3 4 下一页 > 末页								

司法协助信息

序号	被执行人	协助数额	执行法院	执行通知书文号	类型/状态	详情
暂无司法协助信息						
共查询到 0 条记录 共 0 页						
返回 上一页 下一页 末页						

依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关	详情
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息							
共查询到 0 条记录 共 0 页							
返回 上一页 下一页 末页							

协助清除信息

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被清除人姓名	被清除人身份类型	清除日期
暂无协助清除信息					
共查询到 0 条记录 共 0 页					
返回 上一页 下一页 末页					

承诺不实际情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实际情况			
共查询到 0 条记录 共 0 页			
返回 上一页 下一页 末页			

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			
共查询到 0 条记录 共 0 页			
返回 上一页 下一页 末页			

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				
共查询到 0 条记录 共 0 页				
返回 上一页 下一页 末页				

114

■企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2024年度报告	2025年5月12日	查看
2	2023年度报告	2024年1月16日	查看
3	2022年度报告	2023年5月30日	查看
4	2021年度报告	2022年5月30日	查看
5	2020年度报告	2021年6月10日	查看
6	2019年度报告	2020年6月2日	查看
7	2018年度报告	2019年6月13日	查看
8	2017年度报告	2018年6月11日	查看
9	2016年度报告	2017年5月15日	查看
10	2015年度报告	2016年5月16日	查看
11	2014年度报告	2015年5月11日	查看
12	2013年度报告	2014年9月12日	查看

■股东及出资信息

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴出资			实缴出资		
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万 元)

暂无股东及出资信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
----	----	---------	---------	--------	------

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期限	有效期限	许可机关	许可内容	状态	详情
----	--------	--------	------	------	------	------	----	----

暂无行政许可信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
----	----------	----	----	-------	-------	--------	----	------	----

暂无知识产权出质登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

■行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	备注
----	-------	--------	--------	--------	--------	------	----

暂无行政处罚信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 上一页 下一页 末页

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无关联成员信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

提示: 根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定, 企业执行自行制定的企业标准的, 还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标, 请登录企业标准信息公共服务平台 (www.qybz.org.cn) 完成注册填报!

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准号	标准名称	实施时间
暂无执行标准自我声明信息						

共查询到0条记录 共0页

序号	信用承诺事项	信用承诺时限	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			
共查询到 0 条记录 共 0 页			

序号	提供方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							
共查询到 0 条记录 共 0 页				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100			



股东及出资详细信息

■ 股东信息

股东名称

中国建筑第三工程有限公司

认缴额(万元)

1531800

实缴额(万元)

■ 认缴明细信息

认缴出资方式

认缴出资额(万元)

认缴出资日期

货币

1531800

2050年12月31日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式

实缴出资额(万元)

实缴出资日期

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	广东善宇公路工程有限公司				
注册地址	高州市环城东路40号二楼（申报住所）		邮政编码	525200	
联系方式	联系人	李晋全		电话	
	传真			电子邮件	/
法定代表人	姓名	李火才	技术职称	高级工程师	电话
技术负责人	姓名	顾宗杰	技术职称	正高级工程师	电话
营业执照号	91441521MA53P1YA6W		员工总人数: 49 人		
企业资质等级	公路工程施工总承包二级		其中	项目经理	12 人
注册资本	2380 万元			高级职称人员	2 人
成立日期	2019 年 9 月 2 日			中级职称人员	8 人
基本账户 开户银行	广东高州农村商业银行股份有限公司新区分理处			初级职称人员	14 人
基本账户 银行账号	80020000020638520			技工	13 人
经营范围	劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；水利相关咨询服务；室内空气污染治理；水污染治理；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；水运工程监理；住宅室内装饰装修。无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）				

投标人关联企业情况	投标人应提供关联企业情况，包括： (1) 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数 <u>50%</u> 以上的所有股东名称及相应股权比例； 高州市建总工程集团有限公司（原名为广东省高州市建筑工程总公司） 100%。 (2) 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； 本公司没有投资（控股）或管理的下属企业。 (3) 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 高州市建总工程集团有限公司（原名为广东省高州市建筑工程总公司） 广东省筑瀛水利水电建设有限公司 广东巧轩建筑工程有限公司 广东省高州市建筑工程总公司高城营业部 高州市建总投资有限公司
备注	/

注：1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

3. 上述信息如经调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。



照执业指

(副本) (1-1)

统一社会信用代码
91441521MA53P1YA6W

名称	广东普宇公路工程有限公司	注册资本	人民币贰仟叁佰捌拾万元
类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	成立日期	2019年09月02日
法定代表人	李火才	住所	高州市环城东路40号二楼(住所申报)

经营范围

劳务服务（不含劳务派遣）、工程管理服务、园林绿化工程施工、城市绿化管理、体育场地设施工程施工、土石方工程施工、金属门窗工程施工、水利相关劳务分包、室内空气污染治理、水污染治理、环境污染防治服务、大气环境治理、市政建设和市政工程基础设施项目工程总承包及施工、文物保护和工程施工、房屋建筑智能化系统设计、楼宇智能化系统工程、设备安装调试、承接、维修、设计、各类工程建设业务，承接各种工程监理、建设工程设计、建设工程勘察、承接各种项目管理、工程造价咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2024年02月23日

市场主体信用信息公示系统报送公示年度报告

112°ASO87NS7°39.9N, 27°04W

国家企业信用信息公示系统网址:



建筑业企业资质证书

证书编号: D244758763

企业名称: 广东善宇公路工程有限公司

统一社会信用代码: 91441521MA53P1YA6W

法定代表人: 李火才

注册地址: 高州市环城东路40号二楼(住所申报)

有效期: 至2030年06月05日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 公路工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年06月05日



安全产生许可证



编号: (粤)JZ安许证字[2023]008625

企业名称：广东普宇公路工程有限公司
法定代表人：李火才
单位地址：广东省茂名市高州市环城东路40号二楼（住所申报）
经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：建筑施
有效期：2023年05月31日至2026年05月31日



至 2026年05月31日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅
发证日期：2024年05月20日

广东善宇公路工程有限公司基本存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称：广东善宇公路工程有限公司

账户号码：80020000020638520

开户银行：广东高州农村商业银行股份有限公司新区分
理处

法定代表人：李火才

(单位负责人)

基本存款账户编号：J5922004079402



2024 年 03 月 12 日

广东善宇公路工程有限公司在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

资质名称: 资质类型: 请选择 资质等级: 请选择 注册地省份: --请选择省份--

序号	企业名称	法人代表	企业资质	备注
1	广东普宇公路工程有限公司	李火才	公路工程[总承包]贰级 公路路面工程[专业承包]贰级 公路路基工程[专业承包]贰级	

全国公路建设市场监督管理系统

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

注册表

广东普宇公路工程有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

信用综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更记录

企业关联历史记录

基本信息

统一社会信用代码	H14415210NA51PYA6W	企业名称	广东普宇公路工程有限公司
注册地址	广东省	注册类型	有限责任公司
注册资本	2280	注册资金(万元)	2280
经营范围	地基工程	企业类型	有限责任公司（自然人控股或管理的法人独资）
营业执照注册号	2019-09-02	成立日期	2019-09-02
法定代表人	李火才	法定代表人职务	总经理
负责人	李火才	负责人职务	总经理
技术负责人	陈国清	技术负责人职务	高级工程师

分支机构（不含劳务派遣）：工程管理、园林绿化工程施工、城市绿化管理、体育场地设施工程施工、土石方工程施工、金属门窗工程施工、水利相关技术咨询、室内空气质量检测、水污染治理、水环境污染防治服务、大气污染治理、市政设施管理、工程和技术研究和试验发展、文物保护工程施工、房屋建设和市政基础设施项目工程总承包、建筑劳务分包、市政公用化系统设计、建筑智能化系统工程、消防弱电工程、电力热力供应。承接、承包、各类工程建设、施工专业作业、建设工程设计、建设工程施工、工程监理、住宅室内装饰装修。

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

广东善宇公路工程有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

变更记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

主项资质

资质名称:	公路工程	资质承包范围:	总承包
资质等级:	贰级	证书编号:	D244756763
发证机关:	广东省住房和城乡建设厅	发证日期:	2024-06-21

查询

增项资质

序号	资质证书编号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	备注	审核
1	D344352154	公路路面工程	专业承包	贰级	住房和城乡建设部	2024-06-18		审核
2	D344352154	公路路基工程	专业承包	贰级	住房和城乡建设部	2024-06-18		审核

其他资质

序号	资质证书编号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	备注	审核
----	--------	------	------	------	------	------	----	----

无记录

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

广东善宇公路工程有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

变更记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

企业变更信息

序号	原企业名称	新企业名称	变更时间
1	广东善宇建筑工程有限公司	广东善宇公路工程有限公司	2024-06-01 15:45:23

广东善宇公路工程有限公司在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东）的网页截图复印件



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信息查询](#)

[经营异常名录](#)

[严重违法失信名单](#)

输入企业名称

统一社会信用代码或注册号



广东善宇公路工程有限公司

在业（开业）企业

该企业被列入经营异常名录，点击查看详情

统一社会信用代码：91441521MA53P1YA6W

注册号：

法定代表人：李人才

登记机关：高州市市场监督管理局

成立日期：2019年09月02日

年度报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码：91441521MA53P1YA6W

注册号：

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2360.000000万人民币

登记机关：高州市市场监督管理局

住所：高州市环城东路40号二楼（住所申报）

经营范围：劳务派遣（不含劳务派遣）；工程管理服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；水利相关咨询服务；室内空气质量治理；水污染治理；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；文物保护工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；电力设施安装、维修、养护；各类工程建设活动；施工专业作业；建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；水运工程治理；住宅室内装饰装修。*元（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）■

企业名称：广东善宇公路工程有限公司

法定代表人：李人才

成立日期：2019年09月02日

核准日期：2024年02月29日

登记状态：在业（开业）企业

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照经营范围的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdglcn/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自：2019年09月02日

营业期限至：

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
----	------	------	---------	---------	----

126

■股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	持股
1	广东省潮州市建筑工程有限公司	企业法人	企业法人营业执照(非公司)	91440981195127158W	100%

共查询到1条记录共1页

首页 上一页 1 下一页 末页

■主要人员信息

共计3条信息

李火才 经理	官明 监事	李火才 执行董事
-----------	----------	-------------

■分支机构信息

■“多证合一”信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已融合至该企业营业执照

序号	营业执照名称
1	营业执照

共查询到0条记录共0页

首页 上一页 1 下一页 末页

■清算信息

暂无清算信息

■变更信息

序号	变更项目	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案	章程修正案	章程修正案	2024年2月23日
2	名称变更 (企业名称、集团名称等)	广东潮平建筑工程有限公司	广东潮平公路工程有限公司	2024年2月23日
3	章程备案	章程修正案	章程修正案	2023年9月20日
4	地址变更 (住所地址、经营场所、驻在地址等变更)	深圳市宝安区石岩街道流塘社区松白路西13号东欣厂二203	潮州市韩城东路40号二楼 (住所申报)	2023年9月20日

共查询到4条记录共1页

首页 上一页 1 下一页 末页

(二) 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。



说明


中建三局集团有限公司总部共设置 23 个部门，包括投资业务中心、基础设施部事业部、工程管理部、商务管理部、海外事业部等 11 个业务部门，以及人力资源部、合约法务部等 12 个职能部门。局属二级单位及分局共 30 家，其中，房建与基建类单位 13 家、投资类单位 3 家、分局 5 家、营销平台 4 家，海外类、设计类、安装与智能类、技术研发类、科创类各 1 家。

在机构管控上，我局形成了集团化管控模式，将局总部定位为战略管控和运营管控相结合，构建“公共职能+业务管理平台”的架构体系。局属单位定位为业务运营型总部，主要发挥面向市场营销和生产履约的经营管理活动。

在机构定位上，落实专业化和区域化的发展策略。专业化方面，一公司、二公司、三公司、总承包公司作为房屋建造领域主力单位；铁投公司、基建投公司、绿投公司定位为基础设施领域三大旗舰公司；城市投资运营公司、壹品投资公司作为房地产与城镇综合开发平台；绿色投资公司（水务环保公司）作为水务旗舰；科创公司、智能建造装备公司分别作为建筑工业化发展平台和科技装备孵化应用中心；安装公司（智慧事业部）作为新基建业务牵头公司；国际工程公司（海外事业部）为海外业务发展和管控平台。区域化方面，设置 5 大区域公司，北京公司、华东公司、华南公司、西南公司、西北公司，深耕区域重点省区与城市。设置 5 大区域营销平台，西部投资建设、北方投资建设、福建投资建设、华中投资建设、黄河投资建设，专注市场拓展。

(二) 投标人企业组织机构框图

以框图方式表示。

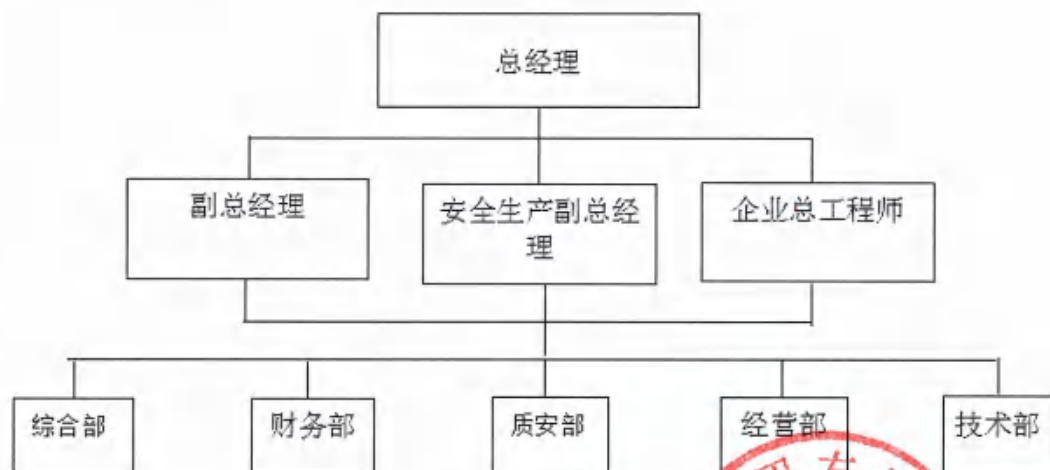

说明

广东善宇公路工程有限公司成立于2019年9月，原注册地为深圳市宝安区，于2023年8月8日由高州市建总工程集团有限公司（原企业名称为广东省高州市建筑工程总公司）全资控股，2023年9月20日注册地迁移至广东省高州市。高州建总集团是粤西地区最早的施工企业之一，成立于1950年，为地方国营正科级单位，市属一级监管企业，为高州市建筑行业龙头企业。经建设部批准为房屋建筑施工总承包壹级企业，目前同时具备市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包壹级。广东善宇公司具备公路工程施工总承包二级资质，公路路基工程专业承包二级资质及公路路面工程专业承包二级资质。

公司专注于公路方向的发展和创新，现聘请了一批具有中级工程师职称以上人才，以及公路专业一级、二级建造师人才一批，来充实公司技术力量。公司现有员工49人，具有专业技术职称的各类专业技术人员13人，其中高级以上职称2人，中级职称8人，持证建造师12人；注册资金2380万元。

公司人力、物力、财力均得到高州市建总工程集团有限公司全力支持，有能力承接各类公路工程业务。

(三) 近年财务状况表

项目或指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
一、注册资本	万元	1531800	1531800	1531800
二、净资产	万元	5742398.91	6675608.3806	7499508.5231
三、总资产	万元	21745190.97	25352255.7305	31785991.3844
四、固定资产	万元	204586.15	224620.9994	202133.4906
五、流动资产	万元	18167997.1	21356323.1894	27607595.1985
六、流动负债	万元	15088788.07	17356884.4364	22732728.0043
七、负债合计	万元	16002792.06	18676647.3499	24286482.8613
八、营业收入	万元	31823169.66	36041650.9937	35242089.4158
九、净利润	万元	930005.64	1106047.7986	1091133.3968
十、现金流量净额	万元	565234.13	367546.2299	815481.0443
十一、主要财务指标				
1. 净资产收益率	%	17.08	16.5684	14.5494
2. 总资产报酬率	%	5.64	4.3602	4.6937
3. 主营业务利润率	%	7.06	3.0696	3.0961
4. 资产负债率	%	73.59	73.6672	76.4162
5. 流动比率	%	120.41	123.0423	121.4443
6. 速动比率	%	109.88	111.9831	120.3407
近三个年度的年平均营业总收入	万元	34368970.0231		

最新年度具有的营运资金（流动资产-流动负债）

万元

4874867.1942

注：1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。
2. 以联合体形式投标的，由联合体牵头人填写即可。

资格审查条件财务情况说明（中建三局集团有限公司）

时间	总负债（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	营运资金（万元）	近三年平均营业总收入（万元）	净利润
2022 年	16002792.06	21745190.97	5742398.91	/	34368970.0231	930005.64
2023 年	18676647.3499	25352255.7305	6675608.3806	/		1106047.7986
2024 年	24286482.8613	31785991.3844	7499508.5231	4874867.1942		1091133.3968

资格审查条件财务情况说明（广东善宇公路工程有限公司）

时间	总负债（万元）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润
2024 年	4161.3045	4280.4098	119.1053	100.623

“全国公路建设市场监督管理系统”财务信息截图（广东善宇公路工程有限公司）

全国公路建设市场监督管理系统						
企业财务信息						
年份	营业收入 (万元)	公路工程营业收入 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	总资产 (万元)	负债总额 (万元)
2024	6253.9507	6253.9507	119.9013	-150.9013	4280.4099	4161.3045
2023	273.7104	273.7104	0	0	4280.4099	4161.3045
2022	0	0	0	0	4280.4099	4161.3045
2021	0	0	0	0	4280.4099	4161.3045
2020	0	0	0	0	4280.4099	4161.3045

主要财务指标		指标名称	指标值
主要财务指标	1. 净资产收益率 (%)	净资产收益率 (%)	3.4
	2. 总资产报酬率 (%)	总资产报酬率 (%)	6
	3. 主营业务利润率 (%)	主营业务利润率 (%)	4
	4. 资产负债率 (%)	资产负债率 (%)	97
	5. 流动比率 (%)	流动比率 (%)	138
	6. 速动比率 (%)	速动比率 (%)	135

附件: (2024) 058号善宇审计报告.pdf 3.7 MB

“全国公路建设市场监督管理系统”财务信息截图（中建三局集团有限公司）

全国公路建设市场监督管理系统							
财务信息							
当前年份: 2019年							
年份	营业收入 (万元)	公路工程施工收入 (万元)	净利润 (万元)	纳税情况	操作		
2019	25242019.1154	1630401	749004.5231	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录
2018	26881310.9937	3804401	6676006.3046	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录
2017	11823109.60	1570000.00	572700.00	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录
2016	2703211.23	2412502	5140002.51	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录
2015	24082742.5	4640000.00	4541014.78	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录
2014	22041954.43	5577579.436	2871352.67	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录
2013	18055471.6474	4101175.436	3035008.5417	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录
2012	14997615.8	1832474.72	2229797.5	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录
2011	14062083.00	121954.88	1000326.19	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录
2010	12722023.7	880216.11	1314012.02	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录
2009	11800979.76	1121162.06	997823.91	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录
2008	3231432	08270	50297	纳税通过	查看详情	申请复核	查看记录

2023 年“全国公路建设市场监督管理系统”财务信息截图（中建三局集团有限公司）

全国公路建设市场监督管理系统

编辑企业财务信息

统计年份: 2023

注册资金 (万元): 1531800

总资产 (万元): 25352255.7305

流动资产 (万元): 21356323.1894

负债合计 (万元): 18676647.3499

净利润 (万元): 1106047.7986

实收资本 (万元):

建筑业总产值 (万元):

工程结算收入 (万元):

银行授信等级:

净资产 (万元): 6675608.3806

固定资产 (万元): 246263994

流动负债 (万元): 17350884.4054

营业收入 (万元): 36041650.9937

现金流量净额 (万元): 367546.2299

银行授信额度 (万元):

上缴建筑营业税 (万元):

建筑业增加值 (万元):

公路工程总收入 (万元): 2896600

主要财务指标:

1.净资产收益率 (%): 16.5684

2.总资产报酬率 (%): 4.3602

3.主营业务利润率 (%): 3.0696

4.资产负债率 (%): 73.6672

5.流动比率 (%): 123.0423

6.速动比率 (%): 111.9831

附件:

中建三局集团有限公司合并版本 (2023) .pdf 9.2 MB

取消

2024 年“全国公路建设市场监督管理系统”财务信息截图（中建三局集团有限公司）

全国公路建设市场监督管理系统

编辑企业财务信息

统计年份: 2024

注册资金 (万元): 1531809

总资产 (万元): 31785991.3844

流动资产 (万元): 27607595.1985

负债合计 (万元): 24286482.8613

净利润 (万元): 1091133.3968

实收资本 (万元):

建筑业总产值 (万元):

工程结算收入 (万元):

银行授信等级:

主要财务指标:

附件: 中建三局集团有限公司2024年年度报告.pdf 4.5 MB

净资产 (万元): 7495508.523

固定资产 (万元): 3021334986

流动负债 (万元): 232728.0048

营业收入 (万元): 26242007.4158

现金流量净额 (万元): 8154816.443

银行授信额度 (万元):

上期建筑业增收 (万元):

建筑业增加值 (万元):

公路工程总收入 (万元): 1638600

1.净资产收益率 (%): 14.5494

2.总资产报酬率 (%): 4.6937

3.主营业务利润率 (%): 3.0961

4.资产负债率 (%): 76.4162

5.流动比率 (%): 121.4443

6.速动比率 (%): 120.3407

取消

(四) 近年完成的类似项目情况表

(四)-1完成的类似项目情况表

序号	1
项目名称	207 国道团林至砖桥、桃园至子陵公路工程 PPP 项目
项目所在地	湖北省
发包人名称	荆门中建二零七公路建设有限公司
发包人地址	荆门市东宝区象山一路 28 号（金象广场二期）1-2-3 幢 4 层
发包人电话	
合同价格	88294.7700 万元
开工日期	2018-05-01
交工（或一次性竣工）日期	2021-11-10
承担的工作	合同范围内约定的全部施工内容
工程质量评分（或等级）	合格
项目经理	陈学松
项目总工	叶亦盛
总监理工程师及电话	/
项目描述	207 国道团林至砖桥、桃园至子陵公路工程 PPP 项目，中建三局集团有限公司承接 207 国道荆门桃园至子陵段，本段总投资 139035.25 万元，施工合同额 88294.77 万元。本段起点接 207 国道襄阳宜城段，经胡集镇、双河镇、子陵镇，终点顺接 207 国道子陵至砖桥段，全长约 59.352 公里。项目全线采用设计速度 80km/h、路基宽度 24.5 米的双向四车道一级公路标准建设。本工程起讫里程为 K0+000.000~K59+173.444，全长 59.352 km，总体呈南北走向，全线扩建段共分三段，长度共 22.7km，新建长度共 36.6km，其中桥梁 18 座，涵洞 190 座，涉铁下穿通道 1 座，养护站 1 处，收费站 1 座，停车区 2 处。具体主要包括：①路基工程：全长 59.352km，K0+000~K34+000 段为 1.2m 渣石路床，其余段落路床为 0.8m 渣石路床，清表 4.65 万方，挖土方 14.31 万方，填土方 20.69

	万方，挖石方 5.65 万方，填石方 6.15 万方，填石渣 106.94 万方，清淤 20 万方。②路面工程：全长 59.352km，结构形式为（18cm 级配碎石+18cm3.0%水泥稳定碎石+18cm4.0%水泥稳定碎石+18cm5.0%水泥稳定碎石+乳化沥青透层（PC-2）+热沥青封层+8cm 粗粒式改性沥青混凝土（AC-25C）+改性乳化沥青粘层（PCR）+4cm 细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）。）其中 3.0%水泥稳定碎石 16055 立方，4.0%水泥稳定碎石 31101 立方，5.0%水泥稳定碎石 34648 立方，乳化沥青透层（PC-2）1339256 m²，热沥青封层 1339256 m²，8cm 粗粒式改性沥青混凝土（AC-25C）1359780 m²，改性乳化沥青粘层（PCR）2719559 m²，4cm 细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）1359780 m²。③桥梁工程：寺枯桥（长度 32.4m，桥跨结构形式 1-25m 箱梁）、尹湾桥（长度 45.54，桥跨结构形式 3-13m 空心板）、楼子湾桥（长度 45.04m，桥跨结构形式 3-13m 空心板）、康乐水库溢洪道桥（长度 45.04m，桥跨结构形式 3-13m 空心板）、杜家冲水库桥（长度 32m，桥跨结构形式 1-25m 箱梁）、长冲水库桥（长度 32m，桥跨结构形式 1-25m 箱梁）、上跨襄荆高速分离式立交桥（长度 187m，桥跨结构形式引桥为 2-25m 箱梁，主桥为 35+60+35 钢箱梁）、丽山桥（长度 32.04m，桥跨结构形式 2-13m 空心板）、古家坪桥（长度 32m，桥跨结构形式 1-25m 箱梁）、乐乡关大桥（长度 167m，桥跨结构形式 8-20m 箱梁）、蔡家嘴 2 号桥（长度 32.04m，桥跨结构形式 2-13m 空心板）、蔡家嘴 3 号桥（长度 32.04m，桥跨结构形式 2-13m 空心板）、庙岗小桥（长度 33.04m，桥跨结构形式 2-13m 空心板）、建泉水库桥（长度 32m，桥跨结构形式 1-25m 箱梁）、四干渠 1 号桥（长度 28m，桥跨结构形式 1-20m 箱梁）、四干渠 2 号桥（长度 27m，桥跨结构形式 1-20m 箱梁）、四干渠 3 号桥（长度 19.04m，桥跨结构形式 1-13m 空心板）、火焰冲中桥（长度 46.04m，桥跨结构形式 3-13m 空心板）；④涵洞：共计 190 座，总长 6613.6 米，其中管涵 128 道，共计 4365.24 米，盖板涵 50 道，共计 1841.32 米，倒虹吸 12 道，共计 407 米。⑤交安工程：标志牌共 388 块，热熔标线共 61275 m²，波形护栏共 92594m，轮廓标共 1977 个，百米桩 532 个，突起路标 15798 个，防眩板 82100 块；⑥绿化工程：种植长度 59798 米，樟树 23665 棵，红叶石楠 880 平方米，金边黄杨 690 平方米，红继木 505 平方米，麦冬 275 平方米。⑦其中改建 G207 国道下穿焦柳铁路通道一座，交点铁路里程 K573+157.11，位于胡集至双河区间。
备注	是作为附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）业绩

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用事项

企业变更历史

企业特殊历史记录

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩符合以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且完工时间在5年之前。企业录入业绩时，系统会自动审核，符合以上两种情况的，系统会自动审核通过。不符合的，系统会自动审核不通过，企业需要重新录入。

项目名称： 207国道团林至峙岭、桃园 业绩所在省份： --请选择省份-- 搜索

序号	项目名称	标段名称	合同金额（万元）	结算价（万元）	开工日期	交工日期	录入日期	业绩所在省份	审核状态	备注
1	207国道团林至峙岭、桃园至子陵公路PPP项目	207国道团林至子陵路段改造工程	66294.7700		2018-05-01	2021-11-10	2022-06-08	湖北省	省厅审核	

企业名称	中建三局集团有限公司		
工程名称	207国道团林至砖桥、桃园至子陵公路工程PPP项目	项目类型	一级公路
合同价(万元)	88294.7700	结算价(万元)	
技术等级	一级公路	合同段名称	207国道桃园至子陵段改建工程
开工日期	2018-05-01	交工日期	2021-11-10
竣工日期		建设状态	总包已建
合同段开始桩号	K0+000.000	合同段结束桩号	K59+352.000
质量评定情况	合格	所在省份	湖北省
项目代码			
主要工程	207国道团林至砖桥、桃园至子陵公路工程 PPP 项目, 中建三局集团有限公司承接207国道荆门桃园至子陵段, 本段总投资139035.25万元, 施工合同额88294.77万元。本段起点接207国道襄阳宜城段, 经胡集镇、双河镇、子陵镇, 终点顺接207国道子陵至砖桥段, 全长约59.325公里。项目全线采用设计速度80km/h、路基宽度24.5米的双向四车道一级公路标准建设。本工程起讫里程为K0+000.000~K59+173.444, 全长59.352km, 总体呈南北走向, 全线扩建段共分三段, 长度共22.7km, 新建长度共36.6km, 其中桥梁18座, 涵洞190座, 涉铁下穿通道1座, 养护站1处, 收费站1座, 停车区2处。具体主要包括: ①路基工程: 全长59.352km, K0+000~K34+000段为1.2m渣石路床, 其余段落路床为0.8m渣石路床, 清表4.65万方, 挖土方14.31万方, 填土方20.69万方, 挖石方5.65万方, 填石方6.15万方, 填石渣106.94万方, 清淤20万方。②路面工程: 全长59.352km, 结构形式为(18cm级配碎石+18cm3.0%水泥稳定碎石+18cm4.0%水泥稳定碎石+18cm5.0%水泥稳定碎石+乳化沥青透层(PC-2)+热沥青封层+8cm粗粒式改性沥青混凝土(AC-25C)+改性乳化沥青粘层(PCR)+4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C))。其中3.0%水泥稳定碎石16055立方, 4.0%水泥稳定碎石31101立方, 5.0%水泥稳定碎石34648立方, 乳化沥青透层(PC-2)1339256m², 热沥青封层1339256m², 8cm粗粒式改性沥青混凝土(AC-25C)1359780m², 改性乳化沥青粘层(PCR)2719559m², 4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C)1359780m²。③桥梁工程: 寺姑桥(长度32.4m, 桥跨结构形式1-25m箱梁)、尹湾桥(长度45.54, 桥跨结构形式3-13m空心板)、楼子湾桥(长度45.04m, 桥跨结构形式3-13m空心板)、廖东水库溢洪道桥(长度45.04m, 桥跨结构形式3-13m空心板)、杜家冲水库桥(长度32m, 桥跨结构形式1-25m箱梁)、长冲水库桥(长度32m, 桥跨结构形式1-25m箱梁)、上跨襄荆高速分离式立交桥(长度187m, 桥跨结构形式引桥为2-25m箱梁, 主桥为35+60+35m箱梁)、丽山桥(长度32.04m, 桥跨结构形式2-13m空心板)、古家坪桥(长度32m, 桥跨结构形式1-25m箱梁)、乐乡关大桥(长度187m, 桥跨结构形式8-20m箱梁)、蔡家嘴2号桥(长度32.04m, 桥跨结构形式2-13m空心板)、蔡家嘴3号桥(长度32.04m, 桥跨结构形式2-13m空心板)、庙岗小桥(长度33.04m, 桥跨结构形式2-13m空心板)、建泉水库桥(长度32m, 桥跨结构形式1-25m箱梁)、四干渠1号桥(长度28m, 桥跨结构形式1-20m箱梁)、四干渠2号桥(长度27m, 桥跨结构形式1-20m箱梁)、四干渠3号桥(长度19.04m, 桥跨结构形式1-13m空心板)、火焰冲中桥(长度46.04m, 桥跨结构形式3-13m空心板); ④涵洞: 共计190座, 总长6613.6米, 其中管涵128道, 共计4365.24米, 盖板涵50道, 共计1841.32米, 倒虹吸12道, 共计407米。⑤交安工程: 标志牌共389块, 热熔标线共61275m², 波形护栏共92594m, 轮廓标共1977个, 百米桩532个, 突起路标15798个, 防眩板82100块, 绿化工程: 种植宽度59798米, 樟树23665棵, 红叶石楠880平方米, 金边黄杨690平方米, 红继木505平方米, 麦冬275平方米。⑥其中改建G207国道下穿焦柳铁路通道一座, 交点铁路里程K573+157.11, 位于胡集至双河区间。		
人员履约信息			
序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	陈学松	项目经理	2019-08-20~2021-11-10
2	柳楚卫	项目副总监	2020-11-26~2021-11-10
3	沈红伟	项目副经理	2018-05-01~2021-11-10
4	易先兵	项目副总监	2018-05-01~2021-11-10
5	叶亦盛	项目总工	2018-05-01~2021-11-10

(四) 近年完成的类似项目情况表

(四)-1完成的类似项目情况表

序 号	2
项目名称	武汉至阳新高速公路（武汉至鄂州段）二标段
项目所在地	湖北省
发包人名称	武汉市武阳高速公路投资管理有限公司
发包人地址	武汉市东湖新技术开发区004县道龙泉山风景区公共服务中心 218室A007
发包人电话	
合同价格	219531.8528万元
开工日期	2020-06-01
交工（或一次性竣工）日期	2023-04-28
承担的工作	本合同段包括一期土建工程（K24+085.900~K34+630.320）全长10.54km。主要施工内容包括路基工程、桥涵工程等其他附属工程，
工程质量评分（或等级）	合格
项目经理	张云龙
项目总工	游亿财
总监理工程师及电话	/
项目描述	本合同段包括一期土建工程（K24+085.900~K34+630.320）全长10.54km。主要施工内容包括路基工程、桥涵工程等其他附属工程，主要工程量如下：1. 路基工程长1254.86m，其中鄂咸高速拼宽路基 795.485m，长港互通匝道路基 459.375m（其中B匝道35.505m，C匝道356.287m，D匝道17.158m，E匝道50.207m），挖方16622m ³ 、填方78396m ³ ，特殊路基处理长度1194.1m（其中PHC管桩952.9m、水泥搅拌桩241.2m），边坡防护2034.45m、排水工

	程1755.75m。2.桥梁工程:包含特大桥6座(含长港互通匝道桥)、大桥7座(含长港互通匝道桥长港互通鄂咸高速拼宽桥)、互通立交1处、拼宽桥1处。共有桩基2156根,墩台2044座,预应力砼箱梁4170榀、预应力砼T梁102榀(集中预制)。其中特大桥6座: 1)长港枢纽互通主线桥,全长2447m,跨径组合:4×30+4×30+4×30+4×30+5×30+4×29.2+3×29.2+3×29.1+3×29.1+5×29.1+5×29.1+5×30+(25+2×30+28.1)+6×25+4×28.1+40+5×29.3+3×25+3×30+3×30+3×30+3×30m,结构形式为装配式预应力砼小箱梁;2)跨G316大桥,全长2817.8m,跨径组合左幅:5×30+4×30+30+5×28.6+40+5×30+4×29.25+4×29.25+4×30+4×30+5×30+5×30+4×30+40+4×25+5×29+5×29+5×29+5×29+5×29.4+5×29.4+4×30+40+4×29.2m;右幅:5×30+4×30+30+5×30+40+5×28.6+4×29.25+4×29.25+4×30+4×30+5×30+5×30+4×25+40+4×30+5×29+5×29+5×29+5×29+5×29.4+5×29.4+4×29.2+40+4×30m,结构形式为装配式预应力砼小箱梁;3)长港河大桥,全长2035.147m,跨径组合左幅:5×30+4×30+30+4×30+4×30+(4×29+29.147)+(70+120+70)+4×30+4×30+4×30+4×30+5×30+5×29+3×30+3×25+5×30m;右幅:5×30+4×30+30+4×30+4×30+(4×29+29.147)+(70+120+70)+4×30+4×30+4×30+4×30+5×30+5×29+3×25+3×30+5×30m,结构形式为装配式预应力砼小箱梁、预应力混凝土变截面连续梁;4)东风农场大桥,全长3240m,跨径组合左幅:5×30+4×30+3×(3×30)+2×30+4×30+3×30+2×(4×30)+2×(3×30)+4×30+4×30+30+5×30+5×30+5×30+5×30+5×30+5×30+5×30+4×30+4×30m;右幅:5×30+4×30+6×(3×30)+4×30+3×30+2×(4×30)+3×30+4×30+30+5×30+5×30+5×30+5×30+5×30+5×30+5×30+5×30+5×30+5×30+5×30+4×30+4×30m,结构形式为装配式预应力砼小箱梁;5)长港互通A匝道桥,全长1270.114m,跨径组合3×30+3×30+3×27.6+2×27.6+3×25+3×30+2×27.281+2×28+(27.2+2×27)+3×26+3×26+4×25+4×25+(22.152+22.2)+3×25+4×30m,结构形式为装配式预应力砼小箱梁、现浇预应力混凝土等高度连续梁、钢箱组合梁;6)长港互通G匝道桥,全长1424.358m,跨径组合3×30+3×30+2×24+3×25+3×25+3×25+3×25+3×25+3×24.6+3×24.6+(2×24.6+24.64)+2×28+(26.718+2×26.7)+3×25+40+4×30+(30+35)+3×29.6+3×25m,结构形式为装配式预应力砼小箱梁、现浇预应力混凝土等高度连续梁、钢箱组合梁;。
备注	是作为附录3资格审查条件(业绩最低要求)业绩

注:1.每张表格只填写一个项目,并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3.以联合体形式投标的,联合体各成员应分别填写。

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息

资质证书

人员信息

业绩信息

诚信记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业发展历史

企业信用历史记录

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，自完工时间在5年之前的业绩。

项目名称：武汉至阳新高速公路（武汉） 业绩所在省份：--请选择省份--

搜索

序号	项目名称	标段名称	合同金额（万元）	结算价（万元）	开工日期	完工日期	录入日期	业绩所在省份	信用等级	备注
1	武汉至阳新高速公路（武汉至鄂州段）二标段	武汉至阳新高速公路（武汉至鄂州段）二标段	219531.8528		2020-06-01	2023-04-28	2019-12-04	湖北省	信用评级	

(四) 近年完成的类似项目情况表

(四)-1完成的类似项目情况表

序 号	3
项目名称	成雅快速通道(雅安段)新建项目施工总承包一标段
项目所在地	四川省
发包人名称	雅安市交通运输局
发包人地址	雅安市雨城区宁雅路44号
发包人电话	
合同价格	113532.644万元
开工日期	2017-11-01
交工（或一次性竣工）日期	2022-05-28
承担的工作	起讫里程为K0+00~K29+698.5，设计标准为双向六车道一级公路，承担的工作包括路基、路面、桥梁、涵洞、服务区、交安等。
工程质量评分（或等级）	合格
项目经理	段军朝
项目总工	柳楚卫
总监理工程师及电话	/
项目描述	本项目为国道108线成雅快速通道(雅安段)新建项目一标段，线路里程桩号为：K0+00~K29+698.5。设计标准为双向六车道一级公路，设计行车速度80km/h。主要工程量包含路基、路面、桥梁、涵洞、服务区、交安等，其中①路基、路面工程：道路结构形式为路基+15cm碎石垫层+56cm水稳层+1cm碎石封层+16cm沥青层。新建路基全长28.198km，利用段1.5km，路基填方199万m³、路基挖方466万m³、路基水泥稳定碎石265.5万m³、路基级配碎石114.02万m³，路面全长29.685km，采用沥青混凝土路面，路面沥青69.72万平方米，路面混凝土9.12万m³；②桥涵工程：桥梁17座，共3.385km，依次为香水寺中桥（预应力砼简支小箱梁3×20）、玉溪堰右干

	渠中桥（预应力砼简支小箱梁3×20）、银木村大桥（预应力砼简支T梁8×30）、成雅高速跨线大桥（预应力砼简支T梁、钢箱梁30+55+30）、黄瓜山中桥（预应力砼简支T梁2×30）、欧家沟大桥（预应力砼简支T梁、钢箱梁20+9-30）、瓦石窑大桥（预应力砼简支T梁7×30）、杨湾大桥（预应力砼简支T梁7×30）、学堂湾大桥（预应力砼简支T梁7×30）、阡沟2号大桥（预应力砼简支T梁4×30）、宋湾大桥（预应力砼简支T梁11×30）、长地湾大桥（预应力砼简支T梁7×30）、枕头岗大桥（预应力砼简支T梁12×30）、龙沟大桥（预应力砼简支T梁6×30）、红庙子大桥（预应力砼简支T梁4×30）、张店子大桥（预应力砼简支T梁25×20）、陈家沟大桥（预应力砼简支T梁6×20）。1-8x5m钢筋混凝土暗板桥8座共281.25m，立交桥、渡槽兼人行天桥6座共190m，涵洞82道共1343.25m，防护工程11.3万方，服务区1个，左右分幅设计共100亩，以及本标段范围内交安设施、绿化、机电等。
备注	是作为附录3资格审查条件（业绩最低要求）业绩

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

全国公路建设市场监督管理系统

人民信譽第一 业绩信譽第一

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业发展历史

企业转移历史记录

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且完工时间在5年之前的业绩。

项目名称： 成渝

业绩所在省份： --请选择省份--

搜索

序号	项目名称	标段名称	合同金额(万元)	结算价(万元)	开工日期	交工日期	录入日期	业绩所在省份	信息来源	备注
1	成渝快速通道(雅安段)新建项目施工总承包一标段	成渝快速通道(雅安段)新建项目施工总承包一标段	113532.6440		2017-11-01	2022-05-23	2023-05-06	四川省	设计审核	

企业名称 中建三局集团有限公司

工程名称 成渝快速通道(雅安段)新建项目施工总承包一标段

项目类型 一级公路

合同价(万元) 113532.6440

结算价(万元)

技术等级 一级公路

合同段名称 成渝快速通道(雅安段)新建项目施工总承包一标段

开工日期 2017-11-01

交工日期 2022-05-23

竣工日期

建设状态 总包已建

合同段开始桩号 K0+00

合同段结束桩号 K29+698.5

质量评定情况 合格

所在省份 四川省

项目代码

主要工程量

本项目为国道108线成渝快速通道(雅安段)新建项目一标段，线路里程桩号为：K0+00~K29+698.5。设计标准为双向六车道一级公路，设计行车速度80km/h。主要工程量包含路基、路面、桥梁、涵洞、服务区、立交等，其中①路基、路面工程：道路结构形式为路基+15cm碎石垫层+56cm水稳层+1cm碎石封层+16cm沥青层。新建路基全长28.198km，利用段1.5km，路基填方199万m³、路基挖方466万m³、路基水泥稳定碎石265.5万m³、路基级配碎石114.02万m³，路面全长29.685km，采用沥青混凝土路面，路面沥青69.72万平方米，路面混凝土9.12万m³；②桥涵工程：桥梁17座，共3.385km，依次为香水寺中桥(预应力砼简支小箱梁3×20)、玉溪堰右干渠中桥(预应力砼简支小箱梁3×20)、银木村大桥(预应力砼简支T梁8×30)、成渝高速跨线大桥(预应力砼简支T梁、钢箱梁30+55+30)、黄瓜山小桥(预应力砼简支T梁2×30)、欧家沟大桥(预应力砼简支T梁、钢箱梁20+9+30)、瓦石窑大桥(预应力砼简支T梁7×30)、杨湾大桥(预应力砼简支T梁7×30)、学堂湾大桥(预应力砼简支T梁7×30)、闻沟2号大桥(预应力砼简支T梁4×30)、宋湾大桥(预应力砼简支T梁11×30)、长地湾大桥(预应力砼简支T梁7×30)、枕头岗大桥(预应力砼简支T梁12×30)、龙沟大桥(预应力砼简支T梁6×30)、红庙子大桥(预应力砼简支T梁4×30)、张店子大桥(预应力砼简支T梁25×20)、陈家沟大桥(预应力砼简支T梁6×20)。1-Bx5m钢筋混凝土盖板桥8座共281.25m，立交桥、渡槽兼人行天桥6座共190m，涵洞82道共1343.25m，防护工程11.3万方，服务区1个，左右分幅设计共100亩，以及本标段范围内立交设施、绿化、机电等。

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	周春雷	项目副经理	2017-11-01~2022-05-23
2	段军朝	项目经理	2017-11-01~2019-08-10

中建三局集团有限公司变更（备案）信息证明

（如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。）

变更（备案）信息

企业名称：中建三局集团有限公司

统一社会信用代码：91420000757013137P

变更（备案）事项	变更（备案）日期	变更（备案）前内容	变更（备案）后内容
投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	2023-06-05 16:01:19	股东名称：中国建筑第三工程局有限公司，认缴出资额：2100000万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2042-12-31；	股东名称：中国建筑第三工程局有限公司，认缴出资额：1531800万，币种：人民币，认缴出资方式：货币，认缴出资时间：2050-12-31；
注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）	2023-06-05 16:01:19	2100000 万元（币种：人民币）	1531800 万元（币种：人民币）
章程备案	2023-06-05 16:01:19		章程
高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	2023-04-14 09:35:31	姓名：甘明生，职务：监事；姓名：张琨，职务：董事；姓名：王胜民，职务：董事；姓名：陈卫国，职务：董事长；姓名：胡金国，职务：董事；姓名：李琦，职务：董事；姓名：李琦，职务：经理	姓名：张琨，职务：监事；姓名：杨红亮，职务：董事；姓名：王胜民，职务：董事；姓名：陈卫国，职务：董事长；姓名：周至，职务：董事；姓名：周至，职务：经理
注册资本(或外债中方认缴资本)	2022-10-26 09:53:28	1500000	2100000.000000
章程	2022-10-26 09:53:28		章程备案
股东名录	2022-10-26 09:53:28	中国建筑第三工程局有限公司；100%；	中国建筑第三工程局有限公司；100%；
注册资本(或外债中方认缴资本)	2022-06-14 14:47:15	1350000	1500000.000000



章程	2022-06-14 14:47:15		章程备案
股东认缴出资	2022-06-14 14:47:15	中国建筑第三工程局有限公司： (出资额： 1350000.0000 万元，出资比例： 100%)；	中国建筑第三工程局有限公司： (出资额： 1500000.0000 万元，出资比例： 100%)；
股东名录	2022-06-14 14:47:15	中国建筑第三工程局有限公司： 100%；	中国建筑第三工程局有限公司： 100%；
章程	2021-07-16 10:28:44		章程备案
章程	2021-05-08 09:29:39		章程备案
股东名录	2021-03-19 10:26:09	中国建筑第三工程局有限公司： 100%；	中国建筑第三工程局有限公司： 100%；
注册资本(或外 资中方认缴资本)	2021-03-19 10:26:09	1500000	1350000.000000
章程修正案	2021-03-19 10:26:09		章程修正案备案
章程	2021-02-23 14:39:46		章程备案
管理人员	2021-02-23 14:39:46	陈文健(董事长)、 张琨(董事)、胡 金国(董事)、李 淼磊(董事)、朱 建辉(监事)、孙 晓磊(监事)、曹 庆和(监事)、陈 卫国(董事)	张琨(董事)、胡 金国(董事)、甘 明生(监事)、陈 卫国(董事长)、 李琦(董事兼总 经理)、王胜民 (董事)
法定代表人(负 责人、独资投资 人)	2021-02-23 14:39:46	陈文健	陈卫国
股东名录	2020-11-06 16:01:49	中国建筑第三工程局有限公司： 100%；	中国建筑第三工程局有限公司： 100%；
注册资本(或外 资中方认缴资本)	2020-11-06 16:01:49	800000	1500000.000000



管理人员	2020-04-13 10:31:26	陈华元（董事长）、 张琨（董事）、胡 金国（董事）、李 森磊（董事）、朱 建辉（监事）、孙 晓惠（监事）、曹 庆和（监事）、陈 卫国（董事）	陈文健（董事长）、 张琨（董事）、胡 金国（董事）、李 森磊（董事）、朱 建辉（监事）、孙 晓惠（监事）、曹 庆和（监事）、陈 卫国（董事）
法定代表人（负 责人、独资投资 人）	2020-04-13 10:31:26	陈华元	陈文健
多证合一	2020-04-13 10:31:26		公章刻制备案,单 位办理住房公积 金缴存登记,营业 执照,税务登记证, 机构代码证,社会 保险登记证,统计 证
经营范围	2020-04-13 10:31:26	各类建筑工程总 承包、施工、咨 询、建筑技术开 发与转让、机械 设备租赁、路桥 建设、建筑工程、 人防工程设计、 商品混凝土的生 产和批发、园林 绿化工程、爆破 作业设计施工 （四级，有效期 至2022年8月21 日）（涉及许可经 营项目，应取得 相关部门批准后 方可经营）	各类建筑工程总 承包、施工、咨 询、建筑技术开 发与转让、机械 设备租赁、路桥 建设、建筑工程、 人防工程设计、 商品混凝土的生 产和批发、园林 绿化工程、爆破 作业设计施工 （四级，有效期 至2022年8月31 日）、建筑材料 （销售）、销售、 机电设备安装、 防水处理设备销 售、土石方设备销 售、
经营范围	2019-08-21 17:19:47	各类建筑工程总 承包、施工、咨 询、建筑技术开 发与转让、机械 设备租赁、路桥	各类建筑工程总 承包、施工、咨 询、建筑技术开 发与转让、机械 设备租赁、路桥



		建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程。（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东名录	2019-01-16 09:02:25	中国建筑第三工程局有限公司：99.9954%；中建三局房地产开发有限公司：0.0046%；	中国建筑第三工程局有限公司；
详细企业类型	2019-01-16 09:02:25		有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
章程	2019-01-16 09:02:25		章程备案
管理人员	2019-01-16 09:02:25	何晓梅、田涛、李勇、陈华元、易文权、陆仁星、郝良军、张琨、胡金国	陈华元、张琨、胡金国、李磊磊、朱建辉、孙晓惠、曹庆和、陈卫国
经营范围	2019-01-16 09:02:25	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）。	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑工程、人防工程设计、商品混凝土的生产和批发、园林绿化工程。（需持许可证、资质证经营的，凭许可证、资质证经营）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

			可经营)
股东名录	2016-03-28 15:23:42	中建三局房地产开发有限公司: 0.01%;中国建筑第三工程局有限公司:99.99%;	中建三局房地产开发有限公司: 0%;中国建筑第三工程局有限公司: 99.99%;
注册资本(或外 资中方认缴资本)	2016-03-28 15:23:42	300000	800000,000000
详细企业类型	2013-11-26 16:39:53	股份有限公司	有限责任公司
管理人员	2013-11-26 16:39:53	易文权,	陈华元, 易文权, 陆仁早, 鄢良军, 张琨, 胡金国, 李 勇, 何晓梅, 田海,
股东名录	2013-11-26 16:39:53	中田建筑第三工程局有限公司, 31276.24(万元) 85.38%;中国建筑 科学研究院, 195.09(万元) 0.63%;武汉钢铁 集团鄂城钢铁有 限责任公司, 195.09(万元) 0.63%;中国华闻 投资控股有限公司, 650.29(万元) 1.78%;香港协兴 建筑有限公司, 3063.0(万元) 10%;中国光大 (澳门)有限公 司,650.292(万元) 2%;	中国建筑第三工 程局有限公司, 299063.37(万元) 99.99%;中建二局 房地产开发有限 公司,36.63(万元) 0.01%;
企业名称	2013-11-26 16:39:53	中建二局建设工 程股份有限公司	中建二局建设工 程股份有限公司
章程	2013-04-07 00:00:00		章程
注册资本(或外 资中方认缴资本)	2012-12-20 00:00:00	注册资本: 36630.0币种: 156,	注册资本: 300000.0币种: 156,



实收资本(或外 资中方实收资本)	2012-12-20 00:00:00	36630.0	300000.0
章程	2012-12-19 00:00:00		章程备案
章程	2012-12-10 00:00:00		章程备案
章程	2012-12-03 00:00:00		章程备案
章程	2012-08-24 00:00:00		章程备案
法定代表人(负 责人、独资投资 人)	2011-10-13 00:00:00	证件号码: 370102195011292 913, 姓名:熊德荣, 家庭住址:	证件号码: 420122196108280 059, 姓名:陈华元, 家庭住址:
经营范围	2011-07-08 00:00:00	经营范围(主营): 各类建筑工程总 承包、施工、咨 询、建筑技术开 发与转让、机械 设备租赁、路桥 建设、商品混凝 土的生产和批发 (需持许可证、 资质证经营的, 凭许可证、资质 证经营)。	经营范围(主营): 各类建筑工程总 承包、施工、咨 询、建筑技术开 发与转让、机械 设备租赁、路桥 建设、建筑工程、 人防工程设计、 商品混凝土的生 产和批发(需持 许可证、资质证 经营的,凭许可 证、资质证经营)。
详细企业类型	2009-12-22 00:00:00	股份有限公司(台 港澳与境内合资, 未上市)	股份有限公司
章程	2009-12-22 00:00:00		章程备案
股东名录	2008-03-24 00:00:00	中国建筑第三工 程局, 出资 31276.24 万人民 币, 占 85.38% 中国建筑科 学研究院, 出资 195.09 万人民币, 占 0.53% 武 汉钢铁集团鄂城	香港协兴建筑有 限公司, 出资 3655 万人民币, 占 10% 中国光 (澳门)有限公 司, 出资 600.202 万人民币, 占 2% 中国建筑第 三工程局有限公

		钢铁有限责任公司, 出资 195.09 万人民币, 占 0.53% 中国华闻投资控股有限公司, 出资 650.29 万人民币, 占 1.78% 香港协兴建筑有限公司, 出资 3663 万人民币, 占 10% 中国光大(澳门)有限公司, 出资 650.29 万人民币, 占 2% 中国	司, 出资 31276.24 万人民币, 占 85.38% 中国建筑科学研究院, 出资 195.09 万人民币, 占 0.53% 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司, 出资 195.09 万人民币, 占 0.53% 中国华闻投资控股有限公司, 出资 650.29 万人民币, 占 1.78% 中国
投资者名称(姓名)	2008-03-24 00:00:00	中国建筑第三工程局;	中国建筑第三工程局有限公司;
其他	2007-09-10 00:00:00	企股鄂总字第 003135 号	420000100000435
经营范围	2007-09-10 00:00:00	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械、设备租赁、路桥建设(需持许可证、资质证经营的, 凭许可证、资质证经营)。	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械、设备租赁、路桥建设、商品混凝土的生产和批发(需持许可证、资质证经营的, 凭许可证、资质证经营)。
股东名录	2007-09-10 00:00:00	中国建筑第三工程局, 出资 31276.2434 万人民币, 占 85% 中国建筑科学研究院, 出资 195.0876 万人民币, 占 1% 鄂城钢铁集团有限责任公司, 出资 195.0867 万人民币, 占 1% 中国华闻投资控股	中国建筑第三工程局, 出资 31276.24 万人民币, 占 85.38% 中国建筑科学研究院, 出资 195.09 万人民币, 占 0.53% 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司, 出资 195.09 万人民币, 占 0.53% 中国



		有限公司, 出资 650.292 万人民币, 占 2% 香港协 兴建筑有限公司, 出资 3662.9974 万人民币, 占 10% 中国光大 (澳门) 有限公 司, 出资 650.292 万人民币, 占 2% 	华闻投资控股有 限公司, 出资 650.29 万人民币, 占 1.78% 香港协兴建筑有限 公司, 出资 3663 万人民币, 占 10% 中国光大 (澳门) 有限公 司, 出资 650.292 万人民币, 占 2%
备案事项	2006-08-28 00:00:00	熊德荣 王样明 郑 锦超 陈 华元 赵章平 梅合理 易 文权 裴 晓 陆仁星 高举平 王 饶成 詹 半 梅景澄 姚 斌 石 深华 曹 庆和 邓小强 程海波	熊德荣 王样明 郑 锦超 陈 华元 赵章平 姚 斌 梅 盛 詹 景澄 戴 韩英福 曹 庆和 曹 小强 程海波
法定代表人(负 责人、独资投资 人)	2005-05-19 00:00:00	洪可柱	熊德荣

国务院国有资产监督管理委员会办公厅

证 明

各有关单位：

中建三局建设工程股份有限公司系经我委批准（国资改革函〔2003〕435号），由我委监管的中国建筑工程总公司所属原中国建筑三工程局主营业务资产改制设立的股份有限公司。公司已经按照《公司法》有关规定就位房屋建筑工程施工总承包特级等资质，并经中国建筑工程总公司明确，全面承继了资质范围内原中国建筑第三工程局设计的所有业绩及相关荣誉。

特此证明。

二〇〇五年一月二十八日



湖北省工商行政管理局

证 明

中建三局建设工程股份有限公司经国家工商总局批准，企业性质变更为有限责任公司，企业名称变更为中建三局集团有限公司，并于2013年11月26日经湖北省工商局完成工商变更工作。经建设部批准，中建三局集团有限公司继承了原中建三局建设工程股份有限公司的全部资质，全面继承了资质范围内原中建三局建设工程股份有限公司的所有业绩及相关荣誉。

特此证明

二〇一三年十一月二十八日

NF-22-002

中建一局集团有限公司是我局办理变更登记。其注册资本为500000000.00元，电话为8790116和8790117。



251



准予变更登记通知书


(鄂市监)登记内变字[2020]第53号

中建二局集团有限公司:

经审查,提交的经营范围、法定代表人(负责人、独资投资人)的变更登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记。

变更信息:

变更事项	变更前	变更后
经营范围	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设,建筑工程、人防工程设计,商品混凝土的生产和批发;园林绿化工程;爆破作业设计施工(四级,有效期至2022年8月21日)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设,建筑工程、人防工程设计,商品混凝土的生产和批发;园林绿化工程;爆破作业设计施工(四级,有效期至2022年8月21日);建筑材料(设备)销售;机电设备销售;污水处理设备销售及环保设备销售。
法定代表人(负责人、独资投资人)	陈华元	陈文健



(印章)

核准日期 2020年04月13日

准予变更登记通知书

(鄂市监)登记内变字[2021]第64号

中建三局集团有限公司:

经审查,提交的法定代表人(负责人、独资投资人)的变更登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记。

变更信息:

变更事项	变更前	变更后
法定代表人(负责人、独资投资人)	陈文健	陈卫国

核准日期 2021年02月23日

(四)-2 完成的类似项目情况汇总表

序号	项目名称	路基桥涵 里程 (km)	路面类型 及里程 (km)	大桥 (座)	特大桥 (座)	长隧 道 (座)	特长 隧道 (座)	...	备注 (请注明 是否作 为附录 3资格 审查条 件(业 绩最低 要求)业 绩)
1	207 国道团林至 砖桥、桃园至子 陵公路工程 PPP 项目	59.352	沥青混凝 土、 59.352	1	0	0	0		是
2	武汉至阳新高 速公路(武汉至 鄂州段)二标段	10.54	沥青混凝 土、10.54	7	6	0	0		是
3	成雅快速通道 (雅安段)新建 项目施工总承 包一标段	29.698	沥青混凝 土路面、 29.698	14	0	0	0		是
4									
5									
6									
7									
...									
业绩合计		99.59		22	6	0	0		

注：业绩要求应符合投标人须知前附表 3.5.3、10.6 及 10.7 款的要求。

（五）投标人的信誉情况表

项 目	投标人情况说明
(1) 在最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级被评为 D 级；初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中被评为 D 级；	中建三局集团有限公司 无此类情况
(2) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；	中建三局集团有限公司 无此类情况
(3) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；	中建三局集团有限公司 无此类情况
(4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；	中建三局集团有限公司 无此类情况
(5) 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；	中建三局集团有限公司 无此类情况
(6) 在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；	中建三局集团有限公司 无此类情况
(7) 投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理（以及备选人，如有）、项目总工（以及备选人，如有）在近三年内有行贿犯罪行为的（以投标人投标函中的承诺为准）；	中建三局集团有限公司 及法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内没有行贿犯罪的行为
(8) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	中建三局集团有限公司 无此类情况
(9) 投标人近 3 年（2022 年 8 月 1 日至投标截止日）不得存在围标串标、提供虚假资料骗取中标等行为并被相关行政机构公示处罚（处于处罚期内）的情形。	中建三局集团有限公司 无此类情况
.....	

注：1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”第 1.4.4 条款号中的各项规定，逐条说明其信誉情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关

证明材料。

3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。



中建三局集团有限公司在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果截图查询

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息资质信息人员信息业绩信息奖惩记录

信用综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

评价年度: 2024

企业信用等级

序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
					无记录

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页政策法规工作动态从业企业从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息资质信息人员信息业绩信息奖惩记录

信用综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

评价年度: 请选择

企业信用等级

序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
1	施工	2023	A	94.2672	
2	施工	2022	A	94.2685	
3	施工	2021	A	94.1394	
4	施工	2020	AA	95.0203	
5	施工	2019	A	94.6389	
6	施工	2018	A	94.0492	
7	施工	2017	A	94.39	
8	施工	2016	A	93.5	
9	施工	2015	A	94.86	
10	施工	2014	AA	96.17	
11	施工	2013	A	91.87	

中建三局集团有限公司在最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价结果截图查询

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

评价年度: 2024

企业信用等级

序号	评价省份	评价年份	等级	来源
				无记录

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

评价年度: 2023

企业信用等级

序号	评价省份	评价年份	等级	来源
1	新疆维吾尔自治区	2023	A	申报
2	陕西省	2023	A	申报
3	四川省	2023	A	申报
4	湖北省	2023	AA	申报
5	山东省	2023	A	申报
6	江西省	2023	A	申报
7	江苏省	2023	AA	申报

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

[首页](#)
[政策法规](#)
[工作动态](#)
[从业企业](#)
[从业人员](#)
[用户登录](#)

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

中建三局集团有限公司

[基本信息](#)
[资质信息](#)
[人员信息](#)
[业绩信息](#)
[奖惩记录](#)
[全国综合评价](#)
[企业在各地的信用等级](#)
[企业变更历史](#)
[企业转移历史记录](#)

评价年度: 2022

企业信用等级

序号	评价省份	评价年份	等级	来源
1	青海省	2022	AA	申报
2	四川省	2022	AA	申报
3	广东省	2022	A	申报
4	湖北省	2022	AA	申报
5	江西省	2022	A	申报
6	安徽省	2022	A	申报
7	江苏省	2022	AA	申报

168

在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单(中建三局集团有限公司)



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



中建三局集团有限公司

存续(在营、开业、在册)

集团名称: 中建三局集团 集团简称:

统一社会信用代码: 91420000757013137P

注册号:

法定代表人: 陈卫国

登记机关: 湖北省市场监督管理局

成立日期: 2003年12月29日

下载报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

■ 列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共查询到0条记录共0页

返回

+ 上一页

下一页 -

末页

在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中未被列入失信被执行人名单(中建三局集团有限公司)



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称
安海正
高立生
杨春利
侯刚
王桂华

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京德安世纪建筑劳务有限公司	59963962-7
厦门恒联集团有限公司	69167076-6
北京思得福智能科技有限公司	MA003UR8-3
北京东方思美装饰有限公司	75233255-6
北京大家网络教育科技有限公司	78819779-3

查询条件

被执行人姓名/名称:	中建三局集团有限公司
身份证号码/组织机构代码:	91420000757013137P
省份:	全部
验证码:	UVUW 

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91420000757013137P 中建三局集团有限公司 相关的结果。

投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理（以及备选人，如有）、项目总工（以及备选人，如有）近三年内无行贿犯罪行为查询记录
投标人（中建三局集团有限公司）无行贿犯罪行为查询记录

2025年8月16日 星期六 [欢迎您, 18362225549](#) [退出](#) [意见建议](#) [返回首页](#) [使用帮助](#)



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文字](#)

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份①

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案由: 行贿罪 × 裁判日期: 2022-01-01 TO 2025-08-18 × 当事人: 中建三局集团有限公司 ×

法院层级: 裁判日期: 审判程序:

暂无数据!

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

全选 批量收藏

[中国政府信息公开整合服务平台](#) | [人民检察院案件信息公开网](#) | [中国审判流程信息公开网](#) | [中国司法大数据服务中心](#) | [中国执行信息公开网](#) | [全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网](#) | [中国涉外海事商事审判网](#) | [最高人民法院服务人民群众系统场景导航](#)

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05021036号

投标人法定代表人（陈卫国）无行贿犯罪行为查询记录

2025年8月16日 星期六 [欢迎您, 18362225549](#) [退出](#) [意见建议](#) [返回首页](#) [使用帮助](#)



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文字](#)

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份①

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案由: 行贿罪 × 裁判日期: 2022-01-01 TO 2025-08-18 × 当事人: 陈卫国 ×

法院层级: 裁判日期: 审判程序:

暂无数据!

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

全选 批量收藏

[中国政府信息公开整合服务平台](#) | [人民检察院案件信息公开网](#) | [中国审判流程信息公开网](#) | [中国司法大数据服务中心](#) | [中国执行信息公开网](#) | [全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网](#) | [中国涉外海事商事审判网](#) | [最高人民法院服务人民群众系统场景导航](#)

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院 版权所有
京ICP备05021036号

投标人拟派项目经理（柳楚卫）无行贿犯罪行为查询记录

2025年8月16日 星期六 欢迎您, 18362225549 [退出](#) [意见建议](#) [返回主站](#) [使用帮助](#)



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文字](#)

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份①

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案由: 行贿罪 裁判日期: 2022-01-01 TO 2025-08-18 当事人: 柳楚卫

法院层级: 裁判日期: 审判程序:

暂无数据!

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

全选 批量收藏

中国政府信息公开整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务平台 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院版权所有
京ICP备05023036号

投标人拟派项目总工（吴加涛）无行贿犯罪行为查询记录

2025年8月16日 星期六 欢迎您, 18362225549 [退出](#) [意见建议](#) [返回主站](#) [使用帮助](#)



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文字](#)

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份①

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案由: 行贿罪 裁判日期: 2022-01-01 TO 2025-08-18 当事人: 吴加涛

法院层级: 裁判日期: 审判程序:

暂无数据!

保存搜索条件

清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

全选 批量收藏

中国政府信息公开整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务平台 | 中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外商事海事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航 |

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院版权所有
京ICP备05023036号

(五) 投标人的信誉情况表

项目	投标人情况说明
(1)在最新年度广东省公路工程从业单位(施工单位)信用评价(含无最新年度而上一年度有信用评价)中,信用等级被评为D级;初次进入广东省的投标人,在最新年度的全国公路从业单位(施工单位)信用评价结果中被评为D级;	广东善宇公路工程有限公司无此类情况
(2)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;	广东善宇公路工程有限公司无此类情况
(3)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书;	广东善宇公路工程有限公司无此类情况
(4)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;	广东善宇公路工程有限公司无此类情况
(5)在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单;	广东善宇公路工程有限公司无此类情况
(6)在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单;	广东善宇公路工程有限公司无此类情况
(7)投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的(以投标人投标文件中的承诺为准);	广东善宇公路工程有限公司及法定代表人在近三年内没有行贿犯罪的行为
(8)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	广东善宇公路工程有限公司无此类情况
(9)投标人近3年(2022年8月1日至投标截止日)不得存在围标串标、提供虚假资料骗取中标等行为并被相关行政机构公示处罚(处于处罚期内)的情形。	广东善宇公路工程有限公司无此类情况

注:1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”第1.4.4条款号中的各项规定,逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

3.以联合体形式投标的,联合体各成员应分别填写。

广东善宇公路工程有限公司在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果截图查询



广东善宇公路工程有限公司在最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价结果截图查询



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

广东善宇公路工程有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

评价年度: 2023

企业信用等级

序号	评价年份	评价年份	等级	等级
无记录				

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

广东善宇公路工程有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

评价年度: 2022

企业信用等级

序号	评价年份	评价年份	等级	等级
无记录				

在“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入严重违法失信企业名单(广东善宇公路工程有限公司)


国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信息公示](#)
[经营异常名录](#)
[严重违法失信名单](#)



广东善宇公路工程有限公司
在营(开业)企业
该企业被列入经营异常名录, 点击查看详情

统一社会信用代码: 91441521MA53P1YA6W
注册号:
法定代表人: 李才才
登记机关: 揭阳市市场监督管理局
成立日期: 2019年09月02日



[添加](#)
[信息分享](#)
[信息打印](#)

[基础信息](#)
[行政许可信息](#)
[行政处罚信息](#)
[列入经营异常名录信息](#)
[列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#)
[公示信息](#)

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共 1 页 0 条记录 共 0 页

在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中未被列入失信被执行人名单(广东善宇公路工程有限公司)



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#) [执行公开服务](#)

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
张国强	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
杨中平	5129211973****3853
隋代全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称

广东善宇公路工程有限公司

身份证号码/组织机构代码

91441521MA53P1YA6W

省份

全部

验证码



验证码正确

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91441521MA53P1YA6W 广东善宇公路工程有限公司相关的结果。

投标人及其法定代表人近三年内无行贿犯罪行为查询记录（广东善宇公路工程有限公司）
投标人（广东善宇公路工程有限公司）无行贿犯罪行为查询记录

2025年8月16日 星期六 欢迎您, 18362225549 退出 意见建议 返回主站 使用帮助



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文字](#)

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

?

关键词 >

案由 >

法院层级 >

地域及法院 >

裁判年份① >

审判程序 >

文书类型 >

案例等级 >

已选条件: 保存检索条件 清空检索条件

案由: 行贿罪 裁判日期: 2022-01-01 TO 2025-08-18 当事人: 广东善宇公路工程有限公司

法院层级: 裁判文书 裁判日期: 审判程序: 暂无数据!

共检索到 0 篇文书

全选 批量收藏

中国政府信息公开整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务平台中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外海事商事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院版权所有
京ICP备05023036号

投标人（广东善宇公路工程有限公司）法定代表人（李火才）无行贿犯罪行为查询记录

2025年8月16日 星期六 欢迎您, 18362225549 退出 意见建议 返回主站 使用帮助



中国裁判文书网

China Judgements Online

[首页](#) [刑事案件](#) [民事案件](#) [行政案件](#) [赔偿案件](#) [执行案件](#) [其他案件](#) [民族语言文字](#)

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词 >

案由 >

法院层级 >

地域及法院 >

裁判年份① >

审判程序 >

文书类型 >

案例等级 >

已选条件: 保存检索条件 清空检索条件

案由: 行贿罪 裁判日期: 2022-01-01 TO 2025-08-18 当事人: 李火才

法院层级: 裁判文书 裁判日期: 审判程序: 暂无数据!

共检索到 0 篇文书

全选 批量收藏

中国政府信息公开整合服务平台 | 人民检察院案件信息公开网 | 中国审判流程信息公开网 | 中国司法大数据服务平台中国执行信息公开网 | 全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网 | 中国涉外海事商事审判网 | 最高人民法院服务人民群众系统场景导航

地址: 北京市东城区东交民巷27号 邮编: 100745 总机: 010-67550114
中华人民共和国最高人民法院版权所有
京ICP备05023036号

(六) 拟委任的项目经理和项目总工情况表

(六) -1拟委任的项目经理和项目总工汇总表

姓名	年龄	拟在本项目中担任的职务	技术职称	建造师类别及注册号	累计对应岗位的工作年限(月)	备注
柳楚卫	54 岁	项目经理	公路与桥梁工程专业高级工程师	公路工程一级注册建造师、鄂1422007200804237	59 个月	
吴加涛	51 岁	项目总工	道桥专业高级工程师	/	57 个月	

(六)-2拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	柳楚卫	年 龄	54岁	专业	公路与桥梁工程
技术职称	高级工程师	学历	本科	拟在本标段工程任职	项目经理
工作年限	29年			类似施工经验年限	59个月
毕业学校	1994 年 6 月毕业于 武汉工业大学 学校 建筑工程 专业, 学制 4 年				
经 历					
时间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	发包人及联系电话
2015-4-25 至 2016-12-19	武汉市四环线吴家山至沌口段(04标段)			项目副经理	武汉西四环线高速公路建设管理有限公司 [REDACTED]
2017-1-1至 2019-5-20	荆门市城区绕城公路牌楼至团林段道路工程			项目总工	荆门市交通建设投资有限公司 [REDACTED]
2019-9-25 至 2020-11-25	武汉市四环线武湖至吴家山段土建工程			项目副经理	武汉北四环线高速公路建设管理有限公司 [REDACTED]
2020-11-26 -至 2021-11-10	207国道团林至砖桥、桃园至子陵公路工程PPP项目			项目副总工	荆门中建二零七公路建设有限公司 [REDACTED]
获奖情况		/			
本人 <u>柳楚卫</u> (亲笔签字) 知晓自己为本项目的 项目经理 (填写项目经理或项目总工), 并对其真实性负责。					

备 注	/
-----	---

注：1. 本表后应填写项目经理（以及备选人，如有）和项目总工（以及备选人，如有）相关情况。
 2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。



“全国公路建设市场监督管理系统”基本信息、职称信息

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 奖惩记录 全国综合评价 企业在各地的信用评级 企业变更历史 企业转移历史记录

姓名: 柳建卫

搜索

人员信息

序号	姓名	性别	毕业学校	学历	备注
1	柳建卫	男	武汉工业大学	本科	

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名: 柳建卫

性别: 男

学历: 本科

毕业院校: 武汉工业大学

所学专业: 建筑工程

开始工作年份: 1986-07-01

申报

职称信息		执业资格信息	履历信息	个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)
序号	职称	证书编号	职称专业	核查机关	核查日期
1	高级工程师	(2015) 1103285	公路与桥梁工程	中国建筑第三工程有限公司	2015-12-25

“全国公路建设市场监督管理系统”执业资格

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

基本信息

姓名

柳楚卫

毕业院校

武汉工业大学

性别

男

所学专业

建筑工程

学历

本科

开始工作年份

1996-07-01

序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期至	申报
1	注册建造师	一级	中华人民共和国建设部		2008-06-03	2027-12-21	申报
2	其他	交安B级	湖北省交通运输厅		2024-11-12	2027-09-06	申报
3	其他	公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核B级证书	湖北省交通运输厅		2024-11-12	2027-09-06	申报
4	注册建造师	一级	中华人民共和国住房和城乡建设部		2008-06-03	2025-06-23	申报

“全国公路建设市场监督管理系统”个人业绩

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

基本信息

姓名

柳楚卫

毕业院校

武汉工业大学

性别

男

所学专业

建筑工程

学历

本科

开始工作年份

1996-07-01

序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在岗起始日期	在岗截止日期	申报
1	武汉市四环线吴家山至沌口段（04标段）	武汉市四环线吴家山至沌口段（04标段）	中建三局集团有限公司	项目副经理		2015-04-25	2016-12-19	申报
2	武汉市四环线武汉至吴家山段土建工程	武汉市四环线武汉至吴家山段土建工程5-1标	中建三局集团有限公司	项目副经理		2019-09-25	2020-11-25	申报
3	荆门市城区绕城公路钟楼至团林段道路工程	荆门市城区绕城公路钟楼至团林段道路工程	中建三局集团有限公司	项目总工		2017-01-01	2019-05-20	申报
4	207国道团林至钟桥、桃园至子陵公路工程PPP项目	207国道团林至子陵段改建工程	中建三局集团有限公司	项目副总工		2020-11-26	2021-11-10	申报

建造师注册证书在中华人民共和国住房和城乡建设部网站上公开信息的网页截图复印件或网页打印件



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

请输入关键词

搜索

首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查

手机查看

首页
人员数据
人员列表

柳楚卫

证件类型
居民身份证

证件号码
420122*****11

性别
男

注册证书所在
单位名称
中建三局集团有限公司

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 中建三局集团有限公司

注册编号/执业印章号: [REDACTED]

注册专业: 公路工程

有效期至: 2027年12月21日

2024-12-22 - 延续注册 - 公路工程
中建三局集团有限公司

2021-12-20 - 延续注册 - 公路工程
中建三局集团有限公司

2008-06-03 - 初始注册 - 公路工程
中建三局集团有限公司

建造师证书变更记录 (1)

安全生产考核合格证书在省级或以上交通运输主管部门公布的关于施工单位安管人员安全生产考核公开信息的网页截图复印件或网页打印件、或“全国公路建设市场监督管理系统”上查询公开信息的网页截图复印件或网页打印件

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名

柳楚卫

性别

男

学历

本科

毕业院校

武汉工业大学

所学专业

建筑工程

开始工作年份

1996-07-01

举报

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)			
序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期至	申报	证书编号	发证日期	注册有效期至	申报
1	注册建造师	一级	中华人民共和国建设部	鄂1422007200804277	2008-06-03	2027-12-21	申报				
2	其他	交安B级	湖北省交通运输厅	鄂交安B15G04147	2024-11-12	2027-09-06	申报				
3	其他	公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核B级证书	湖北省交通运输厅	鄂交安B15G04147	2024-11-12	2027-09-06	申报				
4	注册建造师	一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	鄂1422007200804277	2008-06-03	2025-06-23	申报				

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录

首页

全国证书查询网址

证书详细信息

证书编号:鄂交安B15G04147

发证时间:2015-09-06

有效时间:2027-09-06

证书状态:有效

姓 名:柳楚卫

性 别:男

出生日期:1971/6/20

企业名称:中建三局集团有限公司

照 片:



考核管理部门咨询电话: 027-84730072

社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中建三局集团有限公司

单位编号:100012572

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	14370			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202507			
2025年07月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	柳楚旦			202111	202507	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号：中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况，由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果，由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
- 验证平台：<http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>
- 授权码：2025 0807 1929 00NV SZ2X

打印时间： 2025年08月07日

第1页/共1页

(六) -2拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	吴加涛	年 龄	51岁	专 业	道桥
技术职称	高级工程师	学 历	本科	拟在本标段 工程任职	项目总工
工作年限	27年			类似施工经验 年限	57个月
毕业学校	1998 年 7 月毕业于 东北林业大学 学校 交通土建工程 专业, 学制 4 年				
经 历					
时间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	发包人及 联系电话
2009.07.01 至 2010.08.01	彰武至阿尔乡(辽蒙界)高速公路工程 项目路基工程			项目总工	辽宁省高等级公路建设局 024-83867230
2013.03.08 至 2014.09.07	岢岚至临县高速公路交安工程			项目总工	岢临高速公路建设管理处 0358-6468377
2015.08.01 至 2017.11.15	丹东大东港疏港高速公路			项目总工	辽宁省高等级公路建设局 024-83211918
获奖情况		/			
本人 <u>吴加涛</u> (亲笔签字) 知晓自己为本项目的 <u>项目总工</u> (填写项目经理或项目总工), 并对其真实性负责。					
备 注		/			

注：1. 本表后应填写项目经理（以及备选人，如有）和项目总工（以及备选人，如有）相关情况。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。



“全国公路建设市场监督管理系统”基本信息、职称信息

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转籍历史记录

姓名: 吴加清

搜索

人员信息

序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注
1	吴加清	男	东北林业大学	本科	交通土建	

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	吴加清	毕业院校	东北林业大学
性别	男	所学专业	交通土建
学历	本科	开始工作年份	

申报

职称信息

执业资格信息

履历信息

个人业绩 (2025.1.1之前录入)

个人业绩 (2025.1.1之后录入)

序号	职称	证书编号	职称专业	核发机关	核发日期	等级
1	高级工程师	0198912	路桥	辽宁省人事厅	2008-10-01	中级

“全国公路建设市场监督管理系统”执业资格

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名: 吴加海

性别: 男

学历: 本科

毕业院校: 东北林业大学

所学专业: 交通土建

开始工作年份

申报

职称信息			执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		企业业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期至	业绩			
1	其他	交安B证	湖北省交通运输厅	鄂交安B19000695	2018-01-02	2027-01-02	申报			
2	其他	交安B	湖北省交通运输厅	鄂交安B (19) G00695	2018-01-02	2027-01-02	申报			
3	注册建造师	一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	鄂1212006200804105	2021-11-20	2024-12-19	申报			
4	其他	交安B	湖北省交通运输厅	鄂交安B (19) G00695	2018-01-02	2027-01-02	申报			
5	注册建造师	一级	住建部	00098788	2008-04-18		申报			

“全国公路建设市场监督管理系统”个人业绩

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

搜索

基本信息

姓名

吴加涛

性别

男

学历

本科

毕业学校

东北林业大学

所学专业

交通土建

开始工作年份

2009

申报

职称信息

执业资格信息

履历信息

个人业绩 (2025.1.1之前录入)

个人业绩 (2025.1.1之后录入)

序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在岗起止日期	在岗截止日期	等级
1	岢岚至临县高速公路交安工程	JA3合同段	辽宁省路桥建设第一有限公司	项目总工		2013-03-08	2014-09-07	中级
2	彰武至阿尔乡 (辽蒙界) 高速公路工程路面基层工程	第四合同段	辽宁省路桥建设第一有限公司	项目总工		2009-07-01	2010-09-01	中级
3	丹东大东港疏港高速公路	路基工程第3合同段	中建三局第一建设工程有限责任公司	项目总工		2015-08-01	2017-11-15	中级

安全生产考核合格证书在省级或以上交通运输主管部门公布的关于施工单位安管人员安全生产考核公开信息的网页截图复印件或网页打印件、或“全国公路建设市场监督管理系统”上查询公开信息的网页截图复印件或网页打印件

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要查询的人员姓名

搜索

基本信息

姓名

吴加涛

毕业院校

东北林业大学

性别

男

所学专业

交通土建

学历

本科

开始工作年份

申报

职 称 信 息

执 业 资 格 信 息

履 历 信 息

个 人 业 绩 (2025.1.1之前录入)

个 人 业 绩 (2025.1.1之后录入)

序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期至	申报
1	其他	交安B证	湖北省交通运输厅	鄂交安B19G00695	2018-01-02	2027-01-02	申报
2	其他	交安B	湖北省交通运输厅	鄂交安B (19) G00695	2018-01-02	2027-01-02	申报
3	注册建造师	一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	鄂121006200804105	2015-11-20	2024-12-19	申报
4	其他	交安B	湖北省交通运输厅	鄂交安B (19) G00695	2018-01-02	2027-01-02	申报
5	注册建造师	一级	建设部	00098785	2009-04-18		申报

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页 | 全国证书查询网址

证书详细信息

证书编号:

鄂交安B19G00695

发证时间:

2018-01-02

有效时间:

2027-01-02

证书状态:

有效

姓 名:

吴加涛

性 别:

男

出生日期:

1974/8/28

企业名称:

中建二局集团有限公司

照 片:



考核管理部门咨询电话: 027-84730072

社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:中建三局集团有限公司

单位编号:100012572

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	14370			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202507			
2025年07月，该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	吴加涛				202507	实缴到账
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <http://59.175.218.201:8005/template/dzsbzmyz.html>
授权码: 2025 0816 1507 01W3 9EPZ

打印时间: 2025年08月16日

第1页/共1页

九、其他材料

- 1、提供“九-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书”；
- 2、提供“九-2、投标人的自评分表”；
- 3、提供最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价等级（若有），并标识单位所在位置；
- 4、初次进入广东省的，但在最新年度的全国综合评价结果为C级或D级的，提供最新年度的全国综合评价结果单位查询所在页；
- 5、如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度的信用评价（若有），并标识单位所在位置。
- 6、详细说明投标人自2024年5月1日至投标文件递交截止日期期间因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈、茂名市交通运输局行政处罚的文件。
- 7、投标人认为需要的其它内容（如体现技术能力的相关证明材料）。

九-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书

致招标人：高州市地方公路建设管理处（招标人全称）

按相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在高州市 2025 年东北部农村公路改造工程 施工招标（高州市 2025 年东北部农村公路改造工程 标类/标段）的招标中，第 / 次使用（或不使用）广东省交通运输局发布的 / 年度信用评价 / 等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用 / 等级结果（不使用时上述填“/”）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件： / 单位使用 / 年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表
特此承诺

投标人（单位全称）：中建三局集团有限公司

投标人的法定代表人或其委托代理人签名：陈建书

2025 年 8 月 18 日

注：1、AA、A 级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用”时需和附表（ 单位使用 年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表）一起编入投标文件中。

2、AA、A 级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使用”时，使用次数应按标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致）。如同时对多个标段选择“使用”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。

3、中标候选人公示中，将对所有承诺使用最新年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。

4、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附表：

中建三局集团有限公司 单位使用 ____ / ____ 年度广东省公路工程从业单位
信用等级情况汇总表

序号	招标人名称	标类或（标段）名称	递交文件时间 （年月日）	使用信用等级 （AA/A/B/C）	备注
1	/	/	/	/	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：1、应如实填报信用评价等级使用情况。

2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

九-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书

致招标人：高州市地方公路建设管理处（招标人全称）

按相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在高州市 2025 年东北部农村公路改造工程 施工招标（高州市 2025 年东北部农村公路改造工程 标类/标段）的招标中，第 / 次使用（或不使用）广东省交通运输局发布的 / 年度信用评价 / 等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用 / 等级结果（不使用时上述填“/”）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件： / 单位使用 / 年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表
特此承诺

投标人（单位全称）：广东善宇公路工程有限公司

投标人的法定代表人或其委托代理人签名：陈建高

2025 年 8 月 18 日

注：1、AA、A 级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用”时需和附表（ 单位使用 年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表）一起编入投标文件中。


2、AA、A 级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使用”时，使用次数应按标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致）。如同时对多个标段选择“使用”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。

3、中标候选人公示中，将对所有承诺使用最新年度 AA、A 级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。

4、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附表：

广东善宇公路工程有限公司 单位使用 / 年度广东省公路工程从业单位
信用等级情况汇总表

序号	招标人名称	标类或（标段）名称	递交文件时间 （年月日）	使用信用等级 (AAA/A)	备注
1	/	/	/		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：1、应如实填报信用评价等级使用情况。

2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

九-2、投标人的自评分表

(适用于双信封的综合评分法、双信封的技术评分最低标价法)

序号	评分因素	满分	评分标准	自评分	评分情况说明	页码索引
1	施工组织设计-总体施工组织布置及规划	2 分	(1) 对项目的的基本情况了解全面、准确,施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强,按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行,得 1.7~2.0 分; (2) 满足工程建设需要,施工总体布置规划、施工进度计划基本可行,得 1.3~1.6 分; (3) 一般但不被评定为不响应的,得 1.2 分。	2 分	我方施工组织设计对项目的的基本情况了解全面、准确,施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强,按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行,得 2 分。	P13-35

2	施工组织设计-重点、难点和关键工程的施工方案与技术措施	2 分	(1)对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻,能充分发挥自身优势,积极采用“四新”技术,制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强,重点突出的,按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行,得分 1.7~2.0 分; (2)对项目重点、难点和关键工程认识基本到位,施工方案与技术措施基本可行,重点较为突出的,得分 1.3~1.6 分; (3)一般但不被评定为不响应的,得分 1.2 分。	2 分	我方施工组织设计对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻,能充分发挥自身优势,积极采用“四新”技术,制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强,重点突出的,按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行,得 2 分。	
---	-----------------------------	-----	--	-----	---	--

3	施工组织设计-工期、质量、安全、环保水保、文明施工保证措施	2分	(1) 能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因素,拟采取预防保证措施针对性强、科学有效,重点突出的,按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行,得分 1.7~2.0 分; (2) 对工期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识,预防保证措施基本可行,重点较为突出的,得分 1.3~1.6 分; (3) 一般但不被评定为不响应的,得分 1.2 分。	2分	我方施工组织设计能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因素,拟采取预防保证措施针对性强、科学有效,重点突出,按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行,得 2 分。	158-71
---	-------------------------------	----	---	----	---	--------

4	其他因素-技术能力	1分	投标人自2020年8月1日至今获得过国家级公路交通优质工程奖 每项得1分；获得过省级公路交通优质工程奖 每项得0.2分，最多5项。本项满分1分。 注：同一项目最多计算一次。需提供相关证明材料。	1分	我方自2020年8月1日至今获得过国家级公路交通优质工程奖：五峰山过江通道南北公路接线工程，得1分。	P211
5	其他因素-财务能力	1分	满足资格审查条件(财务最低要求)得1分。本项满分1分	1分	我方满足资格审查条件(财务最低要求)得1分。	P131-138
6	其他因素-业绩	2分	满足“资格审查条件(业绩最低要求)”规定的，得2分。 注：若为联合体投标，以联合体所有成员业绩之和计算。	2分	我方满足“资格审查条件(业绩最低要求)”规定的，得2分。	P139-163

7	其他因素-履约信誉	10	1. 信用等级分值（5分） AA、A、B、C级单位的信用等级得分分别为5.00、4.75、4.45、3.65分。 注：信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表10.2款的规定。 2. 履约情况（5分） 若没出现下述情形得满分； 投标文件递交截止日前1年内，投标人因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约或招标投标问题等原因被： （1）交通运输部行政处罚的，扣5分/次。 （2）广东省交通运输厅行政处罚的，扣3分/次。 （3）茂名市交通运输局行政处罚的，扣1.5分/次。 （4）广东省交通运输厅正式约谈的，扣0.1分/次。 （5）茂名市交通运输局正式约谈的，扣0.05分/次。	9.45分	1. 信用等级：B级，得4.45分； 2. 投标人无相关情形扣分现象，得5分。 合计得9.45分。	P164-178
---	-----------	----	--	-------	--	----------

			次。 同一事项同时被多个部门行政处罚或正式约谈只按最高的扣分计算 1 次（本条内容所指的行政处罚和正式约谈是指 2024 年 5 月 1 日起发生的行政处罚和正式约谈。其中：正式约谈是指从业单位的企业法人因建设项目质量、安全、履约或招标投标等问题，被上述单位约谈的情形。行政处罚要以上述单位正式发文为依据，以正式发文时间为准；正式约谈要以上述单位的书面通知和约谈会议纪要为依据，时间以约谈会议纪要发文时间为准）。如果扣完本项分值，可以从总分中扣。以联合体形式投标的，若各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成员进行累计扣分。			
--	--	--	--	--	--	--

合计	20 分	-	19.45	-
----	------	---	-------	---

投标人：（主）中建三局集团有限公司，（成）广东普宇公路工程有限公司（盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：陈建书（签字）



3、提供最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价等级（若有），并标识单位所在位置；

中建三局集团有限公司和广东善宇公路工程有限公司不在最新年度（2024年）广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价结果名单中。



4、初次进入广东省的，但在最新年度的全国综合评价结果为C级或D级的，提供最新年度的全国综合评价结果单位查询所在页；

中建三局集团有限公司和广东善宇公路工程有限公司不存在此类情况

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

中建三局集团有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

变更记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

评价年度: 请选择

企业信用等级

序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
1	施工	2023	A	94.2072	
2	施工	2022	A	94.2685	
3	施工	2021	A	94.1394	
4	施工	2020	AA	95.5203	
5	施工	2019	A	94.6389	
6	施工	2018	A	94.0492	
7	施工	2017	A	94.39	
8	施工	2016	A	93.5	
9	施工	2015	A	94.86	
10	施工	2014	AA	96.17	
11	施工	2013	A	91.67	

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

广东善宇公路工程有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

变更记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更历史

企业转移历史记录

评价年度: 请选择

企业信用等级

序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
无记录					

207

5、如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度的信用评价（若有），并标识单位所在位置。

中建三局集团有限公司和广东善宇公路工程有限公司不在最新年度（2023 年）广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价结果名单中。



6、详细说明投标人自 2024 年 5 月 1 日至投标文件递交截止日期期间因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈、茂名市交通运输局行政处罚的文件。



承诺书

致高州市地方公路建设管理处：

我方自 2024 年 5 月 1 日至投标文件递交截止日期间，不存在因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈、茂名市交通运输局行政处罚的文件的情况。

特此承诺！

投标人：（主）中建三局集团有限公司，（成）广东善宇公路工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2025 年 8 月 14 日

7、投标人认为需要的其它内容（如体现技术能力的相关证明材料）

(1) 投标人自 2020 年 8 月 1 日至今获得过国家级公路交通优质工程奖

