

正本/副本

广东省 茂名市

高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程招标

投标文件

(第一个信封：商务及技术文件)

投标人： (主) 广东善宇公路工程有限公司，

(成) 茂名市长达交通建设有限公司 (盖单位章)

2025年6月24日

目录

一、投标函及投标函附录	2
(一) 投标函	2
(二) 投标函附录	4
二、授权委托书或法定代表人身份证明	5
(一) 授权委托书	5
(二) 法定代表人身份证明	10
(二) 法定代表人身份证明	11
三、联合体协议书	12
四、投标保证金	13
五、施工组织设计	23
六、项目管理机构	65
七、拟分包项目情况表	66
八、资格审查资料	67
九、其他资料	162
附表:	165

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

高州市地方公路建设管理处：

1. 我方已仔细研究高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程招标文件的全部内容（含补遗书第 / 号至第 / 号），在考察工程现场后（如有），愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 工程质量：交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格。安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内不发生安全事故。工期：150个日历天。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附件条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺：拟投入本项目的项目经理何法迎及项目总工袁钜胜无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），否则自愿按照招标人的有关规定接受处理。

7. 我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。

8. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

9. 投标人（主）广东善宇公路工程有限公司，（成）茂名市长达交通建设有限公司
及其法定代表人、拟委任的项目经理（含备选，如有）、项目总工（含备选，如有）在
近三年内没有行贿犯罪行为（其他补充说明）。

投标人： （主）广东善宇公路工程有限公司，

（成）茂名市长达交通建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 李翔（签字）

地址： 高州市环城东路40号二楼(住所申报)

网址： /

电话： 0668-81503882

传真： 0668-81503882

邮政编码： 525200

2025年6月24日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条目号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	1.1.4.5	自实际交工日期起计算2年，其中绿化工程自实际交工日期起计算12个月。	
2	逾期交工违约金	11.5 (3)	10000元/天	
3	逾期交工违约金限额	11.5 (3)	10%签约合同价	
4	提前交工的奖金	11.6	元/天	
5	提前交工的奖金限额	11.6	%签约合同价	
6	因物价波动引起的价格调整	16.1	☐ 因物价波动引起的价格调整按照16.1.2项约定的原则处理 ☒ 合同期内不调价	
7	开工预付款金额	17.2.1 (1)	10%工程施工费签约合同价（不含暂列金额、安全生产费、工程保险费）。	
8	材料、设备预付款比例	17.2.1 (2)	/等主要材料、设备单据所列费用的/%	
9	进度付款证书最低限额	17.3.3 (1)	50万元	
10	逾期付款违约金的利率	17.3.3 (2)	中国人民银行短期贷款利率加手续费	
11	质量保证金限额	17.4.1	3%合同价格	
12	保修期	19.7 (1)	自本项目实际交工日期之日起计算5年（绿化工程、房建工程除外）； 绿化工程：自本项目实际交工日期之日起计算12个月后，移交发包人 or 发包人委托的养护单位进行后续管理养护工作。	

二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人李火才（姓名）系广东善宇公路工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托李晋全（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：广东善宇公路工程有限公司（盖单位章）

法定代表人: 李永才 (签字)

身份证号码: [REDACTED]

委托代理人: 李翰 (签字)

身份证号码: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2025 年 6 月 24 日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。如果由投标人的委托代理人签署投标文件，则不需提交（二）法定代表人身份证明。

2. 在本授权委托书后附投标人所属社保机构出具的委托代理人的社保缴费证明材料复印件，社保时段为投标文件递交截止日前6个月内连续不少于3个月，投标人分公司社保也予以认可。

3. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

法定代表人身份证复印件：



委托代理人身份证复印件





验证码: 202505195108823489

广东省社会保险参保证明(单位)

单位名称: 广东善宇公路工程有限公司

社保单位编号: 610911044331

单位登记时间: 20231001

该单位2025年02月在茂名市参加社会保险情况如下:

单位缴费工资总额(养老)	40428	单位实际缴费人数	9
单位参保人员情况			
序号	职工姓名	公民身份号码	基本养老保险 工伤保险 失业保险
1	李晋全		✓
2	陈观恒		✓
3	贤善刚		✓
4	黄敏炫		✓
5	顾宗杰		✓
6	柳焕林		✓
7	赖爱珍		✓
8	阳子龙		✓
9	张智聪		✓

备注:

- 1、“√”为证明时当月在本机构参保,“×”为证明时当月在本机构没有参保,职工个人缴费证明可由参保人本人在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印。
- 2、本《参保证明》可由参保单位在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印,作为单位参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2025-11-15。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保部门信息系统记载的最新数据为准。





验证码: 202505195121385097

广东省社会保险参保证明(单位)

单位名称: 广东善宇公路工程有限公司

社保单位编号: 610911044331

单位登记时间: 20231001

该单位2025年03月在茂名市参加社会保险情况如下:

单位缴费工资总额(养老)		49412	单位实际缴费人数		11
单位参保人员情况					
序号	职工姓名	公民身份号码	基本养老保险	工伤保险	失业保险
1	钟仁志		√	√	√
2	李晋全		√	√	√
3	贤善刚		√	√	√
4	黄敏炫		√	√	√
5	顾宗杰		√	√	√
6	柳焕林		√	√	√
7	吴希成		√	√	√
8	赖爱珍		√	√	√
9	陈叶华		√	√	√
10	阳子龙		√	√	√
11	张智聪		√	√	√

备注:

- 1、“√”为证明时当月在本机构参保,“×”为证明时当月在本机构没有参保,职工个人缴费证明可由参保人本人在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印。
- 2、本《参保证明》可由参保单位在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印,作为单位参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2025-11-15。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 3、参保单位实际参保缴费情况,以社保部门信息系统记载的最新数据为准。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025-05-19



验证码: 202505195127676010

广东省社会保险参保证明(单位)

单位名称: 广东善宇公路工程有限公司

社保单位编号: 610911044331

单位登记时间: 20231001

该单位2025年04月在茂名市参加社会保险情况如下:

单位缴费工资总额（养老）		49412		单位实际缴费人数		11	
单位参保人员情况							
序号	职工姓名	公民身份号码	基本养老保险	工伤保险	失业保险		
1	钟仁志		√	√	√		
2	李晋全		√	√	√		
3	王力		√	√	√		
4	贤善刚		√	√	√		
5	黄敏炫		√	√	√		
6	柳焕林		√	√	√		
7	吴希成		√	√	√		
8	赖爱珍		√	√	√		
9	张智聪		√	√	√		
10	阳子龙		√	√	√		
11	黄佛盛		√	√	√		

备注:

1、“√”为证明时当月在本机构参保,“×”为证明时当月在本机构没有参保,职工个人缴费证明可由参保人本人在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印。

2、本《参保证明》可由参保单位在省人力资源和社会保障厅网上服务平台上自行打印,作为单位参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查。本条形码有效期至2025-11-15。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保部门信息系统记载的最新数据为准。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025-05-19

(二) 法定代表人身份证明

投标人名称：广东善宇公路工程有限公司

姓名：李火才（法定代表人亲笔签名）性别：男 年龄：58岁 职务：总经理
系广东善宇公路工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。



投标人：广东善宇公路工程有限公司（盖单位章）

2025年6月24日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

(二) 法定代表人身份证明

投标人名称：茂名市长达交通建设有限公司

姓名：陆良（法定代表人亲笔签名）性别：男 年龄：50岁 职务：总经理
系茂名市长达交通建设有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。



投标人：茂名市长达交通建设有限公司（盖单位章）

2025年6月24日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

三、联合体协议书

广东善宇公路工程有限公司、茂名市长达交通建设有限公司（所有成员单位名称）自愿组成（主）广东善宇公路工程有限公司，（成）茂名市长达交通建设有限公司（联合体名称）联合体，共同参加高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东善宇公路工程有限公司（某成员单位名称）为（主）广东善宇公路工程有限公司，（成）茂名市长达交通建设有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。


4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：广东善宇公路工程有限公司（牵头人名称）承担 施工部分 专业工程，占总工程量的 60%；茂名市长达交通建设有限公司（成员名称）承担 施工部分 专业工程，占总工程量的 40%；……。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。


6. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：广东善宇公路工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：  （签字）

联合体成员名称：茂名市长达交通建设有限公司（盖单位章）

法定代表人：  （签字）

2025 年 6 月 24 日

四、投标保证金

若采用现金（转账）或支票，投标人应在此提供汇款等相关凭证的复印件。如采用银行保函，银行保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

如采用其他形式提交，应满足须知前附表3.4.1项的规定。

投标银行保函格式

高州市地方公路建设管理处：

鉴于_____（投标人名称）（以下称“投标人”）于____年____月____日参加高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程的投标，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。

收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）_____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年 月 日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据当地银行及相关规定的格式填写，但保函内容不得与上述格式中的内容有实质性修改，否则应判定无效。

如：“本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效”可改为本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效。

如采用保险保函，保险保函复印件装订在投标文件中，格式如下。

投标保证保险保函格式

高州市地方公路建设管理处：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程的投标，_____（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。

收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）_____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年 月 日

注：本保函格式只作为参考，投标人可根据担保人及相关规定的格式填写，但保函内容不得与上述格式中的内容有实质性修改，否则应判定无效。

如：“本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效”可改为本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效。



大家财产保险有限责任公司
Dajia Property & Casualty Insurance Co., Ltd.



财险官网: property.djbx.com

大家保险商城网址: e.djbx.com

大家财险官微

大家财险官网

大家财险偿付能力官网

大家财产保险有限责任公司

投标保证保险单

保险单号: 1095405302025000004

鉴于投保人已向保险人递交投保申请及相应材料,且声明属实,并同意按约定缴纳保险费,本保险人依照《投标保证保险条款》和特别约定承担保险责任,特立本保险单为凭,与本保险有关的附加条款、特别约定、投保单及批单是本保险单不可分割的组成部分。大家财产保险有限责任公司偿付能力充足率达到监管要求,最近季度的综合偿付能力充足率、风险综合评级等信息已刊登公司官网(<https://t.djbx.com/9ohyrcey>)公开信息披露-专项信息-偿付能力栏目,请登录官网或扫描右上角二维码查阅了解。

投保人	名称	广东善宇公路工程有限公司		统一社会信用代码	
	地址	高州市环城东路40号二楼(住所)			
	联系人	黄金芳	联系电话		
被保险人	名称	高州市地方公路建设管理处		统一社会信用代码	
	地址	广东省茂名市高州市高凉东路638号			
	联系人		联系电话		
招投标情况	招标项目类型	工程类			
	项目名称	高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程			
	招标项目编号	2411-440981-04-01-626377			
	标段名称	高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程			
	标段编号				
	工程地址	高州市平山镇、长坡镇、大井镇、东岸镇、曹江镇、谢鸡镇、石鼓镇、镇江镇和宝光街道			
保险金额	人民币（大写）陆拾万元整 （小写）¥600,000.00				
保险费	人民币（大写）柒佰捌拾元整 （小写）¥780.00 （其中，不含税保费735.85元，增值税44.15元。）				
保险费率	0.1300%				
保险期间	自2025年06月24日零时起，至2025年10月21日二十四时止。				
免赔率	0.0000%				
保险条款	大家财产保险有限责任公司投标保证保险条款（注册号：C00024231412024073113373）				
争议处理	☒ 诉讼； ☐ 提交 仲裁委员会仲裁。				
特别约定	1、投保人承诺，当被保险人向保险公司提出索赔并由保险公司赔付后，保险公司即可直接要求投保人履行清偿责任，含实际发生的赔款和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公告费、保全费、律师费、执行费、评估费、拍卖费等）及相应的利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金等；投保人将自保险公司要求清偿之日起五个工作日内无条件一次性向保险公司支付要求清偿的金额。 2、本保证保险的保证期间为该工程的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日）。				
重要提示					



大家财产保险有限责任公司
Dajia Property & Casualty Insurance Co., Ltd.

95569
全国统一客户服务热线



财险官网: property.djbx.com

大家保险商城网址: e.djbx.com

大家财险官微

大家财险官网

大家财险偿付能力官网

保险人	公司名称: 大家财产保险有限责任公司广东分公司
	公司地址: 广东省广州市天河区林和西路9号2816房自编8室
	邮政编码: 服务电话: 95569/4008095569 签单日期: 2025年06月13日
	保险人签章:

核保: Admin

制单: 覃华生

经办: admin

温馨提示: 尊敬的客户, 您可扫描右上角的大家财险微信公众号、下载大家保险APP、拨打95569客服电话或附近的营业网点使用查保单、办理赔、申请增值服务等各项保单服务。



大家财产保险有限责任公司

投标保证保险条款

(注册号: C00024231412024073113373)

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证等组成。凡涉及本保险合同的约定、通知、文件等,均采用书面形式。

第二条 本保险合同适用于中华人民共和国境内(不包括港、澳、台地区)投标当事人参与的招标投标项目。

第三条 凡在中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)依法设立,参与项目投标活动的企业可作为本保险合同的投保人。招标投标活动中,招标方(企业或其他组织)可作为本保险合同的被保险人。

保险责任

第四条 在保险期间内,投保人在参与保险单载明的招标项目竞标过程中,发生下列情形之一的,被保险人可向保险人提出索赔,保险人按照本保险合同的约定对被保险人承担赔偿责任。

- (一) 投保人在投标有效期内违反招标文件的有关规定擅自修改投标文件;
- (二) 在招标文件规定的投标时间截止后撤销投标文件;
- (三) 投保人收到被保险人发出的中标通知,未能或拒绝在有效期内签订合同;
- (四) 投保人收到被保险人发出的中标通知,未能或拒绝在规定期限内根据招标文件要求提供履约保证金/银行保函/履约保证保险;
- (五) 中标后,因投保人的违法行为导致中标被依法确认无效;
- (六) 出现法律、法规、招标文件规定的没收保证金的其他情形。

责任免除

第五条 存在以下情形之一的,保险人不负责赔偿:

- (一) 被保险人与投保人或其他人串通,虚构基础交易;
- (二) 被保险人提交的第三方单据系伪造或内容虚假;
- (三) 法院判决或仲裁裁决认定投保人没有付款或赔偿责任;
- (四) 被保险人明知其没有付款请求权仍滥用该权利的其他情形。

第六条 下列原因造成的损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:

- (一) 战争、敌对行为、军事行动、武装冲突、罢工、暴动、民众骚乱、恐怖活动;
- (二) 核爆炸、核污染及其他放射性污染;
- (三) 地震、海啸、水灾、火灾、暴风或其他不可抗拒的自然灾害。

第七条 对下列损失、费用和责任,保险人不负责赔偿:

- (一) 被保险人的间接损失;
- (二) 根据招标文件应由被保险人承担的责任;
- (三) 罚款、罚金及惩罚性赔偿。

保险金额

第八条 保险金额是保险人承担赔偿责任的最高限额,由投保人和保险人依据招标文件中相关规定协商确定,并在保险单中载明。

保险期间

第九条 保险期间由投保人与保险人依据招标文件有关约定协商确定,具体以保险单载明的约定时间为准,但最长不超过一年。

保险人义务

第十条 订立保险合同时,如采用保险人提供的格式条款的,保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款,保险人应当向投保人说明保险合同的内容。对保险合同中免除保险人责任的条款,保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示,并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明;未作提示或者明确说明的,该条款不产生效力。

第十一条 投保人提出保险要求,经保险人同意承保,保险合同成立,保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证,并向被保险人通知保险单或其他保险凭证信息。

第十二条 保险人收到被保险人提交的索赔申请文件后,应当从交单次日起的五个工作日内确定被保险人提供的有关索赔证明和资料是否完整,如不完整应一次性地通知被保险人补充提供。

投保人、被保险人义务

第十三条 投保人应履行如实告知义务,如实回答保险人就有关情况提出的询问,并如实填写投保单。

第十四条 投保人应在保险合同成立时一次性足额交付保费。投保人未按约定交纳保险费,保险合同不生效。

第十五条 投保人、被保险人有义务协助保险人或保险人委托的第三方核查与本保险合同有关的招标投标文件、单证以及往来函电等资料。

第十六条 被保险人在保险单生效后,招标条件发生变化且增加保险人责任的,应当及时通知投保人办理保险单批改手续。投保人应该按要求向保险人申请批改保单,否则保险人有权拒绝承担赔偿责任。

第十七条 被保险人知道保险事故发生后,应当及时通知保险人。故意或者因重大过失未及时通知,致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的,保险人对无法确定的部分,不承担赔偿或者给付保险金的责任,但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外。

赔偿处理

第十八条 被保险人申请赔偿时，应向保险人提供下列索赔文件：

- (一) 索赔申请书，含对该索赔的声明、说明及意见；
- (二) 招投标文件；
- (三) 其他所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的证明和资料（如有）。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实部分不承担赔偿责任。

第十九条 保险人收到被保险人提交的符合的完整索赔文件后，应当从次日起的五个工作日内完成是否属于保险责任的核定。

(一) 对属于保险责任的，保险人应当在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，向被保险人履行赔偿义务；

(二) 对不属于保险责任的，保险人应当自做出核定之日起三日内，向被保险人发出拒绝赔偿通知书。

第二十条 发生保险责任范围内的损失，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内有权向投保人请求赔偿，被保险人就此应当向保险人提供必要的文件和协助。

被保险人已经从投保人处取得赔偿的，保险人赔偿保险金时，应相应扣减被保险人已从投保人处取得的赔偿金额。

争议处理和法律适用

第二十一条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交保险单载明的仲裁机构仲裁；保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的，可依法向中华人民共和国人民法院起诉。

第二十二条 本保险合同的争议处理适用保险单载明的法律，保险单未约定的则适用保险人所在地法律。

其他规定

第二十三条 保险人依照本保险合同约定向被保险人支付保险赔偿金后，保险责任自行终止。

第二十四条 除投保人与保险人另有约定，保险责任开始前，投保人要求解除保险合同的，保险人可以退还全额保险费，保险责任开始后，保险合同当事人不得解除保险合同。

释义

第二十五条 本保险合同涉及下列术语时，适用下列释义：

- (一) 【投标有效期】指为保证招标方有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投保人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限，该期限由招标方在招标文中载明，从提交招标文件的截止之日起算。

(二)【履约保证金】指在招标投标活动中，招标方为督促中标人履行合同，在招标文件中要求中标人以适当的格式或金额采用现金、银行保函、履约保证保险等形式提供的担保。





大家财产保险有限责任公司
Dajia Property & Casualty Insurance Co., Ltd.

95569
全国统一客户服务热线



投标保险凭证

单证流水号: 1095405302025000004

保险单号: 1095405302025000004

致(招标人): 高州市地方公路建设管理处

鉴于广东善宇公路工程有限公司(以下简称投标人)根据贵方就高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程项目,项目编号:2411-440981-01-01-626377拟参与此项投标。现经投标人申请,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保证:

一、保证范围及保证金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任:

- (一) 投保人在投标有效期内违反招标文件的有关规定擅自修改投标文件;
- (二) 在招标文件规定的投标时间截止后撤销投标文件;
- (三) 投保人收到被保险人发出的中标通知,未能或拒绝在有效期内签订合同;
- (四) 投保人收到被保险人发出的中标通知,未能或拒绝在规定期限内根据招标文件要求提供履约保证金/银行保险凭证/履约保证保险;
- (五) 中标后,因投保人的违法行为导致中标被依法确认无效;
- (六) 出现法律、法规、招标文件规定的没收保证金的其他情形;

二、我方保证的金额为: 人民币(大写)陆拾万元整(小写)600,000.00

三、代偿安排

贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在5个工作日内进行核定后按照本保险凭证的承诺承担保证责任。

四、保险期限

自 2025年06月24日 零时起至 2025年10月21日 二十四时止,共 120 日历天

五、其他约定

- 1、该保险凭证不设置免赔率或免赔额;
- 2、该保险凭证为不可撤销保险凭证。在保险凭证约定的有效届满之前,除因主合同终止执行外,该保险凭证不得撤销。

六、争议解决方式

本保险凭证适用于中华人民共和国法律(为本保险凭证之目的,不包含香港、澳门和台湾地区法律)并依据其解释。在本保险凭证履行期间,贵我双方若因本保险凭证产生纠纷,应友好协商解决,如不能解决的,可向我方住所地人民法院提出诉讼。

保险人:

保险日期: 2025年06月13日

地址: 广东省广州市天河区林和西路9号2816房自编8室

投标保证保险保函

高州市地方公路建设管理处：

鉴于广东善宇公路工程有限公司（以下称“投标人”）于2025年6月24日参加高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程的投标，大家财产保险有限责任公司广东分公司（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。

收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）陆拾万元整。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：大家财产保险有限责任公司广东分公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：广东省广州市天河区林和西路9号2816房自编8室

邮政

电话：

传真：

2025年6月13日

五、施工组织设计

一、根据《广东省高速公路工程施工组织设计和施工方案标准化管理指南》《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》，投标人应按以下要点编制施工组织设计，契合项目实际，突出重点，抓住关键。（文字应精炼、表述须清晰，内容具有针对性，总体原则上控制在15000字以内（不含附表及附图文字））：

1、总体施工组织布置及规划

(1)工程概况

①工程建设规模、数量等基本情况。

②施工自然条件（包括地形地貌、水文地质与工程地质条件、气候气象条件等）、施工条件（运输条件、施工用水、用电和筑路材料等）。

③工程特点及重难点工程分析与说明。

(2)施工组织安排

①施工管理组织机构。

②施工区域划分、作业队伍划分和作业人数配置。

③大型临时设施的布置规划、主要材料供应计划、临时工程用地计划、临时用电计划及施工总平面布置等。

(3)施工进度计划

①工期总目标及关键线路工期安排。

②各分项工程工期安排。

2、主要工程项目的施工方案与技术措施

(1)常规的路基、路面、桥涵、隧道工程仅说明工程概况、主要施工方法（仅明确工法，一般不写施工流程、具体工艺、质量检验等内容）。

(2)重点、难点和关键工程应根据本单位的施工技术水平、工装设备，积极响应《广东省公路工程施工标准化指南》规定，制定针对性施工方案及技术措施，包括：工程概况、主要设备配置、主要施工方法、组织方式、工期安排等。

(3)本工程拟采用的“四新”技术可适当进行说明，特别是对《广东省公路工程施工标准化指南》附录“四新”技术的使用进行说明。

3、工期保证措施

围绕工期目标，简要阐述影响工期的主要因素及相关应对措施。

4、工程质量保证措施

明确工程质量管理目标，针对工程质量通病，简要说明拟采取的预防控制措施。特别是对《广东省公路工程施工标准化指南》附录主要质量通病及防止措施进行说明。

5、安全生产保证措施

明确安全生产管理目标，针对工程主要安全风险点，简要说明拟采取的预防保障措施。

6、环境保护、水土保持保证措施

针对项目环境保护、水土保持敏感点，简要说明拟采取的预防保障措施。

7、文明施工、文物保护保证措施

针对文明施工和文物保护相关要求，简要说明拟采取的预防保障措施。

8、其他应说明的事项

可根据招标文件要求有选择地作出说明。

二、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求参见《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)第九章相应格式内容。

附表一	施工总体计划表
附表二	分项工程进度率计划（斜率图）
附表三	工程管理曲线
附表四	分项工程生产率和施工周期表
附表五	施工总平面图

一、总体施工组织布置及规划

(一)、工程概况

1、工程建设规模、数量等基本情况

本项目拟实施的8条县道线路总长64.85公里，均采用三级公路技术标准，设计速度30km/h(用地困难、工程实施难度特别大的路段维持现状四级公路，设计速度20km/h)，双向两车道，路基宽度为7.5m，路面为6.5m。项目实施过程中，可结合建设条件、安全行车要求，因地制宜实施。本项目水泥砼路面126.624千平方米，路肩墙2070立方米，护肩矮墙1442立方米。(具体内容以审核的施工图纸和工程量清单为准)。

2、施工自然条件(包括地形地貌、水文地质与工程地质条件、气候气象条件等)施工条件(运输条件、施工用水、用电和筑路材料等)

2.1. 施工自然条件

2.1.1. 地形地貌





项目位于高州市平山镇、长坡镇等多个镇街及宝光街道，沿线地形地貌复杂多样。

部分路段穿越丘陵地带，地形起伏较大，地面高程变化明显，局部存在陡坡、沟壑等特殊地形，对路基开挖与填筑施工提出较高要求。部分路段地处山间谷地，地势相对平缓，但地表覆盖层厚度不均，可能影响地基处理效果。

2.1.2. 水文地质与工程地质条件

水文地质：

区域内水系较发育，雨季时地表水径流丰富，部分路段可能受季节性积水影响。

地下水类型主要为孔隙水和基岩裂隙水，水位受季节影响波动较大，在路基施工中需做好降水与排水措施，避免地下水对基础施工造成不利影响。

部分路段可能存在软弱土层或流沙层，施工时易发生基坑渗水、边坡失稳等问题。

工程地质：

沿线地层分布复杂，可能包含黏性土、砂性土、碎石土及基岩等。

部分路段地基土承载力较低，需进行地基加固处理，如采用换填、碾压等措施。

基岩路段可能存在风化层，岩石强度差异较大，爆破施工时需根据岩性调整爆破参数，确保施工安全与效率。

2.1.3. 气候气象条件

项目所在区域属亚热带季风气候，气候特点对施工影响显著：

温度：夏季高温多雨，极端高温可达 35℃ 以上，易导致施工人员中暑、混凝土早期脱水开裂，需采取降温与保湿措施；冬季气温较低，部分时段可能出现低温天气，影响混凝土和沥青混合料的施工性能，需做好保温措施。

降水：雨季降水集中，年降雨量较大，暴雨天气频繁，易引发山洪、泥石流等地质灾害，对路基、桥涵施工安全构成威胁。施工期间需合理安排工期，避开雨季进行高边坡、深基坑等危险作业，并做好场地排水与边坡防护。

风力：台风季节可能遭受强风影响，对高空作业、临时设施稳定性造成威胁，需加强施工设备固定与临时结构抗风设计。

2.2. 施工条件

2.2.1. 运输条件

对外运输：项目周边现有公路路网较为完善，可利用国道、省道作为主要运输通道，将大型施工设备和材料运抵现场。但部分偏远路段与主干道连接道路等级较低，需提前对临时便道进行拓宽、硬化处理，确保运输车辆通行顺畅。

场内运输：施工场地内部分路段地形复杂，需修建临时施工便道，便道需满足重载车辆通行要求，部分陡坡、弯道地段需设置防滑、警示设施。材料运输过程中需合理规划路线，避免对既有交通造成影响。

2.2.2. 施工用水、用电

施工用水：可就近从沿线河流、水库取水，但需经水质检测合格后方可使用。对于缺水路段，需修建临时蓄水池或从市政供水管网接入水源，确保施工用水充足。在混凝土搅拌、养护等用水量大的工序中，需合理安排用水计划，避免水资源浪费。

施工用电：可从附近电网接入临时电源，需与当地电力部门沟通，申请临时用电容量，确保施工现场用电需求。同时配备柴油发电机组作为备用电源，防止停电影响施工进度，尤其在隧道、桥梁等关键部位施工时，备用电源必不可少。

3、工程特点及重难点工程分析与说明

3.1. 工程特点分析

线路分布广且多镇街联动

项目涉及高州市平山镇、长坡镇、大井镇等 9 个镇街及宝光街道，8 条县道线路总长 64.85 公里，线路呈网状分布，需协调多区域施工管理，不同镇街路段的地形、交通流量及周边环境差异大，施工组织需因地制宜，统筹各段落施工顺序与资源调配。

技术标准与因地制宜结合

采用三级公路技术标准，设计速度 30km/h（部分困难路段维持四级公路 20km/h），路基宽度 7.5m，路面 6.5m。施工中需结合建设条件与安全要求，如在用地困难、工程实施难度大的路段，需灵活调整施工工艺，确保技术标准与现场条件匹配，避免因硬性施工导致成本增加或工期延误。

工程内容综合性强

招标范围包含路基、路面、桥涵、交通安全设施等施工及缺陷修复，水泥砼路面 126.624 千平方米，路肩墙 2070 立方米，护肩矮墙 1442 立方米。各分项工程衔接紧密，如路基施工质量直接影响路面平整度，桥涵结构与路基填筑需同步规划，需形成多专业协同施工体系。

3.2. 重难点工程分析与说明

3.2.1. 路基工程重难点

复杂地形路基处理

部分路段穿越丘陵、谷地，地形起伏导致填挖方量不均，高填方路段需控制压实度，避免沉降；深挖方路段易出现边坡失稳，尤其在雨季需提前做好边坡支护与排水措施。如遇软弱地基，需采用换填、强夯等措施增强承载力，且需确保处理范围与深度符合设计要求，避免后期路基开裂。

老路改建衔接难点

项目为县道“单改双”改造，需在既有道路基础上拓宽，新旧路基拼接时需清除旧路边坡浮土，开挖台阶并分层填筑，控制新旧路基压实度差异，防止拼接处出现纵向裂缝。同时，施工期间需维持现有交通通行，需分段施工并设置临时交通导改设施，确保社会车辆与施工互不干扰。

3.2.2. 路面工程重难点

水泥砼路面施工质量控制

126.624 千平方米水泥砼路面施工中，需严格控制配合比、振捣工艺

及养护周期，避免出现蜂窝麻面、断板等问题。高温季节施工时，需采取覆盖保湿措施，防止混凝土早期脱水；低温季节需保证入模温度，必要时添加早强剂。路面平整度与抗滑构造施工需达到规范要求，确保行车安全。

路面与桥涵衔接处理


桥涵台背回填区域易产生沉降差，导致路面跳车。施工时需选用透水性材料分层回填，采用小型夯实机械加密碾压，台背与路面连接处需设置过渡段，通过调整基层厚度或设置钢筋网片增强整体性，确保衔接处路面结构连续。

（二）、施工总体布置规划、施工组织安排

1、施工管理组织机构

1.1. 领导决策层

作为项目的核心管理者，需对项目的各个关键方面进行严格把控和精心统筹。

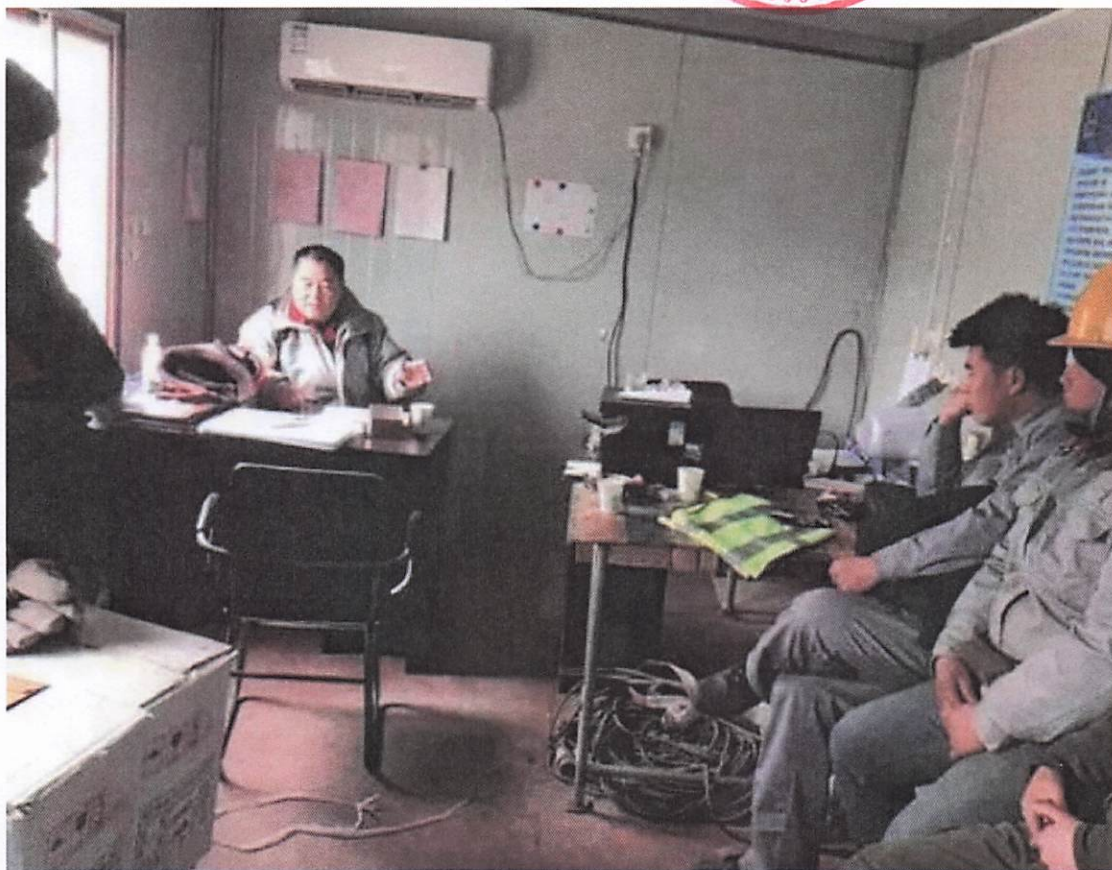

1.1.1. 项目前期准备

1.1.1.1 深入了解项目需求

与业主单位进行充分沟通，准确把握本项目的背景、目标、范围和要求。详细了解公路的现状、存在的问题以及业主具体期望。

1.1.1.2 组建项目团队

根据项目的规模和复杂程度，挑选具备相应专业技能和经验的人员组成项目团队。包括施工管理人员、技术人员、质量检测人员、安全管理人员等。

1.1.1.3制定项目计划

结合项目需求和团队资源，制定详细的项目进度计划。包括各个阶段的时间节点、关键里程碑以及具体的施工任务安排。确保项目进度合理、紧凑，能够按时完成。

1.1.2.项目实施阶段

1.1.2.1质量控制

建立严格的质量控制体系，确保施工的质量符合相关标准和要求。制定质量控制计划，明确质量控制的目标、方法和流程。



1.1.2.2安全管理

制定完善的安全管理制度和应急预案，确保施工过程中的安全。明确安全管理的目标、责任和措施，加强对施工人员的安全教育和培训。

1.1.3.项目后期阶段

1.1.3.1项目验收和交付

组织项目的验收工作，确保工程质量符合相关标准和要求。与业主单位、监理单位等共同进行验收，提交验收报告和相关资料。

1.1.3.2与业主单位的沟通和服务

与业主单位保持良好的沟通和合作关系，及时了解业主的需求和意见。对业主提出的问题和要求进行及时响应和处理。

1.2. 技术管理部门

技术负责人：负责项目的技术管理工作，制定施工技术方案，审核施工图纸，解决技术难题。对工程质量进行技术指导和监督，确保施工符合技术规范和标准。

测量工程师：负责工程的测量工作，包括控制点的布设、测量放线、变形监测等。确保工程的位置、高程等参数准确无误。

资料员：负责项目的技术资料管理工作，包括施工图纸、技术文件、检测报告等的收集、整理、归档和保管。确保技术资料的完整性和可追溯性。

1.3. 生产管理部门

施工队长：负责施工现场的生产管理工作，组织施工人员进行施工，协调施工设备和材料的调配，确保施工进度和质量。

安全员：负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度和措施，进行安全教育和培训，检查安全隐患，确保施工安全。

质量员：负责施工现场的质量管理工作，制定质量管理制度和措施，进行质量检查和验收，确保工程质量符合标准和要求。

设备管理员：负责施工设备的管理工作，包括设备的调配、维护、保养和修理等。确保施工设备的正常运行。

材料员：负责工程材料的管理工作，包括材料的采购、验收、储存和发放等。确保工程材料的质量和供应及时。

2、施工区域划分、作业队伍划分和作业人数配置

2.1. 施工区域划分

根据项目涉及的 9 个镇街及 8 条县道分布特点，结合线路走向与地形地貌，将施工区域划分为三个主施工片区，实现分区协同作业：

2.1.1. 北部镇街片区

涵盖范围：平山镇、长坡镇、东岸镇县道，线路总长约 22 公里，多为丘陵地形，部分路段穿越山间谷地。

施工重点：该区域路基填挖方量较大，需重点处理高边坡稳定性及新旧路基拼接；部分桥涵位于河道附近，需优先安排基础施工，避开雨季洪水影响。

2.1.2. 中部镇街片区

涵盖范围：大井镇、曹江镇、谢鸡镇县道，总长约 20 公里，地形以缓坡和平原为主，途经集镇路段较多。

施工重点：集镇段需分段实施交通导改，确保居民出行；路面施工需优先完成水泥砼基层，衔接交通安全设施安装，同步推进排水系统施工。

2.1.3. 南部镇街片区

涵盖范围：石鼓镇、镇江镇及宝光街道县道，总长约 22.85 公里，部分路段临近农田与水系，软土地基分布较广。

施工重点：软基路段需提前进行换填或深层搅拌处理；跨河桥涵需结合水文条件，安排汛期前完成下部结构施工，避免河道阻水。

2.2. 作业队伍划分

基于施工区域划分及工程专业类型，组建专业化作业队伍，实现区域内分专业流水施工：

2.2.1. 路基施工队伍

任务划分：各片区分别配置路基施工队，负责路堑开挖、路堤填筑、

地基处理及边坡防护。北部片区重点处理高填方压实，南部片区侧重软基换填，中部集镇段聚焦新旧路基拼接。

作业逻辑：采用“段落承包制”，每个施工队按设计图纸完成路基土石方开挖、回填及压实，同步施工排水边沟，确保路基成型一段、验收一段。

2.2.2. 路面施工队伍

任务划分：按片区组建路面施工队，负责水泥砼路面基层与面层施工。北部丘陵段需控制路面平整度，避免因地形起伏导致摊铺误差；中部集镇段需优化施工顺序，减少交通干扰。

工艺衔接：路基验收合格后，立即开展路面底基层施工，采用“集中拌合、分段摊铺”模式，确保水泥砼路面强度与抗滑性能达标。

2.2.3. 桥涵施工队伍

任务划分：各片区配置桥涵专业队，负责涵洞、小桥的基础浇筑、上部结构施工及附属工程。南部片区跨河桥涵优先施工下部结构，北部山区桥涵重点控制基坑支护安全。

技术要点：桥涵台背回填采用透水性材料，分层夯实至设计要求，避免后期沉降影响路面衔接。

2.3. 作业资源配置原则

根据工程规模与工期要求（150 日历天），以“高效集约、动态调配”为原则配置作业资源：

2.3.1. 区域资源协同

北部丘陵片区因地形复杂，优先投入重型压实设备与边坡支护材料；南部软基路段提前储备碎石、砂料等换填材料；中部集镇段备足临时交通导改设施（围挡、警示灯）。

各片区材料堆场按“就近原则”设置，减少运输损耗，如水泥、钢

材集中存放于集镇段仓库，石料就近从周边料场采购。

2.3.2. 专业工序衔接

路基施工队完成 10 公里段落并验收后，路面施工队立即插入基层作业，形成“路基 - 路面 - 附属”流水施工链；桥涵施工队同步推进结构物施工，确保与路基工程同步完成。

雨季来临前，集中资源完成北部山区高边坡防护与南部软基处理，避免地质灾害影响施工进度。

3、大型临时设施的布置规划、主要材料供应计划、临时工程用地计划、临时用电计划及施工总平面布置等

3.1. 大型临时设施布置规划

3.1.1. 施工便道与便桥

布置原则：

利用既有县道作为主运输通道，对部分偏远路段拓宽硬化临时便道，宽度不小于 6m，采用 20cm 厚 C30 混凝土硬化，两侧设置排水边沟。

跨河路段搭设钢结构便桥，承载力满足 40t 重载车辆通行，桥面铺设防滑钢板并设置护栏。

具体区域：

北部丘陵片区便道沿路基红线外侧布置，避开高边坡开挖区域；南部软基路段便道地基换填碎石后压实，避免沉降；集镇段便道与现有道路顺接，设置明显交通标识，减少对居民出行影响。

3.1.2. 混凝土拌合站

选址规划：

在中部大井镇、北部长坡镇、南部石鼓镇各设置 1 座集中拌合站，距离主线不超过 5km，便于物料运输。

拌合站占地约 5000m²，场地硬化处理，设置砂石料仓（分隔存放碎石、

机制砂）、水泥罐（容量 500t）及配料系统。

产能配置：

每座拌合站配备 2 台强制式搅拌机，日均产能不低于 500m^3 ，满足水泥砼路面 126.624 千平方米的施工需求。拌合站设置沉淀池，废水经处理后循环使用，符合环保要求。



3.1.3. 钢筋加工场

分布方案：在各拌合站旁配套设置钢筋加工场，占地约 2000m^2 ，采用钢结构大棚封闭，地面铺设钢板防滑。场内划分钢筋下料区、加工区、成品堆放区，设置龙门吊进行物料吊运。

加工范围：负责桥涵结构钢筋、路面传力杆及拉杆的加工制作，成品

分类标识存放，避免混用。加工场配置除锈、调直、弯曲设备，确保钢筋加工精度符合设计要求。



3.2. 主要材料供应计划

3.2.1. 石料与砂料

供应策略：石料优先采购当地合法料场的碎石（粒径 5-31.5mm），用于路基填筑、基层施工；机制砂从附近采石场定制加工，满足混凝土用砂级配要求。南部软基路段提前储备片石用于换填，储备量按设计方量的 1.2 倍计算。

运输管理：采用 15t 自卸车运输，每日按施工进度安排运输批次，确保石料日供应量不低于 800m³，砂料日供应量不低于 500m³。雨季前储备 15 天用量，避免材料短缺。

3.2.2. 水泥与钢材

采购渠道：水泥选用 P.O 42.5 级普通硅酸盐水泥，与当地大型水泥厂签订直供协议，确保每批次提供质量合格证及检测报告；钢材从国企钢厂采购，涵盖 HRB400E 钢筋（直径 8-32mm），进场时逐批抽样送检。

存储要求：水泥存放于拌合站封闭式罐仓，设置防潮措施；钢材存放于加工场大棚内，底部垫高 30cm，避免雨水锈蚀。按施工进度计划，水泥月均需求量约 2000t，钢材月均需求量约 500t，提前 7 天下单采购。

3.3. 临时工程用地计划

3.3.1. 用地规划原则

临时用地总面积控制在 150 亩以内，优先利用红线内弃土场及周边荒坡，减少农田占用。各片区临时用地集中布置，避免分散设置，便于管理与复耕。

北部丘陵片区临时用地侧重拌合站、钢筋加工场及弃土场；中部集镇段临时用地设置材料堆场与临时办公区；南部软基路段临时用地预留淤泥堆放区，做好防渗处理。

3.3.2. 具体用地类型

拌合站与加工场用地：每座拌合站占地约 8 亩，钢筋加工场占地约 3 亩，场地硬化并设置排水系统，周边砌筑围挡，减少扬尘污染。

弃土场用地：选址于红线外低洼地带，容量按挖方量的 1.1 倍设置，弃土分层压实，顶部覆盖耕植土，施工结束后复耕还田。

办公与生活用地：各片区设置临时项目部，占地约 2 亩，采用集装箱式板房，配套食堂、宿舍及卫生间，生活污水经化粪池处理后排入市政管网。

3.4. 临时用电计划

3.4.1. 电源接入

从沿线 10kV 电网接入临时电源，在各拌合站、加工场附近设置变压器（容量 630kVA），采用三相五线制配电系统。集镇段施工用电与当地电力部门协调，申请临时用电指标，确保高峰期供电稳定。

北部山区路段若电网接入困难，配备 2 台 200kW 柴油发电机作为备用电源，满足桥涵基础施工及夜间照明需求。

3.4.2. 配电布置

施工现场用电线路采用架空敷设，高度不低于 4m，穿越道路时设置保护套管。拌合站、加工场等用电集中区域设置配电箱，配置漏电保护器，做到“一机一闸一保护”。

临时照明采用 LED 节能灯具，办公区与施工区分开配电，避免相互影响。雨季前检查线路绝缘层，防止漏电事故。

3.5. 施工总平面布置

3.5.1. 总体布局

以各片区拌合站为中心，周边布置钢筋加工场、材料堆场及临时便道，形成“生产核心 + 运输网络”的布局模式。路基施工区沿线路走向分段展开，桥涵施工区优先布置于拌合站辐射范围内，减少物料运输距离。

北部丘陵片区：拌合站位于长坡镇县道旁，钢筋加工场紧邻拌合站，弃土场设置于线路北侧荒坡，便道沿路基左侧贯通。

中部集镇段：材料堆场设置于集镇外围，避开居民区，临时办公区靠近主线，便于现场管理。

南部软基路段：拌合站与加工场集中布置于石鼓镇附近，软基处理材料堆放在换填路段周边，缩短运输距离。

3.5.2. 环保与安全措施

拌合站设置除尘设备，砂石料仓封闭管理，减少粉尘排放；生活、生产废水经处理后回用，避免污染周边水体。

施工现场设置明显安全标识，高边坡、临边作业区域设置防护栏及警示灯，临时用电线路按规范架设，确保符合安全标准。

（三）、施工进度计划

1、工期总目标及关键线路工期安排

工期总目标：150个日历天。

2、各分项工程工期安排

详见施工总体计划表。



二、主要工程项目的施工方案与技术措施

（一）、施工方案

1、道路施工

1.1. 路基施工

根据线路地形，采用机械与人工配合方式施工。

丘陵路段先清除表层耕植土及软弱层，按设计坡率开挖台阶，新旧路基拼接处开挖宽度不小于 2m 的台阶并铺设土工格栅，分层填筑时控制松铺厚度 $\leq 30\text{cm}$ ，采用重型压实机械分层碾压，压实度需达到路基设计标准。



软基路段采用换填碎石处理，换填深度根据现场地质情况确定，换填材料级配符合规范要求，分层压实后检测地基承载力。

路堑开挖按自上而下顺序进行，边坡开挖后及时施工护坡或挡土墙，防止雨水冲刷。

1.2. 路面基层施工

采用水泥稳定碎石基层，集中拌合站拌合材料，严格控制水泥用量与级配。

运输至现场后，用摊铺机摊铺，摊铺速度均匀，摊铺厚度通过高程控制桩精准调整。

碾压遵循“先轻后重、先慢后快”原则，初压用轻型压路机，终压用重型压路机，确保压实度 $\geq 97\%$ 。

碾压完成后及时覆盖洒水养护，养护期不少于 7 天，养护期间封闭交通。

1.3. 水泥砼路面施工



使用强制式搅拌机拌合混凝土，配合比按设计要求试配确定。

采用滑膜摊铺机摊铺，摊铺前检查基层平整度，摊铺速度控制在 1-1.5m/min，振捣棒振捣密实，避免漏振或过振。

面板成型后及时进行拉毛处理，形成抗滑构造深度 $\geq 0.7\text{mm}$ 的表面。

养护采用薄膜覆盖结合洒水方式，养护期内禁止车辆通行，确保混凝土强度达到设计要求（28 天抗压强度 $\geq 30\text{MPa}$ ）。

2、标志牌施工

按设计位置测量放样，基坑开挖尺寸符合基础设计要求，基底夯实后浇筑 C25 混凝土基础，基础预埋件位置精准定位。

标志立柱采用热镀锌钢管，安装时用吊车吊装，调整垂直度偏差 $\leq 3\text{mm/m}$ ，立柱与基础连接牢固。

标志版面在工厂标准化制作，反光膜采用符合设计等级的材料，安装时版面平整，螺栓紧固，版面与行车方向夹角符合规范，确保视认性良好。



3、标线施工

施工前清除路面杂物，用吹风机吹扫干净，确保路面干燥、整洁。

采用热熔标线涂料，施工时加热至 $180\text{--}220^{\circ}\text{C}$ ，用热熔标线机涂布，标线厚度控制在 $1.8\text{--}2\text{mm}$ ，宽度误差 $\leq 5\text{mm}$ 。

斑马线、导向箭头等图案按设计尺寸放样，线条顺直，边缘整齐，反光玻璃珠撒布均匀，保证夜间反光效果。

4、路面修复施工

对原路面破损区域进行勘察，凿除破损混凝土板，清理基层松散材料，基层损坏处用水泥稳定碎石修补至设计高程。

修复区域钢筋网按设计间距绑扎，新旧混凝土结合面凿毛处理，涂刷界面剂。浇筑混凝土时与原路面接茬平顺，振捣密实，养护期后切缝灌缝，防止反射裂缝。

5、绿化施工

路侧绿化按设计图纸放线，清理种植区域杂物，换填种植土厚度 $\geq 50\text{cm}$ ，土壤肥力符合植物生长要求。

苗木选择根系发达、无病虫害的健壮植株，乔木种植时保持树穴深度与土球高度一致，回填土分层夯实，浇透定根水。灌木及地被植物按设计密度种植，修剪整齐，确保绿化景观效果。

绿化养护期内定期浇水、施肥、修剪，保证苗木成活率 $\geq 95\%$ ，后期养护至交工验收。

（二）、重点、难点和关键工程及解决方案

1、重点、难点工程分析

1.1. 老路改建中的路基拼接工程

本项目为县道“单改双”改造，需在既有道路基础上拓宽，新旧路基拼接是核心难点。既有道路使用年限较长，部分路段存在路基沉降不均、边坡土体松散的情况，拼接时若处理不当易产生纵向裂缝。且施工期间需维持现有交通通行，分段施工与交通导改难度大。

1.2. 复杂地形下的路基施工

项目涉及 9 个镇街，部分路段穿越丘陵、谷地，地形起伏大。北部丘陵区高填方路段压实度控制困难，南部软基路段存在地基承载力不足问题，雨季施工时高边坡易发生滑坡、坍塌，对路基稳定性构成威胁。

1.3. 水泥砼路面施工质量控制

126.624 千平方米水泥砼路面施工中，高温季节混凝土易出现早期脱水开裂，低温季节强度增长缓慢。路面平整度、抗滑构造深度需严格达标，且桥涵台背回填区域易因沉降差导致路面跳车，衔接处施工精度要求高。

1.4. 涉农项目的生态与农田保护

项目资金为省级涉农资金，施工区域涉及农田、林地，临时占地需控制范围，弃土场选址与复耕需符合涉农项目要求。运输车辆扬尘、施工废水排放若处理不当，易污染农田，影响周边农业生产。

1.5. 多镇街协同施工的组织管理

线路总长 64.85 公里，横跨多个镇街，各路段地形、交通流量及地方协调需求差异大。材料运输需统筹多区域调度，施工进度需同步推进，避免因镇街协调不畅导致工期延误。

2、关键工程及解决方案

2.1. 新旧路基拼接工程

解决方案:

施工前对既有路基边坡进行勘察，清除表层浮土及松散土体，按 1:1.5 坡率开挖台阶，台阶宽度不小于 2 米，台阶顶面设置 2% 向内倾斜的横坡。

拼接处铺设双向土工格栅，格栅幅宽不小于 3 米，搭接长度 ≥ 50 厘米，采用 U 型钉固定。

新填路基填料选用透水性材料，分层填筑时松铺厚度控制在 25 厘米以内，压实度比设计标准提高 1%，采用冲击碾压设备增强压实效果。

分段施工时，每段施工长度控制在 500 米以内，完成一段验收一段，避免长段落施工影响交通导改。

2.2. 软基处理与高边坡防护工程

解决方案:

软基路段采用换填碎石处理，换填深度根据地质勘察报告确定，一般不小于 2 米，碎石级配为 5-40 毫米，分层压实后检测地基承载力 $\geq 150\text{kPa}$ 。

高边坡施工前先施工截水沟，防止雨水冲刷边坡。边坡开挖采用分级开挖，每级高度不超过 8 米，坡率按设计要求放坡，开挖后及时施工浆砌片石护坡或锚杆框架梁防护。

雨季来临前完成边坡防护主体工程，坡面铺设草皮或喷播植草，增强边坡稳定性与生态保护。

2.3. 水泥砼路面与桥涵衔接施工

解决方案:

桥涵台背采用透水性材料（如级配碎石）回填，分层厚度 ≤ 15 厘米，

采用小型夯实机械加密碾压，压实度 $\geq 96\%$ 。

台背与路面连接处设置 5 米长的过渡段，过渡段基层采用钢筋网片加强，钢筋直径 12 毫米，间距 15 厘米 $\times$ 15 厘米。

混凝土路面施工时，在台背过渡段设置胀缝，缝宽 2 厘米，填缝料采用硅酮类密封胶，防止雨水渗入。

高温季节施工时，混凝土中添加缓凝剂，浇筑后及时覆盖土工布洒水养护，养护期不少于 14 天；低温季节采用暖棚加热养护，保证入模温度 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 。

2.4. 涉农生态保护与施工协调

解决方案：

临时占地优先选用红线内弃土场及荒坡，确需占用农田时，与镇街政府签订复耕协议，施工结束后 6 个月内完成土地平整、耕植土回填，恢复耕作条件。

运输车辆配备篷布覆盖，出场前冲洗轮胎，避免泥土污染农田道路；
施工废水经沉淀池处理

（三）、本工程拟采用的“四新”技术

1、新技术应用

1.1. 路基施工中的智能压实监控技术

在高填方路段及新旧路基拼接处，采用智能压实监控系统，通过安装在压路机上的传感器实时采集压实遍数、速度、沉降量等数据，数据同步传输至管理平台，形成压实质量云图。该技术可精准控制路基压实度，避免漏压或过压，确保拼接路基压实均匀性，减少后期沉降差，尤其适用于丘陵区复杂地形的压实质量管控。

1.2. 水泥砼路面滑膜摊铺技术

针对 126.624 千平方米水泥砼路面施工，采用滑膜摊铺机一次性完成摊铺、振捣、成型作业。该技术通过自动找平系统控制路面高程和平整度，摊铺速度与振捣频率智能匹配，可有效减少人工干预，提升路面平整度（平整度标准差 $\leq 1.2\text{mm}$ ）和抗滑构造深度（ $\geq 0.7\text{mm}$ ），同时缩短施工周期，适用于集镇段等对施工效率要求高的路段。

1.3. 桥涵台背泡沫混凝土回填技术

在桥涵台背回填中，采用泡沫混凝土替代传统级配碎石。该材料具有轻质、流动性好的特点，可通过泵送施工填充台背狭小空间，避免传统夯实作业的死角问题，消除回填压实盲区，有效降低台背沉降差，减少路面跳车现象。同时，泡沫混凝土早期强度增长快，可缩短施工间歇期，加快工序衔接。

2、新材料应用

2.1. 路基拼接用高强度土工格栅

新旧路基拼接处铺设高强度聚酯长丝土工格栅，其抗拉强度 $\geq 80\text{kN/m}$ ，延伸率 $\leq 10\%$ 。该材料可增强新旧路基界面的摩擦力和整体性，分散拼接处的应力集中，抑制纵向裂缝产生。格栅采用自粘式搭接，施工便捷，适用

于丘陵区路基拓宽时的差异沉降控制。

2.2. 水泥砼路面高性能外加剂

在混凝土中掺加聚羧酸高性能减水剂，减水率 $\geq 25\%$ ，可降低水灰比，提高混凝土早期强度和抗裂性能。同时，掺加复合型抗裂纤维（掺量 $0.9\text{kg}/\text{m}^3$ ），减少高温季节混凝土收缩裂缝，适用于夏季高温环境下的路面施工，确保混凝土 28 天抗压强度 $\geq 30\text{MPa}$ 。

2.3. 环保型热熔标线涂料

标线施工采用环保型热熔涂料，添加反光玻璃珠（撒布量 $0.3\text{kg}/\text{m}^2$ ），反光系数 $\geq 300\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$ ，夜间可视距离 $\geq 200\text{m}$ 。该涂料不含苯类溶剂，施工时无刺激性气味，符合涉农项目环保要求，且耐磨耗性能优异，使用寿命 ≥ 3 年，适用于集镇段等交通流量较大的路段。

3、新工艺应用

3.1. 旧路面碎石化再生工艺

对原路面破损区域采用碎石化技术处理，通过多锤头破碎机将旧水泥砼板破碎成粒径 $\leq 30\text{cm}$ 的碎块，经压实后作为基层使用。该工艺可减少建筑垃圾外运，降低材料成本，同时保留旧路面结构强度，适用于老路改建中的路面修复施工，缩短基层施工周期。

3.2. 预制装配式涵洞施工工艺

小型涵洞采用预制装配式结构，在工厂预制涵节（每节长度 2m ），现场吊装拼接。预制涵节采用高精度钢模板浇筑，混凝土强度 $\geq \text{C}35$ ，接缝处设置橡胶止水带。该工艺可减少现场浇筑时间，提高涵洞施工精度，适用于软基路段，避免现浇施工的地基沉降风险。

3.3. 绿化喷播植草工艺

路侧绿化采用液压喷播技术，将草种、肥料、保水剂、黏合剂按比例混合后，通过喷播机均匀喷射至边坡。喷播厚度控制在 $2\text{--}3\text{cm}$ ，形成连续

植被层，可快速覆盖边坡，防止水土流失，适用于高边坡生态防护，尤其适合丘陵区边坡的绿化恢复。

4、新设备应用

4.1. 智能混凝土搅拌设备

混凝土拌合站采用智能控制系统，自动计量水泥、砂石、水及外加剂用量，计量误差 $\leq 1\%$ 。系统可根据实时气温、湿度调整配合比，确保混凝土和易性稳定，适用于不同气候条件下的路面基层及桥涵混凝土施工，保障材料质量均一性。

4.2. 无人测量机器人

线路测量采用无人测量机器人，通过 GNSS 定位系统和激光雷达扫描，实现路基、路面施工的高精度放样（平面位置误差 $\leq 5\text{cm}$ ，高程误差 $\leq 3\text{cm}$ ）。该设备可自动生成三维地形模型，快速识别老路改建中的地形突变点，辅助确定路基开挖及回填边界，尤其适用于丘陵区复杂地形的施工放样，相比传统人工测量效率提升 3 倍以上。

4.3. 边坡智能监测设备

在高边坡施工区域布设智能监测传感器，实时采集边坡位移、沉降、含水率等数据，数据通过无线传输至监控平台。当监测数据超过预警值时（如位移速率 $\geq 5\text{mm} / \text{天}$ ），系统自动发出警报，指导施工人员及时采取加固措施，适用于雨季高边坡稳定性管控，避免滑坡等地质灾害。

三、工期、质量、安全、环保水保、文明施工保证措施

(一)、工期保证措施

1、影响因素

1.1. 自然因素

天气条件：恶劣的天气如暴雨、暴雪、大风等会影响施工进度，尤其是对露天作业的路基、路面施工影响较大。

地质条件：复杂的地质情况可能导致施工难度增加，如软土地基需要进行特殊处理，山区道路可能面临山体滑坡、泥石流等地质灾害风险，这些都会延长施工工期。

1.2. 人为因素

施工组织管理不善：如果施工单位的组织管理不到位，人员、设备、材料的调配不合理，施工工序安排不当等，都会导致施工效率低下，延误工期。

协调问题：与当地政府、居民及其他相关部门的协调不畅，可能会出现征地拆迁困难、施工干扰等问题，影响施工进度。

2、保证措施

2.1. 针对自然因素的措施

关注天气预报：施工单位应密切关注天气预报，提前做好防范措施。在恶劣天气来临前，做好施工现场的防护工作，合理安排施工任务，尽量减少天气对施工的影响。

地质勘察：在施工前进行详细的地质勘察，了解地质情况，制定相应的施工方案。对于复杂的地质条件，邀请专家进行论证，采取科学合理的处理措施，确保施工安全和进度。

2.2. 针对人为因素的措施

优化施工组织管理：建立健全施工组织管理体系，明确各部门和人员

的职责，加强沟通协调，提高施工效率。合理安排施工工序，采用平行作业、流水作业等方式，缩短施工周期。

加强协调沟通：积极与当地政府、居民及其他相关部门沟通协调，争取他们的支持和配合。及时解决征地拆迁、施工干扰等问题，为施工创造良好的外部环境。

（二）、工程质量保障措施

质量目标：交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：优良。

1、施工准备阶段

认真做好施工图纸会审和技术交底工作，确保施工人员准确理解设计意图和施工要求。

对原材料、构配件进行严格的质量检验，确保其质量符合设计要求和相关标准。建立原材料质量追溯制度，对不合格材料坚决予以退场。

合理配置施工机械设备，确保其性能良好、运转正常。对计量器具进行定期校验，保证计量准确。

2、施工过程中

加强施工质量检查，实行“三检制”（自检、互检、专检）。建立质量检查台账，对发现的质量问题及时整改，确保工程质量符合要求。

加强对施工过程的监测和测量，及时掌握工程质量动态。对重要的测量控制点进行定期复测，确保测量数据准确可靠。

3、竣工验收阶段

认真做好工程的竣工自检工作，确保工程质量符合设计要求和相关标准。及时整理竣工资料，确保资料完整、准确。

积极配合业主、监理单位进行竣工验收，对验收中提出的问题及时整改，确保工程顺利交付使用。

（三）、安全生产保证措施

安全目标:严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度,确保项目建设期内不发生安全事故。

1、加强安全教育培训

对所有参与施工的人员进行入场安全教育培训,包括安全法规、安全操作规程、安全防护知识等方面的内容。

定期组织安全培训和安全技术交底,针对不同工种和施工阶段的特点,进行有针对性的安全培训。

2、落实安全防护措施

在施工现场设置明显的安全警示标志,如限速标志、施工标志、危险区域标志等。

对施工现场进行封闭管理,设置围挡和出入口,严格控制人员和车辆的进出。

为施工人员配备必要的安全防护用品,如安全帽、安全带、安全鞋、防护手套等,并督促其正确使用。

在高空作业、临边作业、交叉作业等危险部位设置安全防护设施,如防护栏、安全网、脚手板等。

3、强化施工现场安全管理

合理安排施工顺序和施工进度,避免交叉作业和抢工现象,确保施工安全。

加强对施工现场的安全巡查和监督检查,及时发现和消除安全隐患。

对重大危险源进行辨识和评估,制定相应的控制措施和应急预案。

严格执行动火作业、临时用电作业等特殊作业的审批制度,确保特殊作业安全。

（四）、环境保护、水土保持保证措施

1、环境保护保证措施

1.1. 生态环境保护

在施工前，对施工区域内的生态环境进行详细调查，了解动植物分布情况，制定相应的保护措施。

严格控制施工范围，避免对周边生态环境造成不必要的破坏。在施工过程中，尽量减少对植被的砍伐和破坏，对必须砍伐的植被，应在施工结束后及时进行恢复。

1.2. 水环境保护

施工废水应经过处理后达标排放。

在施工现场设置沉淀池、隔油池等污水处理设施，对施工废水进行处理。严禁将施工废水直接排放到河流、湖泊等水体中。

加强对施工现场周边水体的保护，避免施工过程中对水体造成污染。

1.3. 固体废弃物处理

施工现场设置垃圾桶和垃圾堆放点，对施工过程中产生的固体废弃物进行分类收集和处理。可回收利用的固体废弃物应进行回收利用，不可回收利用的固体废弃物应运至指定的垃圾处理场进行处理。

2、水土保持保证措施

2.1. 水土流失防治

在施工前，对施工区域内的水土流失情况进行调查，制定相应的防治措施。在施工过程中，应采取有效的水土流失防治措施，如修筑挡土墙、护坡、排水沟等。

对开挖的土方应及时进行回填或运至指定地点堆放，避免随意堆放造成水土流失。在土方堆放点应设置防护栏和警示标志，防止土方坍塌和流失。

2.2. 水土保持监测

在施工过程中，应加强对水土保持情况的监测。定期对施工区域内的水土流失情况、植被恢复情况进行监测，及时掌握水土保持工作的进展情况。

根据监测结果，及时调整水土保持措施，确保水土保持工作的有效性。在水土保持监测过程中，应建立监测档案，对监测数据进行记录和管理。

（五）、文明施工、文物保护保证措施

1、文明施工保证措施

1.1. 现场管理

施工现场设置“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图，明确施工内容、管理人员和监督电话等信息。

施工现场实行封闭管理，设置围挡和出入口，严格控制人员和车辆的进出。围挡高度不低于 1.8 米，材质坚固、稳定、整洁、美观。

施工现场道路进行硬化处理，保持道路畅通、平整、无积水。设置排水设施，及时排除雨水和施工废水。

施工现场材料、设备堆放整齐，标识明确。易燃易爆物品分类存放，专人管理。

施工现场设置垃圾堆放点，定期清理垃圾，保持施工现场整洁。

施工现场设置临时厕所，保持厕所清洁卫生。定期进行消毒处理，防止蚊蝇滋生。

1.2. 施工管理

施工人员统一着装，佩戴安全帽和工作牌。遵守劳动纪律，严禁酒后上岗和打架斗殴。

施工过程中，严格按照施工规范和操作规程进行施工，确保工程质量

和安全。

加强对施工机械设备的管理，定期进行维护保养，确保机械设备性能良好、运转正常。

合理安排施工时间，避免在居民休息时间进行高噪声作业。对高噪声设备，采取降噪措施，减少噪声污染。

加强对施工现场周边环境的保护，避免施工对周边环境造成污染和破坏。

2、文物保护保证措施

2.1. 宣传教育

组织施工人员进行文物保护教育和培训，提高施工人员的文物保护意识和法制观念。

在施工现场设置文物保护宣传栏，宣传文物保护知识和法律法规，营造良好的文物保护氛围。

2.2. 施工管理

在施工前，对施工区域进行文物调查和勘探，了解施工区域内的文物分布情况。如果发现文物，立即停止施工，保护现场，并及时报告当地文物管理部门。

施工过程中，严格按照施工规范和操作规程进行施工，避免对文物造成破坏。如果发现文物，立即停止施工，保护现场，并及时报告当地文物管理部门。

加强对施工机械设备的管理，避免施工机械设备对文物造成破坏。如果发现文物，立即停止施工，保护现场，并及时报告当地文物管理部门。

（六）、其他应说明的事项


无。

施工总体计划表


施工总体计划表									
天数 主要工程项目	第 1—16 天	第 17—32 天	第 33—48 天	第 49—64 天	第 65—80 天	第 81—96 天	第 97—112 天	第 113— 128 天	第 129—150 天
1. 施工准备	■								
2. 道路施工		■	■	■	■	■			
3. 标志牌施工					■	■	■	■	
4. 标线施工				■	■	■	■	■	
5. 路面修复施工								■	
6. 绿化施工					■	■	■	■	■



分项工程进度率计划（斜率图）

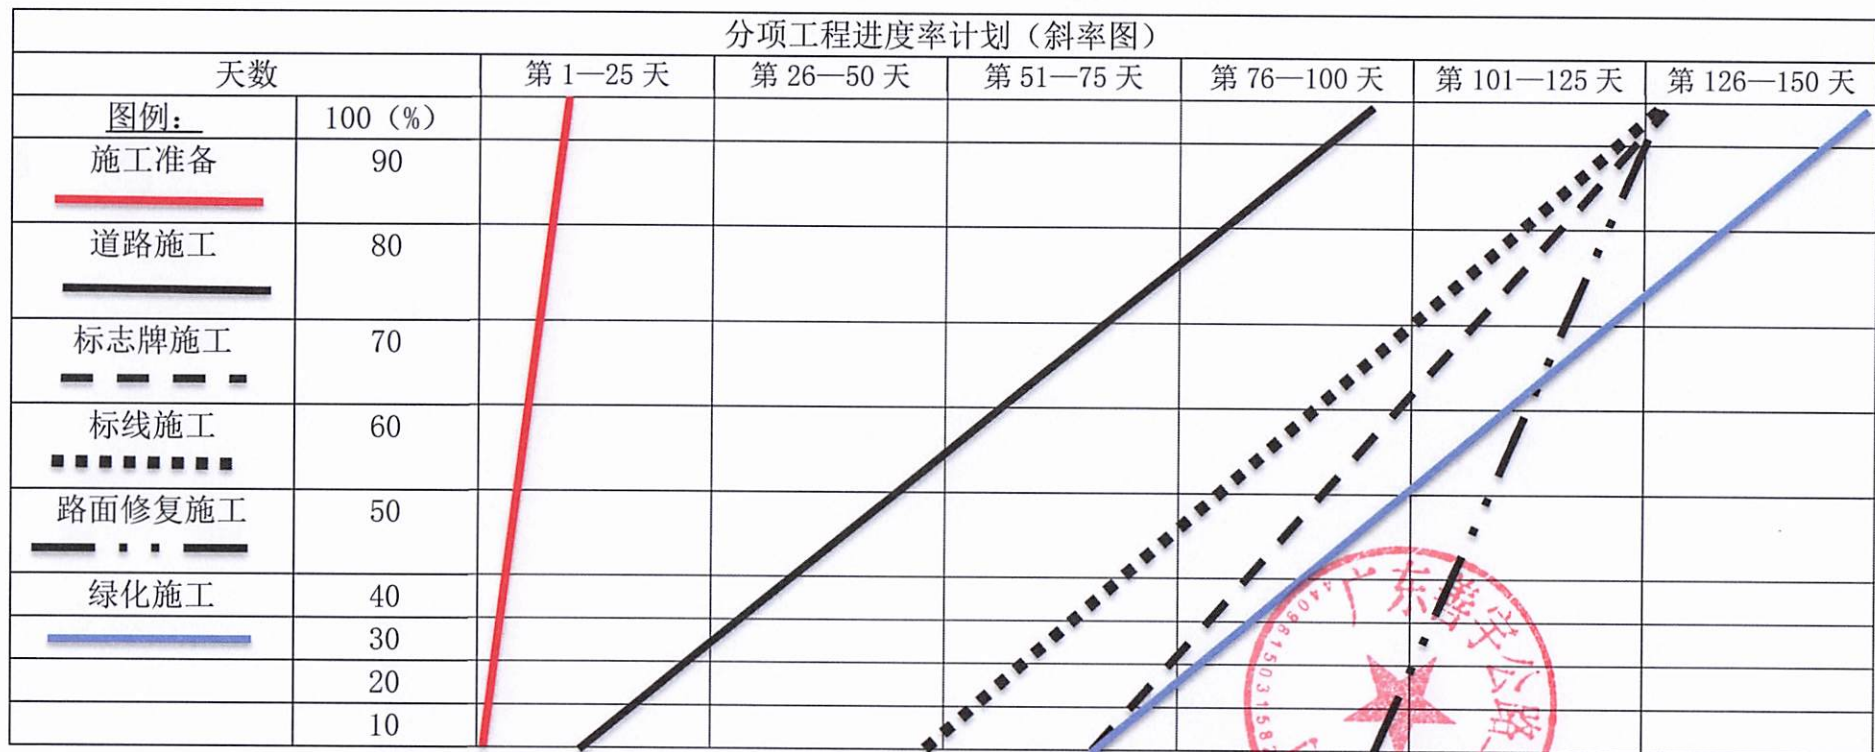

工程管理曲线

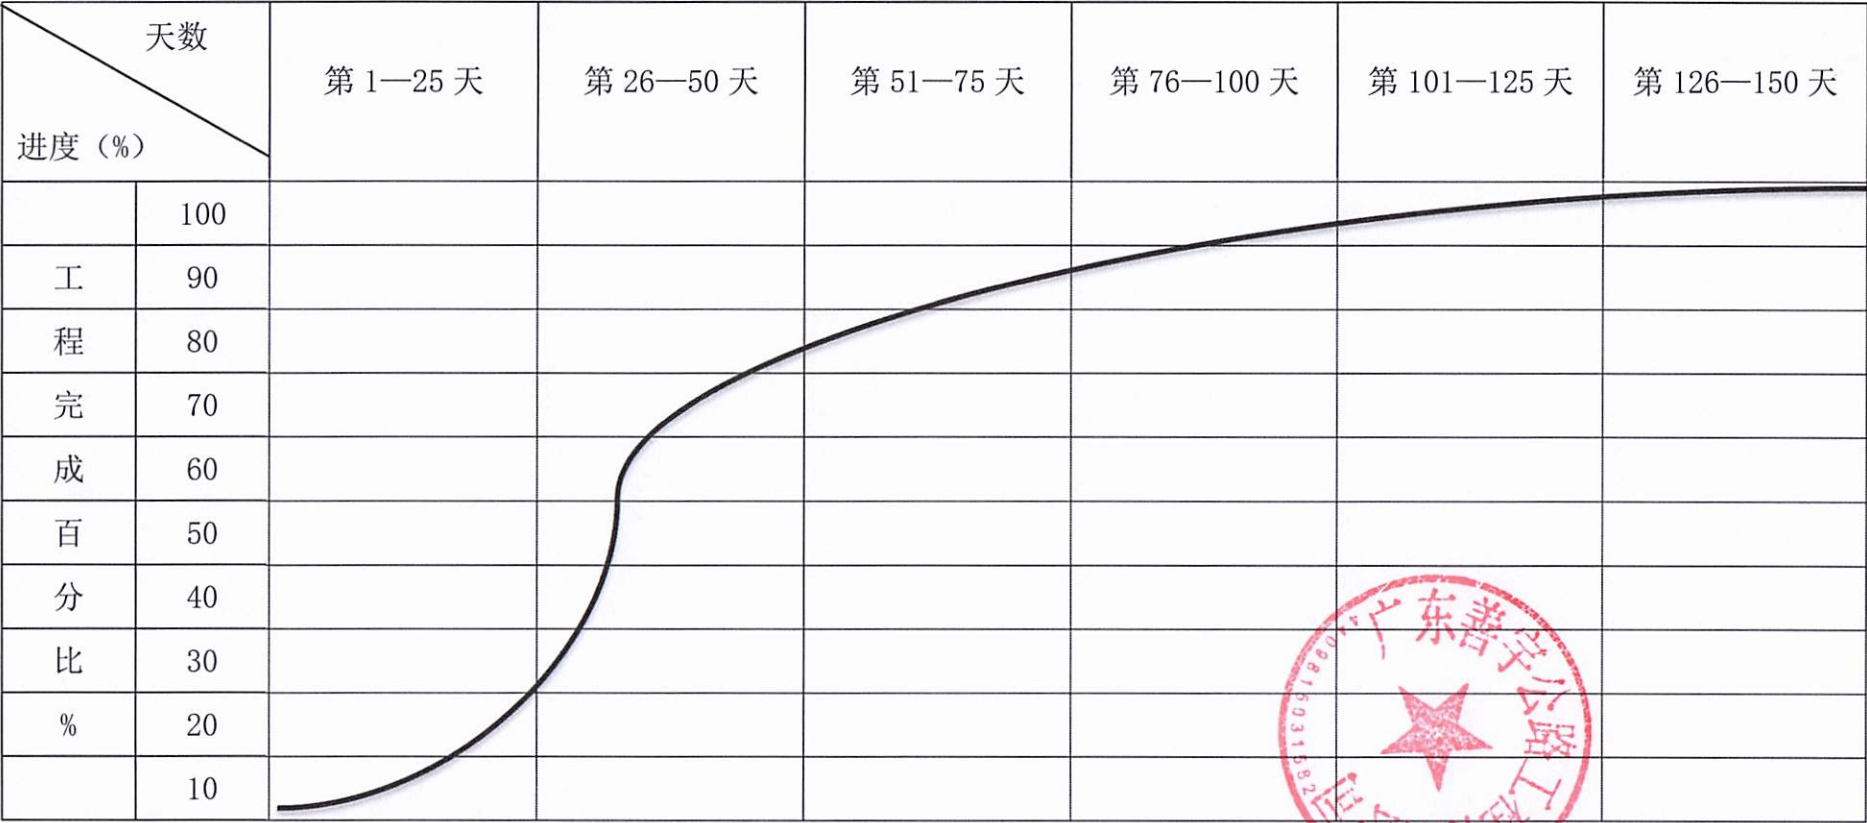


分项工程生产率和施工周期表

序号	工程项目	单位	数量	平均每生产单位规模 (____人各种机械____台)	平均每单位生产率 (数量、每周)	每生产单位平均 施工时间 (周)	生产单位总 数 (个)
1	道路施工	m ³	详见清单	30 人/15 台	0.33	3.42	3
2	标志牌施工	m ²	详见清单	50 人/21 台	3.21	4.42	2
3	标线施工	m ²	详见清单	50 人/21 台	4.78	3	2
4	路面修复施工	km	详见清单	30 人/18 台	416.15	11.42	1
5	绿化施工	道	详见清单	50 人/21 台	7.68	6.57	2

注：互通立交、分离立交的匝道、匝道涵洞、通道、桥梁分别归入表中相关的项目内。



施工总平面图

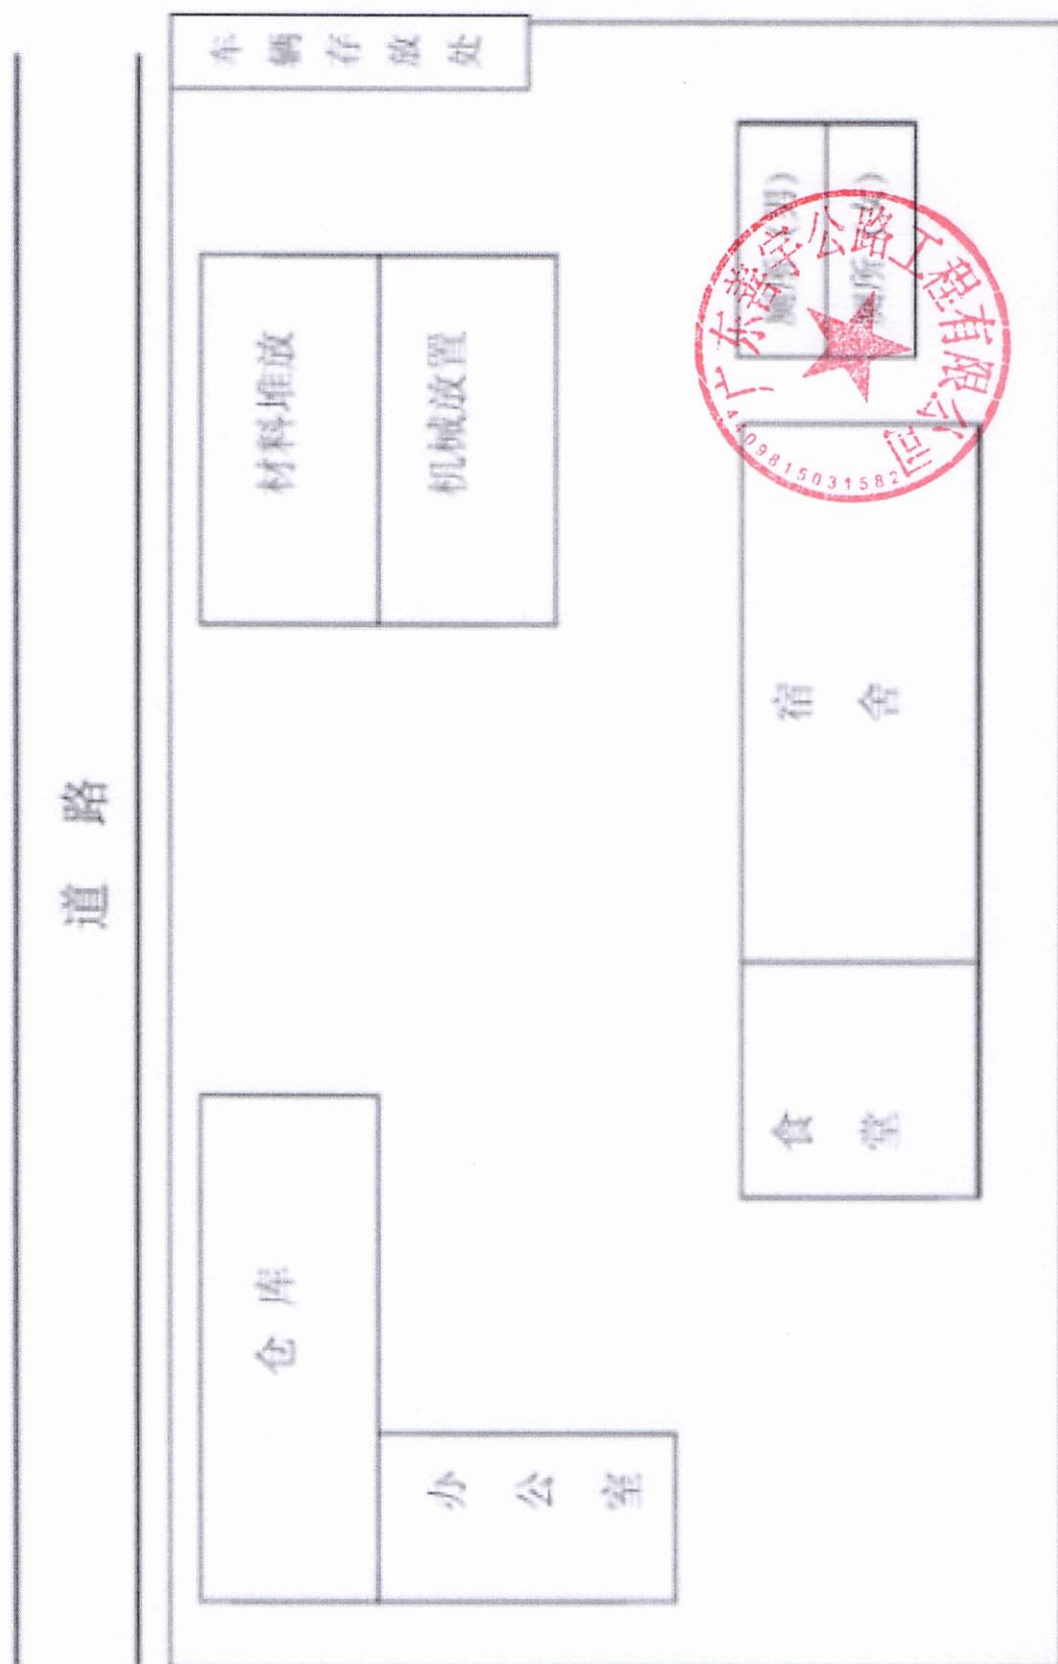

(注:施工现场周围为临时道路)

注:

项目部办公室用于项目部人员日常办公, 及充当会议室的作用:宿舍用于项目部固定工人的休息之用;

食堂用于项目部人员和工人的吃饭之用;

仓库用于储放用于本项目的材料和机械等;

材料堆放场地用于项目上进场的材料临时存放之用;

机械放置场地用于项目上投入的部分不便存放在仓库的机械之用;


车辆存放处用于民工上班时的车辆存放:

办公、生活区域以及设备材料存放处均设置临时安全用电系统, 同时办公、生活区域还要设置临时用水系统。



六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

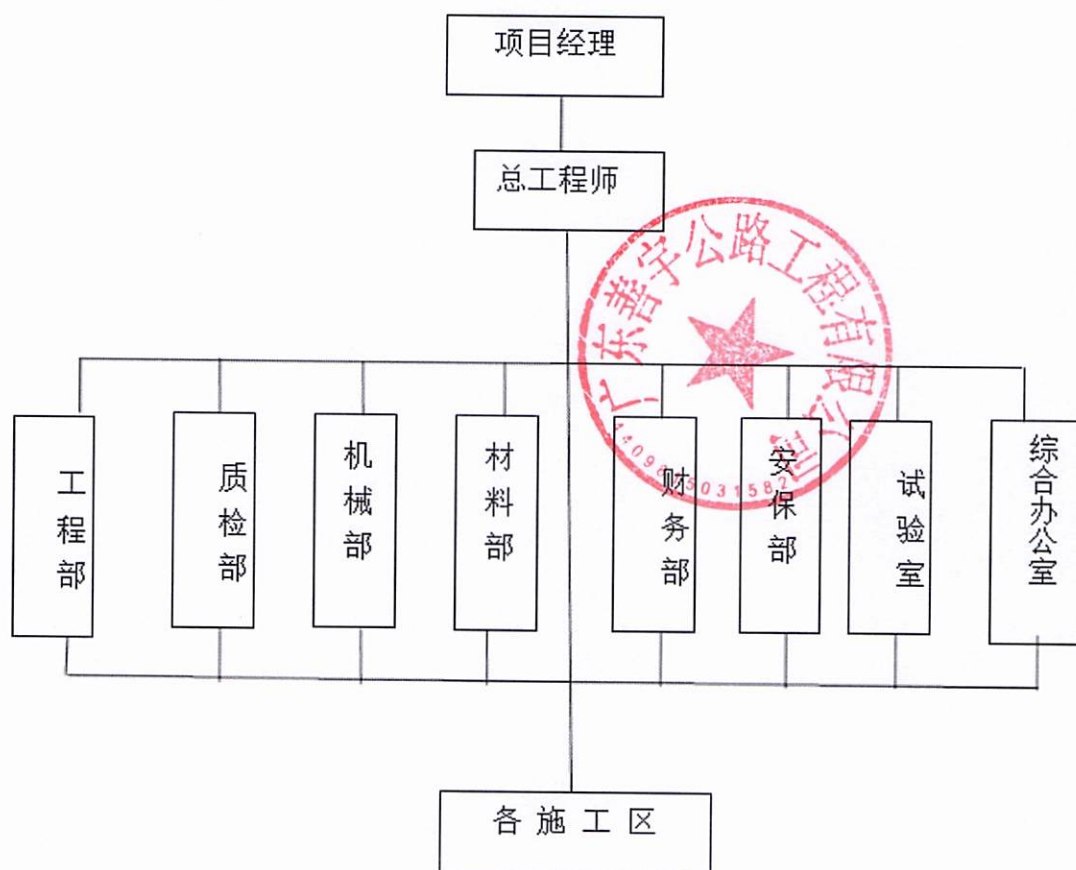

说明

一旦我方中标，将实行项目经理负责制，并按上述项目管理组织机构的配置配备足够的且有丰富施工管理经验的人员组成项目经理部，为本工程的实施服务。

七、拟分包项目情况表

拟分包的工程 项目	主要工程内容	预计造价（万元）	备注
无。	无。	无。	 注：若无分包计划， 则投标人应在本表填 写“无。”
拟分包工程造价合计（万元）		无。	

注：1、若投标人中标须按本招标文件的约定执行。

2、本表填写的造价不属于投标报价的内容。

3、如投标人不具备拟分包工程所需的某专项工程相应资质或投标人如有分包计划，应符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按本表的要求填写。

八、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

(二) 投标人企业组织机构框图

(三) 近年财务状况表

(四) 近年完成的类似项目情况表

(四)-1完成的类似项目情况表

(四)-2完成的类似项目情况汇总表

(五) 投标人的信誉情况表

(六) 拟委任的项目经理和项目总工情况表

(六)-1拟委任的项目经理和项目总工汇总表

(六)-2拟委任的项目经理和项目总工资历表



(一) 投标人基本情况表

投标人名称	广东善宇公路工程有限公司					
注册地址	高州市环城东路40号二楼（申报住所）			邮政编码	[REDACTED]	
联系方式	联系人	李晋全		电话	[REDACTED]	
	传真	[REDACTED]		电子邮件	/	
法定代表人	姓名	李火才	技术职称	高级工程师	电话	[REDACTED]
技术负责人	姓名	顾宗杰	技术职称	正高级工程师	电话	[REDACTED]
营业执照号	91441521MA53P1YA6W		员工总人数：49人			
企业资质等级	公路工程施工总承包二级、公路路基工程专业承包二级、公路路面工程专业承包二级 证号：D244758763、D344352554		其中	项目经理	12人	
注册资本	2380万元			高级职称人员	2人	
成立日期	2019年9月2日			中级职称人员	8人	
基本账户 开户银行	广东高州农村商业银行股份有限公司新区分理处			初级职称人员	14人	
基本账户 银行账号	[REDACTED]			技工	13人	
经营范围	劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;水利相关咨询服务;室内空气污染治理;水污染治理;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;市政设施管理;工程和技术研究和试验发展;文物保护工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;电力设施承装、承修、承试各类工程建设活动;施工专业作业;建设工程监理;建设工程设计;建设工程勘察;水运工程监理;住宅室内装饰装修。“无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。					

投标人关联企业情况	投标人应提供关联企业情况，包括： (1) 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数<u>10%</u>以上的所有股东名称及相应股权比例； 股东名称：高州市建总工程集团有限公司（原名为广东省高州市建筑工程总公司），出资：2380万元，出资比例100%，不是上市公司。 (2) 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； 本公司没有投资（控股）或管理的下属企业。 (3) 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 1) 高州市建总工程集团有限公司（原名为广东省高州市建筑工程总公司） 2) 广东省筑瀛水利水电建设有限公司 3) 广东巧轩建筑工程有限公司 4) 广东省高州市建筑工程总公司高城营业部 5) 高州市建总投资有限公司
备注	

注：1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

3. 上述信息如经调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。

1) 营业执照



统一社会信用代码
91441521MA53P1YA6W



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

营业执照

(副本)

名称 广东善宇公路工程有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 李火才

经营范围 劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;水利相关咨询服务;室内空气质量治理;水污染治理;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;市政设施管理;工程和技术研究和试验发展;文物保护工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动;施工专业作业;建设工程监理;建设工程设计;建设工程勘察;水运工程;住宅室内装饰装修;无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 人民币贰仟叁佰捌拾万元

成立日期 2019年09月18日

住所 高州市环城东路40号二楼(住所申报)

登记机关

2024年02月23日



市场主体应当于每年12月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

2) 资质证书



建筑业企业资质证书

证书编号: D344352554

企业名称: 广东善宇公路工程有限公司

统一社会信用代码: 91441521MA53P1YA6W

法定代表人: 李火才

注册地址: 高州市环城东路40号二楼(住所申报)

有效期: 至2030年05月27日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 公路路面工程专业承包二级
公路路基工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 茂名市住房和城乡建设局

发证日期: 2025年05月27日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypgdcic.net>



建筑业企业资质证书

证书编号: D244758763

企业名称: 广东善宇公路工程有限公司

统一社会信用代码: 91441521MA53PTYA6W

法定代表人: 李火才

注册地址: 高州市环城东路40号二楼(住所申报)

有效期: 至2030年06月05日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 公路工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年06月05日

3) 安全生产许可证

			
统一社会信用代码: 91441521MA53P1YA6W		安全生产许可证	
		编号: (粤) JZ安许证字 [2023] 008625	
企业名称	广东善宇公路工程有限公司		
法定代表人	李火才		
单位地址	广东省茂名市高州市环城东路40号二楼(住所申报)		
经济类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
许可范围	建筑施工		
有效期	2023年05月31日 至 2026年05月31日		
			
		发证机关: 广东省住房和城乡建设厅	
		发证日期: 2023年05月24日	

4) 基本存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称:

广东善宇公路工程有限公司

账户号码:

80020000010638520

开户银行:

广东高州农村商业银行股份有限公司新区分
理处

法定代表人:

李火才

(单位负责人)

基本存款账户编号:

J5922004079402

2024 年 03 月 12 日

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称 搜索

广东普宇公路工程有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 奖惩记录 信用综合评价 企业在建项目应用等级 企业资质历史 企业转移历史记录

主项资质			
资质名称	公路工程	资质等级	总甲级
资质证书号	粤级	证书编号	D244769703
发证机关	广东省住房和城乡建设厅	发证日期	2024-05-21
申报			

增项资质								
序号	资质证书号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	备注	年限
1	D244352554	公路路基工程	专业承包	贰级	广东省住房和城乡建设厅	2024-05-16		年限
2	D244352554	公路路面工程	专业承包	贰级	广东省住房和城乡建设厅	2024-05-16		年限

其他资质								
序号	资质证书号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	备注	年限

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称 搜索

广东普宇公路工程有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 奖惩记录 信用综合评价 企业在建项目应用等级 企业资质历史 企业转移历史记录

姓名: 请输入查询条件 搜索

人员信息						
序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注
1	陈永杰	男	南京航空航天大学	大专	公路与桥梁工程	
2	黄甘泉	女	北京交通大学	大专	公路工程与管理	
3	赵丽莎	女	广东省华南职业技术学校	中专	计算机及应用	
4	赵丽莎	女	国家开放大学	大专	行政管理	
5	李智全	男	南昌大学	本科	土木工程	

6) (主) 广东善宇公路工程有限公司在《国家企业信用信息公示系统》中基础信息的网页截图



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)



广东善宇公路工程有限公司

在案 (开业) 企业

该企业被列入经营异常名录, 点击查看详情

统一社会信用代码: 91441521MA53P1YA6W

注册号:

法定代表人: 李火才

登记机关: 高州市市场监督管理局

成立日期: 2019年09月02日

发送报告

信息分享

信息打印

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | [列入严重违法失信名单 \(黑名单\) 信息](#) | [公告信息](#)

营业执照信息

- 统一社会信用代码: 91441521MA53P1YA6W
- 注册号:
- 类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)
- 注册资本: 2380.000000万人民币
- 登记机关: 高州市市场监督管理局
- 住所: 高州市环城东路40号二楼 (住所申报)
- 经营范围: 劳务服务 (不含劳务派遣); 工程管理服务; 园林绿化工程施工; 城市绿化管理; 体育场地设施工程施工; 土石方工程施工; 金属门窗工程施工; 水利相关咨询服务; 室内空气污染治理; 水污染治理; 水环境污染防治服务; 大气环境污染防治服务; 市政设施管理; 工程和技术研究和试验发展; 文物保护工程施工; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建筑劳务分包; 建筑智能化系统设计; 建筑智能化工程施工; 消防设施工程施工; 电力设施安装、维修、保养; 各类工程建设活动; 施工专业作业; 建设工程监理; 建设工程设计; 建设工程勘察; 水运工程监造; 住宅室内装饰装修。^元(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

- 企业名称: 广东善宇公路工程有限公司
- 法定代表人: 李火才
- 成立日期: 2019年09月02日
- 核准日期: 2024年02月23日
- 登记状态: 在案 (开业) 企业

营业期限信息

- 营业期限自: 2019年09月02日
- 营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省高州市建筑工程总公司	企业法人	企业法人营业执照(非公司)	91440981195127158W	查看

共查询到1条记录共1页

[首页](#)
[* 上一页](#)
[1](#)
[下一页 *](#)
[末页](#)

■ 主要人员信息

共计 3 条信息

李火才 经理	官明 监事	李火才 执行董事
-----------	----------	-------------

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ “多证合一” 信息公示

提示: 该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注

暂无多证合一公示信息

共查询到0条记录共0页

[首页](#)
[* 上一页](#)
[1](#)
[下一页 *](#)
[末页](#)

■ 清算信息

暂无清算信息

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案	章程修正案	章程修正案	2024年2月23日
2	名称变更 (字号名称、集团名称等)	广东善宇建筑工程有限公司	广东善宇公路工程有限公司	2024年2月23日
3	章程备案	章程修正案	章程修正案	2023年9月20日
4	地址变更 (住所地址、经营场所、驻在地址等变更)	深圳市宝安区石岩街道龙腾社区松白路西13号东欣厂二203	高州市环城东路40号二楼 (住所申报)	2023年9月20日

共查询到4条记录共1页

[首页](#)
[* 上一页](#)
[1](#)
[下一页 *](#)
[末页](#)

广东善宇公路工程有限公司

注册(开业)企业

该企业已认缴注册资本,点击查看详情

统一社会信用代码: 91441521MA53PJYA6W

注册号:

法定代表人: 李火才

企业信息

信息分享

信息打印

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	广东省高州市建筑工程总公司
认缴额(万元)	2380
实缴额(万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	2380	2050年12月31日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

提示: 以上内容仅供参考, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zhongguo/fazigongsi/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc89550442d130947b2.html

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	茂名市长达交通建设有限公司					
注册地址	茂名市新湖四街1号大院		邮政编码			
联系方式	联系人	邓均平		电话	06	
	传真			电子邮件	/	
法定代表人	姓名	陆良	技术职称	/	电话	
技术负责人	姓名	袁钜胜	技术职称	高级工程师	电话	
营业执照号	91440900194940796X		员工总人数: 287人			
企业资质等级	公路工程施工总承包二级		其中	项目经理	28人	
注册资本	人民币肆仟肆佰玖拾玖万元			高级职称人员	25人	
成立日期	1994年02月16日			中级职称人员	45人	
基本账户 开户银行	中国建设银行股份有限公司茂名市分行			初级职称人员	88人	
基本账户 银行账号	44001690103051427679			技工	101人	
经营范围	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑材料销售；广告制作；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）					
投标人关联企业情况	投标人应提供关联企业情况，包括： (1) 投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数10%以上的所有股东名称及相应股权比例； 本公司是有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，由茂名市国有资产经营公司出资100%，不是上市公司； (2) 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；					

	无 (3) 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 无
备注	/

注：1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

3. 上述信息如经调查核实未如实填写的，按提供虚假材料对待。



1) 营业执照



营业执照

(副本 4-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码
91440900194940796X

名称 茂名市长达交通建设有限公司

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人 陆良

经营范围 许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；一般项目：土石方工程施工；建筑材料销售；广告制作；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 人民币肆仟肆佰玖拾玖万元

成立日期 1994年02月16日

住所 茂名市新湖西街7号大院

登记机关

2024 年 10 月 16 日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

2) 企业资质



建筑业企业资质证书

证书编号: D244078940

企业名称: 茂名市长达交通建设有限公司

统一社会信用代码: 91440900194940796X

法定代表人: 陆良

注册地址: 茂名市新湖四街1号大院

有效期至: 至2029年09月23日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 公路工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年03月28日



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>
广东省建设行业数据开放平台查询网址: <https://skypgdcic.net>

3) 安全生产许可证

统一社会信用代码: 91440900194940796X			
		安全生产许可证	
编号: (粤) JZ安许证字[2023]019159			
企业名称	茂名市长达交通建设有限公司	发证机关	广东省住房和城乡建设厅
法定代表人	陆良	发证日期	2024年11月14日
单位地址	茂名市新湖四街1号大院		
经济类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
许可范围	建筑施工		
有效期	2024年11月14日至2026年11月07日		



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4) 基本存款账户信息

基本存款账户信息

账户名称： 茂名市长达交通建设有限公司

账户号码： 44001690103051427679

开户银行： 中国建设银行股份有限公司茂名市分行

法定代表人： 陆良
(单位负责人)

基本存款账户编号： J5920000112706



10200111e1729503748050526

5) (成) 茂名市长达交通建设有限公司在《全国公路建设市场信用信息管理系统》公路工程施工资质企业名录中的网页截图



序号	企业名称	企业类型	企业资质	法人代表
1	茂名市长达交通建设有限公司	施工企业	公路工程(总承包)贰级 市政公用工程(总承包)贰级 建筑装饰装修工程(专业承包)贰级 房屋建筑工程(总承包)贰级 施工劳务企业资质(其他)不分等级	陆良



茂名市长达交通建设有限公司

基本信息	资质信息	人员信息	业绩信息	奖励记录	全国综合评价	企业在各地的信用等级	企业变更历史	企业转移历史记录
------	------	------	------	------	--------	------------	--------	----------

基本信息	
统一社会信用代码	91440900194940796X
企业名称	茂名市长达交通建设有限公司
注册省份	广东省
注册城市	茂名市
曾用名	
注册资金(万元)	4499
企业类型	施工
企业性质	国有企业
营业执照注册日期	2024-10-16
成立日期	1994-02-16
法定代表人	陆良
法定代表人职称	
企业负责人	陆良
企业负责人职称	
技术负责人	袁初胜
技术负责人职称	路桥高级工程师
营业范围	许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑材料销售；广告制作；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页	政策法规	工作动态	从业企业	从业人员	用户登录
----	------	------	------	------	------

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

茂名市长达交通建设有限公司

基本信息	资质信息	人员信息	业绩信息	奖励记录	全国综合评价	企业在各地的信用等级	企业变更历史	企业转移历史记录
------	------	------	------	------	--------	------------	--------	----------

主项资质			
资质名称:	公路工程	资质类型:	总承包
资质等级:	贰级	证书编号:	D244078940
发证机关:	广东省住房和城乡建设厅	发证日期:	2025-03-28
申报			

增项资质							
序号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	备注	申报
1	市政公用工程	总承包	贰级	广东省住房和城乡建设厅	2025-03-28		申报
2	建筑装修装饰工程	专业承包	贰级	茂名市住房和城乡建设局	2022-05-07		申报
3	房屋建筑工程	总承包	贰级	广东省住房和城乡建设厅	2025-03-28		申报
4	施工劳务企业资质	其他	不分等级	茂名市住房和城乡建设局	2022-07-08		申报

其他资质								
序号	资质证书编号	资质名称	资质类型	资质等级	发证机关	发证日期	备注	申报
无记录								

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页	政策法规	工作动态	从业企业	从业人员	用户登录
----	------	------	------	------	------

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

茂名市长达交通建设有限公司

基本信息	资质信息	人员信息	业绩信息	荣誉记录	金牌综合评价	企业在各地的信用等级	企业变更历史	企业转移历史记录
------	------	------	------	------	--------	------------	--------	----------

姓名: 请输入查询条件

搜索

人员信息						
序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注
1	陈亚水	男	交通部电视中等专业学校	中专	公路与桥梁	
2	李海宽	男	中央广播电视大学	本科	土木工程	
3	余永群	男	中国石化广东石油化工高等专科学校	大专	工业与民用建筑	
4	陈燕生	男	广东交通职业技术学院	大专	公路与桥梁	
5	展茂盛	男	华南理工大学	本科	公路与城市道路工程	
6	黄伟	男	大连理工大学	大专	土木工程	
7	陈瑞岳	男	南京粮食经济学院	本科	会计学	
8	林胡吉	男	国家开放大学	本科	道路与桥梁工程	
9	陈创旺	男	广东省冶金工业学校	中专	矿山测量	
10	蔡庆信	男	武汉理工大学	本科	土木工程	
11	黄文辉	男	中央广播电视大学	本科	土木工程	
12	袁炬胜	男	北京交通大学	本科	公路工程与管理	
13	张金	男	广东农垦通什中等专科学校	中专	测绘	
14	吴云	男	中央广播电视大学	大专	建筑施工与管理	
15	黎智明	男	广东交通职业技术学院	大专	公路与桥梁	

1 2 3 下一页 到第 页 确定 共37家

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

茂名市长达交通建设有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 奖惩记录 全国综合评价 企业在各地的信用等级 企业变更历史 企业转移历史记录

姓名: 请输入查询条件

搜索

人员信息							
序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注	
16	钟开金	男	广东交通职业技术学院	大专	公路与桥梁		
17	陈夏德	女	茂名学院	大专	计算机及应用		
18	李刚	男	广州市城建职工大学	大专	建筑设计		
19	叶桂超	男	华南理工大学	大专	交通管理		
20	李伟勇	男	中央广播电视大学	大专	建筑施工与管理		
21	丁嘉辉	男	广东交通职业技术学院	大专	公路与桥梁		
22	何法迎	男	中央广播电视大学	本科	土木工程		
23	赖哲	男	湛江农业专科学校	大专	农业技术师范		
24	姚博华	男	中央广播电视大学	大专	建筑施工与管理		
25	邓毅	男	中央广播电视大学	本科	土木工程		
26	陈文强	男	本溪冶金高等专科学校	大专	工程测量		
27	叶天	男	佛山大学	大专	公路与桥梁工程		
28	黄炎	男	茂名学院	本科	土木工程		
29	柯海慧	女	广东石油化工学院	大专	建筑工程管理		
30	彭国裕	男	广东广播电视大学	大专	会计学		

上一页 1 2 3 下一页 到第 页 确定 共37页

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

茂名市长达交通建设有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

荣誉记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业历史

企业转移历史记录

姓名: 请输入查询条件

搜索

人员信息

序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注
31	王士林	男	华南农业大学	本科	动物科学	
32	曾天盛	男	广东交通职业技术学院	大专	道路桥梁工程技术	
33	林华龙	男	中央广播电视大学	大专	建筑施工与管理	
34	罗富荣	男	茂名学院	大专	工业与民用建筑工程	
35	王宇强	男	东莞理工学院	本科	国际经济与贸易	
36	陈增汉	男	广州市学历委员会成人高考	高中		
37	叶世丰	男	广东技术师范学院天河学院	本科	土木工程	

上一页 1 2 3 到第 页 确定 共37条

6) (成) 茂名市长达交通建设有限公司在《国家企业信用信息公示系统》中基础信息的网页截图

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 经营异常名录 严重违法失信名单

输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

茂名市长达交通建设有限公司 存续 (在业、开业、在聘)

统一社会信用代码: 91440900194940796X
注册号:
法定代表人: 陆海
登记机关: 茂名市茂南区市场监督管理局
成立日期: 1994年02月16日

基础信息 行政许可信息 行政处罚信息 列入经营异常名录信息 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共 1 页 0 条记录 共 0 页

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息						

共 1 页 0 条记录 共 0 页

主办单位: 国家市场监督管理总局
地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 电话: 010-83218537 传真: 010-83218537
业务咨询: 12315 技术支持: 12315 网站: www.gsxt.gov.cn

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



茂名市长达交通建设有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440900194940796X

注册号:

法定代表人: 陆良

登记机关: 茂名市茂南区市场监督管理局

成立日期: 1994年02月16日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91440900194940796X

注册号:

类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 4499.000000万

登记机关: 茂名市茂南区市场监督管理局

住所: 茂名市新湖四街1号大院

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 住宅室内装饰装修; 建筑劳务分包。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 土石方工程施工; 建筑材料销售; 广告制作; 专用设备修理。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 茂名市长达交通建设有限公司

法定代表人: 陆良

成立日期: 1994年02月16日

核准日期: 2024年10月16日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

营业期限信息

营业期限自: 1994年02月16日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	茂名市国有资产经营公司	企业法人	营业执照	91440900MA4UR5X88A	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计 7 条信息

陆良
董事长

袁钜胜
董事

邓毅
职工监事

林明吉
监事

陆良
董事

叶天
董事

陆良
经理

分支机构信息

共计 4 条信息

茂名市交通建设工程总公司云南办事处

统一社会信用代码:

登记机关:

茂名市交通建设工程总公司云浮分公司

统一社会信用代码:

登记机关:

茂名市交通建设工程总公司高州工程部

统一社会信用代码:

登记机关:

茂名市交通建设工程总公司东莞分公司

统一社会信用代码:

登记机关:

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
暂无多证合一公示信息		
共查询到 0 条记录 共 0 页		
首页 * 上一页 下一页 * 末页		

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案		章程	2025年4月10日
2	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	李鸿高(董事)；陈文照(董事)；陆良(董事，经理，董事长)；董天海(监事)；邓毅(职工监事)；	李鸿高(董事)；陈文照(董事)；陆良(董事，经理，董事长)；董天海(监事)；邓毅(职工监事)；林明吉(监事)；邓毅(职工监事)...	2024年11月7日
3	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	刘杰豪	陆良	2024年10月16日
4	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	李鸿高(董事)；陈文照(董事)；刘杰豪(经理，董事长)；董天海(监事)；邓毅(职工监事)；	李鸿高(董事)；陈文照(董事)；陆良(董事，经理，董事长)；董天海(监事)；邓毅(职工监事)...	2024年10月16日
5	章程备案		章程	2022年8月1日
共查询到 17 条记录 共 4 页				
首页 * 上一页 1 2 3 4 下一页 * 末页				

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（<https://www.zhongdengwang.org.cn>）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					
共查询到 0 条记录 共 0 页					
首页 * 上一页 下一页 * 末页					

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										
共查询到 0 条记录 共 0 页										
首页 * 上一页 下一页 * 末页										

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					
共查询到 0 条记录 共 0 页					
首页 * 上一页 下一页 * 末页					

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									
共查询到 0 条记录 共 0 页									

以下信息由该企业提供。企业对其报送信息的真实性、合法性负责

■ 商标注册信息

暂无商标注册信息

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
----	--------	----	----	----

暂无抽查检查结果信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
----	--------	------	------	---------	------	---------	------

暂无产品质量监督抽查结果信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 认证监督抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称(标称)	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采信证书处理结果	证书撤销日期
----	------	-------	------	----------	------	------------	--------	---------------	--------

暂无认证监督抽查检查信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
----	------	------	---------	------	------

暂无食品抽查检查信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
----	--------	--------	--------	--------	------	------	--------	------

暂无双随机抽查结果信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型/状态	详情
----	------	------	------	---------	-------	----

暂无司法协助信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

■ 依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关	详情
----	------	------	-------	------	--------	--------	----

暂无依人民法院判决申请撤销登记信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被冻结人姓名	被冻结人身份类型	冻结日期
暂无协助冻结信息					
共查询到 0 条记录 共 0 页					

承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			
共查询到 0 条记录 共 0 页			

信用信息

序号	信用信息	信用评价	授予单位
暂无信用信息			
共查询到 0 条记录 共 0 页			

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				
共查询到 0 条记录 共 0 页				

企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2023年度报告	2024年6月14日	查看
2	2022年度报告	2023年6月27日	查看
3	2021年度报告	2022年6月8日	查看
4	2020年度报告	2021年6月11日	查看
5	2019年度报告	2020年6月5日	查看
6	2018年度报告	2019年6月9日	查看
7	2017年度报告	2018年5月30日	查看
8	2016年度报告	2017年6月15日	查看
9	2015年度报告	2016年5月24日	查看
10	2014年度报告	2015年5月27日	查看
11	2013年度报告	2014年11月19日	查看

股东及出资信息

查看修改记录>>

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细			实缴明细				
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	公示日期
茂名市国有资产经营公司	4499.0	0.0	货币	4499.0	2021年6月21日	2025年1月7日				

股东及出资详细信息		
股东信息		
股东名称	茂名市国有资产经营公司	
认缴额 (万元)	4499	
实缴额 (万元)		
认缴明细信息		
认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	4499	2020年12月31日
实缴明细信息		
实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

核准变更登记通知书

茂南核变通内字【2021】第2100131482号

名称：茂名市长达交通建设有限公司

统一社会信用代码：91440900194940796X

以上企业于二〇二一年六月二十一日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	茂名市交通建设工程总公司	茂名市长达交通建设有限公司
注册资本(万元)	3383万元人民币	4499万元人民币
企业类型	全民所有制	有限责任公司(法人独资)

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程	章程
董事会成员		陈文照, 董事; 邓毅, 监事(职工代表); 董天海, 监事; 李满高, 董事; 叶桂超, 董事, 董事长, 经理。
联络员	黄炎	林明吉

特此通知。


二〇二一年六月二十一日



(二) 投标人企业组织机构框图

(主) 广东善宇公路工程有限公司

以框图方式表示。

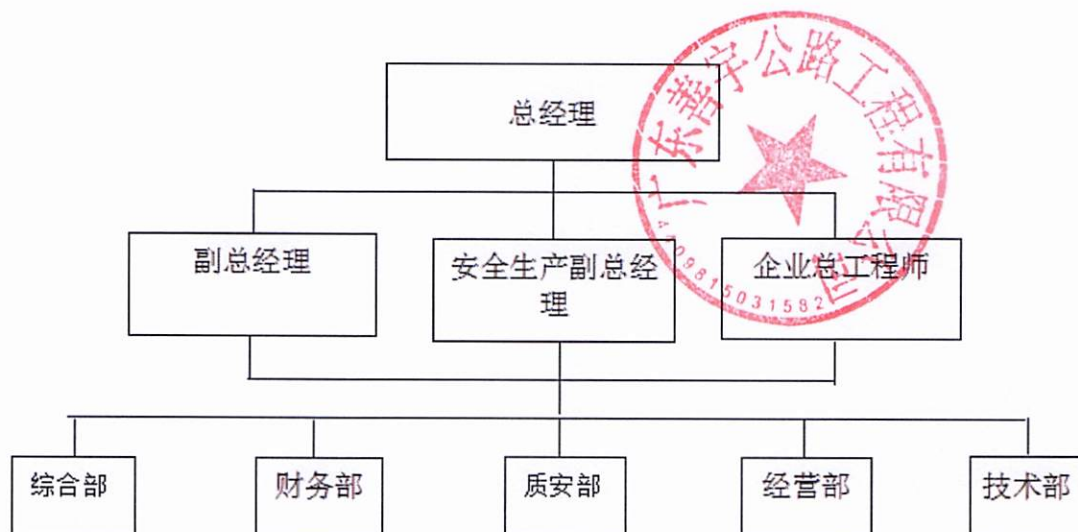

说明

广东善宇公路工程有限公司成立于2019年9月，原注册地为深圳市宝安区，于2023年8月8日由高州市建总工程集团有限公司（原企业名称为广东省高州市建筑工程总公司）全资控股，2023年9月20日注册地迁移至广东省高州市。高州建总集团是粤西地区最早的施工企业之一，成立于1950年，为地方国营正科级单位，市属一级监管企业，为高州市建筑行业龙头企业。经建设部批准为房屋建筑施工总承包壹级企业，目前同时具备市政公用工程施工总承包贰级、建筑装饰装修工程专业承包壹级。广东善宇公司具备公路工程施工总承包二级资质，公路路基工程专业承包二级资质及公路路面工程专业承包二级资质。


公司专注于公路方向的发展和创新，现聘请了一批具有中级工程师职称以上人才，以及公路专业一级、二级建造师人才一批，来充实公司技术力量。公司现有员工49人，具有专业技术职称的各类专业技术人员13人，其中高级以上职称2人，中级职称8人，持证建造师12人；注册资金2380万元。

公司人力、物力、财力均得到高州市建总工程集团有限公司全力支持，有能力承接各类公路工程业务。

(二) 投标人企业组织机构框图

(成) 茂名市长达交通建设有限公司

以框图方式表示。

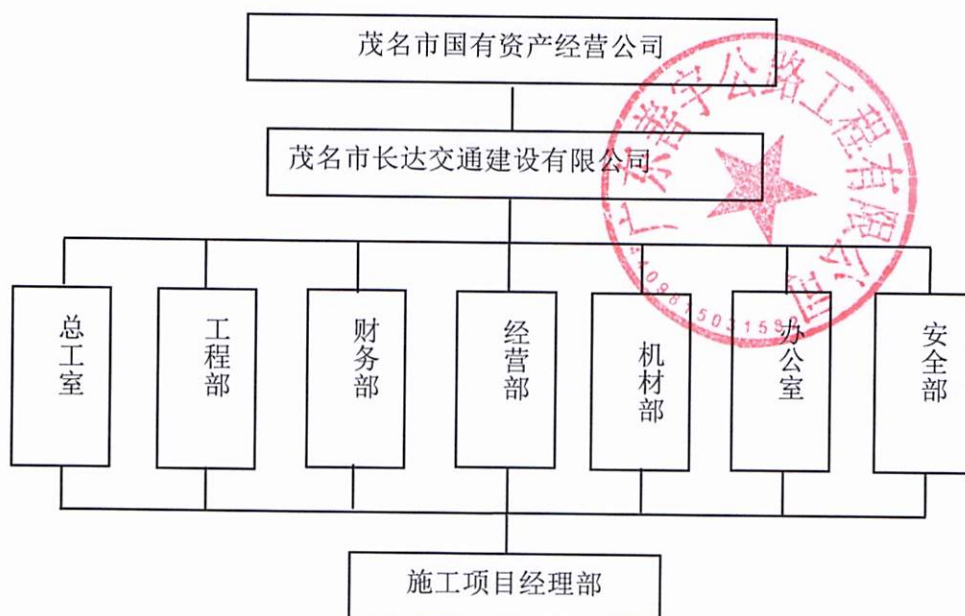

说明

本公司直接设立施工项目经理部，由总公司直接领导，直接管理，统一调配施工队的机械设备、技术人员、资金。主要负责人如下：

茂名市国有资产经营公司

主任：吕森

茂名市长达交通建设有限公司

董事长：陆良

副董事长：李满高

总工程师：袁钜胜

工程部：丁豪辉

财务部：姚博华

经营部：黄炎

机材部：黄文锋

办公室：许赛玉

安全部：邓毅

(三)近年财务状况表

(成) 茂名市长达交通建设有限公司

根据招标文件附录2的要求, (主)广东善宇公路工程有限公司, (成)茂名市长达交通建设有限公司 (联合体名称) 以联合体形式投标的, 财务最低要求以(成)茂名市长达交通建设有限公司一方为准

项目或指标	单位	2021年	2022年	2023年
一、注册资本	万元	4499	4499	4499
二、净资产	万元	9854.307	10314.3877	10948.1031
三、总资产	万元	18015.4542	17172.8471	18541.4116
四、固定资产	万元	3357.9992	3300.7296	3248.49
五、流动资产	万元	14657.455	13872.1175	15292.9251
六、流动负债	万元	8161.1471	6858.4594	7593.3085
七、负债合计	万元	8161.1471	6858.4594	7593.3085
八、营业收入	万元	42689.1791	43218.5249	45178.6201
九、净利润	万元	445.9893	460.0806	633.7154
十、现金流量净额	万元	113.6455	-447.7368	292.5053
十一、主要财务指标				
1. 净资产收益率	%	4.53	4.46	5.7883
2. 总资产报酬率	%	2.45	3.49	4.6785
3. 主营业务利润率	%	2.97	1.06	1.4026
4. 资产负债率	%	45.3	39.94	40.9532
5. 流动比率	%	179.6	202.26	201.3999
6. 速动比率	%	82.83	86.33	85.3888
近三个年度的年平均营业总收入	万元	43695.44		
最新年度具有的营运资金 (流动资产-流动负债)	万元	7699.6166		

注: 1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。2. 联合体形式投标的, 由联合体任一方填写。

全国公路建设市场监督管理系统

编辑企业财务信息

施工企业

基本信息

资质证书

人员信息

财务信息

业绩信息

业绩信息 (2025.1.1前)

业绩信息 (2025.1.1后)

资质工程师

企业资质分立申请

企业信息转移申请确认

统计年份:	2022	净资产 (万元):	10314.3877
注册资金 (万元):	4499	固定资产 (万元):	3300.7296
总资产 (万元):	17172.6471	流动负债 (万元):	6858.4594
流动资产 (万元):	13872.1175	营业收入 (万元):	43218.5249
负债合计 (万元):	6858.4594	现金流量净额 (万元):	-447.7368
净利润 (万元):	460.0806	银行授信额度 (万元):	
实收资本 (万元):	4499	上缴建筑营业税 (万元):	2592.8707
建筑业总产值 (万元):	45594.5	建筑业增加值 (万元):	2637.7962
工程结算收入 (万元):	43218.5249	公路工程总收入 (万元):	43218.5249
银行信用等级:			
主要财务指标:	1.净资产收益率 (%): 4.46		
	2.总资产报酬率 (%): 3.49		
	3.主营业务利润率 (%): 1.06		
	4.资产负债率 (%): 39.94		
	5.流动比率 (%): 202.26		
	6.速动比率 (%): 86.33		

取消

全国公路建设市场监督管理系统

编辑企业财务信息

施工企业

基本信息

资质证书

人员信息

财务信息

业绩信息

业绩信息 (2025.1.1前)

业绩信息 (2025.1.1后)

资质工程师

企业资质分立申请

企业信息转移申请确认

统计年份:	2023	净资产 (万元):	10948.1031
注册资金 (万元):	4499	固定资产 (万元):	3248.49
总资产 (万元):	18541.4116	流动负债 (万元):	7593.3085
流动资产 (万元):	15292.9215	营业收入 (万元):	45178.6201
负债合计 (万元):	7593.3085	现金流量净额 (万元):	292.5053
净利润 (万元):	633.7154	银行授信额度 (万元):	
实收资本 (万元):	4499	上缴建筑营业税 (万元):	2709.551
建筑业总产值 (万元):	47936.2571	建筑业增加值 (万元):	2757.6371
工程结算收入 (万元):	45178.6201	公路工程总收入 (万元):	45178.6201
银行信用等级:			
主要财务指标:	1.净资产收益率 (%): 5.7893		
	2.总资产报酬率 (%): 4.6785		
	3.主营业务利润率 (%): 1.4026		
	4.资产负债率 (%): 40.9532		
	5.流动比率 (%): 201.3999		
	6.速动比率 (%): 85.3888		

取消

(四)近年完成的类似项目情况表

(四)-1完成的类似项目情况表

序号	1
项目名称	茂名市区高山至公馆段一级公路新建工程(茂化快线东延线)
项目所在地	广东省茂名市
发包人名称	茂名市交通建设投资集团交通基础设施建设项目经营有限公司
发包人地址	茂名市迎宾一路53号
发包人电话	
合同价格	26983.6659万元
开工日期	2017-12-25
交工(或一次性竣工)日期	2020-12-23
承担的工作	项目施工总承包
工程质量评分(或等级)	合格
项目经理	蔡庆怡
项目总工	陈文照
总监理工程师及电话	
项目描述	本合同段主要工程量:路基挖土方22389.5m ³ ;路基填方703783.71m ³ ,其中包括利用土方9819m ³ 、回填砂性土10993.7m ³ 、借土填方566504.4m ³ 、换填土116466.61m ³ ;挖除非适用性材料33337.1m ³ ,挖淤泥92971.5m ³ ,软基处理换填石屑18892.5m ³ ,砂砾垫层32833.5m ³ ;边沟、排水沟11828.4m;急流槽435.6m;喷播草灌护坡38079.2m ² ;三维植被网护坡34472.3m ² ;C20现浇混凝土护面4834.9m ³ ;C20挡土墙混凝土1186.8m ³ ;C30挡土墙混凝土1653.3m ³ ;碎石垫层83447m ² ;3-4%水泥稳定土底基层148060.3m ² ;4-5%水泥稳定土基层141736.6m ² ;透层138377.8m ² ;水泥浆

	粘结层142129.8m ² ；沥青表处封层140966.8m ² ；水泥混凝土路面 132885.4m ² ；预制块混凝土路缘石841.5m ³ ；人行道砖保彩砖1136.8m ² ； C30现浇混凝土护栏1510.32m ³ ；波形梁钢护栏9259m，其中Gr-A-4E： 8031m、BT-2-1：264m、AT1-2：616m、AT2：348m；标志牌87个；示警桩 170个；公路界碑52个；反光型标线9239m ² ；振动型标线4322m ² ；太阳能 反光突起路标1351个；轮廓标726个；公交站台6套；撒播草种43982m ² ； 大叶油草21956m ² ；菩提榕774棵；海桐球105株；大红花774株；红背桂（ 25袋/m ² ）2644m ² ；黄金榕（25株/m ² ）996m ² ；各类交通信号灯91套；照 明路灯134套。大桥1160米/4座；中桥232.6米/3座；圆管涵32道，箱涵5 道，盖板涵12道；本合同段交工桩号为K0+000~K5+119.55。
备注	/

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。3.
 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

[首页](#)
[政策法规](#)
[工作动态](#)
[从业企业](#)
[从业人员](#)
[用户登录](#)

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

茂名市长达交通建设有限公司

[基本信息](#)
[资质信息](#)
[人员信息](#)
[业绩信息](#)
[奖项记录](#)
[全国综合评价](#)
[企业在各地的信用等级](#)
[企业资质历史](#)
[企业转移历史记录](#)

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且完工时间在5年之前的业绩。

项目名称：茂化快线东延线

业绩所在省份：--请选择省份--

搜索

序号	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	结算价 (万元)	开工日期	完工日期	录入日期	业绩所在省份	信息来源	备注
1	茂名市区高山至公馆段一级公路新建工程 (茂化快线东延线)	第1标段	26983.6659		2017-12-25	2020-12-23	2021-07-13	广东省	省厅审核	

相关链接

[北京市](#)
[天津市](#)
[河北省](#)
[山西省](#)
[内蒙古自治区](#)
[辽宁省](#)

[吉林省](#)
[黑龙江省](#)
[上海市](#)
[江苏省](#)
[浙江省](#)
[安徽省](#)

[福建省](#)
[江西省](#)
[山东省](#)
[河南省](#)
[湖北省](#)
[湖南省](#)

[广东省](#)
[广西壮族自治区](#)
[海南省](#)
[重庆市](#)
[四川省](#)
[贵州省](#)

[云南省](#)
[西藏自治区](#)
[陕西省](#)
[甘肃省](#)
[青海省](#)
[宁夏回族自治区](#)

[附件下载](#)
[联系我们](#)

[政府网站](#)
[找错](#)

全国公路建设市场监督管理系统

(四)近年完成的类似项目情况表

(四)-1完成的类似项目情况表

序号	2
项目名称	省道S279线郁南大湾将军岭至罗定屏风山段路面改造工程
项目所在地	广东省
发包人名称	罗定市地方公路管理站
发包人地址	广东省罗定市罗城街泮江路63号
发包人电话	
合同价格	3213.1629万元
开工日期	2020-4-28
交工（或一次性竣工）日期	2023-11-3
承担的工作	省道S279线郁南大湾将军岭至罗定屏风山段路面改造工程全部施工内容
工程质量评分（或等级）	合格
项目经理	蔡庆怡
项目总工	丁豪辉
总监理工程师及电话	
项目描述	1、C25排水沟:1882.78m ³ ，2、C20挡土墙:2557.65m ³ ，3、C20片石挡土墙:3138.5m ³ ，4、路面碎石垫层:37208.4m ² :5、路面素砼基层:40091.95m ² ，6、沥青混凝土路面:64441.05m ² ;7、水泥混凝土路面:41328.35m ² ;8、盖板涵加长，9、波形钢护栏:2232m;10、交通标志牌，11、通标线:6444m ² ;12、示警桩:154根等。工程实际完成工程量以合同最终施工结算审核为准
备注	二级沥青混凝土、水泥混凝土路面/15.971km

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

茂名市长达交通建设有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 奖惩记录 全国综合评价 企业在建项目信息 企业变更历史 企业转移历史记录

2025.1.1后录入业绩 2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且完工时间在5年之前的业绩。

项目名称： 省道S279线郁南大湾将军岭至罗定麻凤山段路面改造工程 业绩所在省份： --请选择省份-- 搜索

序号	项目名称	标段名称	合同金额 (万元)	结算价 (万元)	开工日期	完工日期	录入日期	业绩所在省份	信息来源	备注
1	省道S279线郁南大湾将军岭至罗定麻凤山段路面改造工程	不分标段	3213.1629		2020-04-28	2023-11-03	2024-02-26	广东省	省厅审核	

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区

附件下载 联系我们

政府网站 找错

全国公路建设市场监督管理系统

企业名称	茂名市长途交通建设有限公司			
工程名称	省道S279线那大至那坡至那坡段及山段路面改造工程			
合同价 (万元)	3213.1629	项目类型	其他工程	
技术等级	二级公路	合同段名称	不分标段	
开工日期	2020-04-28	完工日期	2023-11-03	
竣工日期		建设状态	总包已建	
合同段开始桩号	K117+706	合同段结束桩号	K133+677	
质量评定情况	合格	所在省份	广东省	
项目代码				
主要工程量	1. C25混凝土: 1882.78m ³ ; 2. C20片石混凝土: 2557.65m ³ ; 3. C20片石混凝土: 3139.5m ³ ; 4. 路面碎石垫层: 37208.4m ² ; 5. 路面碎石垫层: 40091.95m ² ; 6. 路面碎石垫层: 64441.05m ² ; 7. 水泥混凝土路面: 41328.35m ² ; 8. 水泥混凝土路面: 2232m; 9. 水泥混凝土路面: 2232m; 10. 水泥混凝土路面: 2232m; 11. 交通标志: 6444m ² ; 12. 防撞柱: 154根等, 工程量和完成工程量以合同附件工程量清单为准。			

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	陈瑞生	项目经理人	2020-04-28-2023-11-03
2	廖伟	工程部门负责人	2020-04-28-2023-11-03
3	韩庆治	项目助理	2020-04-28-2023-11-03
4	丁德辉	项目总工	2020-04-28-2023-11-03
5	黄文雄	安全负责人	2020-04-28-2023-11-03



车版



(四)近年完成的类似项目情况表

(四)-1完成的类似项目情况表

序号	3
项目名称	省道松仙线(S283线)高州市路段改建工程(二期工程)
项目所在地	广东省高州市
发包人名称	高州市公路事务中心
发包人地址	高凉东路638-1号
发包人电话	
合同价格	3235.0074万元
开工日期	2014-10-01
交工(或一次性竣工)日期	2021-6-29
承担的工作	项目施工总承包
工程质量评分(或等级)	合格
项目经理	袁钜胜
项目总工	张金
总监理工程师及电话	
项目描述	本合同段主要工程量:挖除旧路面52.5m ² ,挖除不等厚的稳定土基层118m ² ;挖方路基81964m ³ ;坡面排水:浆砌片石边沟1960m ³ ,浆砌片石排水沟2391m ³ ,路基排水管直径为500mm以内的94m;护坡、护面墙:喷播草灌护坡586.6m ² ,三维植被网护坡14846.6m ² ,铺(植)草皮19171m ² ;浆砌片(块)石档土墙24.89m ³ ;C20片石混凝土档土墙2345.2m ³ ;18mm底基层57378.6m ² ;水泥稳定碎石基层(18mm厚)82758.7m ² ;贫水泥混凝土基层厚18mm1025.53m ² ;透层83728.8m ² ,沥青表面处治厚20~30mm1333.8m ² ;普通水泥混凝土面板:厚200mm以内面板205m ² ,厚280~290mm面板混凝土78397.8m ² ;培土路肩1012.92m ³ ;预制C25混凝土路缘石:403.4m ³ ;土路肩铺草皮2311.8m ² ;护栏:

	C30现浇混凝土1840.4m ³ ，路侧单面波形梁钢护栏2476m。交安工程：道路标志标牌：24个；道路交通标线：4075.5m ² ；轮廓标：220个。绿化开挖并铺设表土31m ³ ；人工种植灌木（黄金榕）782株；小桥30.04米/1座；涵洞15道。
备注	

注：1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在本表后附相关证明材料。3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。



全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页	政策法规	工作动态	从业企业	从业人员	用户登录
----	------	------	------	------	------

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

茂名市长达交通建设有限公司

基本信息	资质信息	人员信息	业绩信息	奖惩记录	全国综合评价	企业在当地经营情况	企业变更历史	企业转移历史记录
------	------	------	------	------	--------	-----------	--------	----------

2025.1.1后录入业绩

2025.1.1前录入业绩

系统自动审核的业绩包含以下两种情况：1、企业在2010.10.1之前录入的业绩；2、企业在2010.10.1至2013.1.1之间录入的，且完工时间在5年之内的业绩。

项目名称：省道松仙线

业绩所在省份：--请选择省份--

搜索

序号	项目名称	标段名称	合同金额(万元)	结算价(万元)	开工日期	完工日期	录入日期	业绩所在省份	信息来源	备注
1	省道松仙线(S283线)高州市路段改建工程(二期工程)	第二合同段	3235.0074		2014-10-01	2021-06-29	2022-05-23	广东省	省厅审核	

相关链接

北京市	天津市	河北省	山西省	内蒙古自治区	辽宁省
吉林省	黑龙江省	上海市	江苏省	浙江省	安徽省
福建省	江西省	山东省	河南省	湖北省	湖南省
广东省	广西壮族自治区	海南省	重庆市	四川省	贵州省
云南省	西藏自治区	陕西省	甘肃省	青海省	宁夏回族自治区

附件下载

联系我们

政府网站
找错

全国公路建设市场监督管理系统

(四)-2完成的类似项目情况汇总表

序号	项目名称	路基桥涵 里程 (km)	路面类型 及里程 (km)	大桥 (座)	特大桥 (座)	长隧 道 (座)	特 长 隧 道 (座)	...	备注
1	茂名市区高山至公馆段一级公路新建工程(茂化快线东延线)	5.11955	沥青混凝土、水泥混凝土路面 /5.11955	/	/	/	/	/	/
2	省道S279线郁南大湾将军岭至罗定屏风山段路面改造工程	15.971	沥青混凝土、水泥混凝土路面 /15.971	/	/	/	/	/	/
3	省道松仙线(S283线)高州市路段改建工程(二期工程)	3.7	沥青混凝土、水泥混凝土路面/3.7	/	/	/	/	/	/
4									
5									
6									
7									
...									
业绩合计		24.79055	24.79055	/	/	/	/	/	/

注：业绩要求应符合投标人须知前附表3.5.3、10.6及10.7款的要求。

(五) 投标人的信誉情况表


项目	投标人情况说明
(1) 在最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级被评为D级；初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中被评为D级；	(主) 广东善宇公路工程有限公司在最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级没有被评为D级；且在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中没有被评为D级。
(2) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；	(主) 广东善宇公路工程有限公司没有被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内
(3) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；	(主) 广东善宇公路工程有限公司没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书
(4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；	(主) 广东善宇公路工程有限公司没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形
(5) 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；	(主) 广东善宇公路工程有限公司没有在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单
(6) 在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；	(主) 广东善宇公路工程有限公司没有在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单
(7) 投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的（以投标人投标函中的承诺为准）；	(主) 广东善宇公路工程有限公司及本公司法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内没有行贿犯罪的行为（以投标函中的承诺为准）
(8) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	(主) 广东善宇公路工程有限公司没有法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形
(9) 第1.4.4条款号：在本项目投标期间被茂名市交通运输局或高州市交通运输局明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。	(主) 广东善宇公路工程有限公司没有在本项目投标期间被茂名市交通运输局或高州市交通运输局明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。

注：1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”第1.4.4条款号中的各项规定，逐条说明其信誉情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

（主）广东善宇公路工程有限公司无最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）




广东善宇公路工程有限公司

基本信息	资质信息	人员信息	业绩信息	诚信记录	信用综合评价	企业在各地的信用等级	企业变更历史	企业转移历史记录
------	------	------	------	------	--------	------------	--------	----------

评价年度: 2023

企业信用等级					
序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
无记录					



广东善宇公路工程有限公司

基本信息	资质信息	人员信息	业绩信息	诚信记录	信用综合评价	企业在各地的信用等级	企业变更历史	企业转移历史记录
------	------	------	------	------	--------	------------	--------	----------

评价年度: 2024

企业信用等级					
序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
无记录					



广东善宇公路工程有限公司

基本信息	资质信息	人员信息	业绩信息	诚信记录	全国综合评价	企业在各地的信用等级	企业变更历史	企业转移历史记录
------	------	------	------	------	--------	------------	--------	----------

评价年度: 2023

企业信用等级				
序号	评价省份	评价年份	等级	来源
无记录				

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省

附件下载 联系我们 政府网站 找错



广东善宇公路工程有限公司

基本信息	资质信息	人员信息	业绩信息	诚信记录	全国综合评价	企业在各地的信用等级	企业变更历史	企业转移历史记录
------	------	------	------	------	--------	------------	--------	----------

评价年度: 2024

企业信用等级				
序号	评价省份	评价年份	等级	来源
无记录				

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省

附件下载 联系我们 政府网站 找错



广东善宇公路工程有限公司

在营(开业)企业

该企业被列入经营异常名录, 点击查看详情

统一社会信用代码: 91441521MA53P1YA6W

注册号:

法定代表人: 李火才

登记机关: 揭州市市场监督管理局

成立日期: 2019年09月02日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
----	----	-------------------	------	------------	-------------------	------	------------

暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息

共查到0条记录共0页

上一页 下一页

欢迎来到信用中国

通知公告 | 网站声明



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 信息公示 > 严重违法失信主体名单查询

严重违法失信主体名单查询

广东善宇公路工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 广东善宇公路工程有限公司

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

广东善宇公路工程有限公司

存续

统一社会信用代码：91441521MA53P1YA6W

重要提示：

- 1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉流程提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
- 2.本查询结果仅依据数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
- 3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
- 4.因数据有限，单条数据仅按最新程度展示前10000条信息。

[异议申诉](#)
[下载信用信息报告](#)

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	李火才	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2019-09-02	住所	高州市环城东路40号二楼(住所申报)



行政管理



诚实守信



严重失信



经营异常



信用承诺



信用评价



司法判决



其他



很抱歉，没有找到您搜索的数据



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑时	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远融国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远融国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****9771
河池市弘农加油站	9145120159****9771

查询条件

被执行人姓名/名称: 广东善宇公路工程有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91441521MA53P1YA6W

省份: -----全部-----

验证码: LnCF

LnCF

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91441521MA53P1YA6W 广东善宇公路工程有限公司相关的结果。

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码: 

查询结果

在全国范围内没有找到 91441521MA53P1YA6W 广东普宇公路工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会公开。《全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台》(以下简称“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”)正式上线,社会各界通过该平台可查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明。

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将失信信息通报给失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将依据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保费购买保险理财产品;(九)乘坐G字头动车组列车全部席位、其他动车组列车一等以上席位等特殊席位等非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因消费导致个人财产被执行的除外,可以依法执行其财产。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有异议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对查询内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日


(五) 投标人的信誉情况表

项目	投标人情况说明
(1) 在最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级被评为D级；初次进入广东省的投标人，在最新年度的全国公路从业单位（施工单位）信用评价结果中被评为D级；	(成) 茂名市长达交通建设有限公司在最新年度广东省公路工程从业单位(施工单位)信用评价(含无最新年度而上一年度有信用评价)中，信用等级没有被被评为D级；且在最新年度的全国公路从业单位(施工单位)信用评价结果中没有被评为D级
(2) 被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；	(成) 茂名市长达交通建设有限公司没有被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内
(3) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；	(成) 茂名市长达交通建设有限公司没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
(4) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；	(成) 茂名市长达交通建设有限公司没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
(5) 在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单；	(成) 茂名市长达交通建设有限公司在国家企业信用信息公示系统中没有被列入严重违法失信企业名单；
(6) 在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；	(成) 茂名市长达交通建设有限公司在“信用中国”网站中没有被列入失信被执行人名单；
(7) 投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的（以投标人投标函中的承诺为准）；	(成) 茂名市长达交通建设有限公司及本公司法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内没有行贿犯罪行为（以在我方投标函中的承诺为准）
(8) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。	(成) 茂名市长达交通建设有限公司不存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
(9) 第1.4.4条款号：在本项目投标期间被茂名市交通运输局或高州市交通运输局明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。	(成) 茂名市长达交通建设有限公司没有在本项目投标期间被茂名市交通运输局或高州市交通运输局明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内。

注：1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录4和“投标人须知”第1.4.4条款号中的各项规定，逐条说明其信誉情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。

3. 以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。



茂名市长达交通建设有限公司

基本信息	资质信息	人员信息	业绩信息	诚信记录	全国综合评价	企业在各地的信用等级	企业变更记录	企业转移历史记录
------	------	------	------	------	--------	------------	--------	----------

评价年度: 2023


企业信用等级					
序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
无记录					

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团



全国公路建设市场监管系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部



茂名市长达交通建设有限公司

基本信息	资质信息	人员信息	业绩信息	诚信记录	全国综合评价	企业在各地的信用等级	企业变更记录	企业转移历史记录
------	------	------	------	------	--------	------------	--------	----------

评价年度: 2024

企业信用等级					
序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
无记录					

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团



全国公路建设市场监管系统
Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

[首页](#)
[政策法规](#)
[工作动态](#)
[从业企业](#)
[从业人员](#)
[用户登录](#)

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

茂名市长达交通建设有限公司

[基本信息](#)
[资质信息](#)
[人员信息](#)
[业绩信息](#)
[奖惩记录](#)
[全国综合评价](#)
[企业在场的信用等级](#)
[企业变更记录](#)
[企业诚信历史记录](#)

评价年度: 2023

企业信用等级				
序号	评价编号	评价年份	等级	举报
无记录				

相关链接

[北京市](#)
[天津市](#)
[河北省](#)
[山西省](#)
[内蒙古自治区](#)
[辽宁省](#)
[吉林省](#)
[黑龙江省](#)
[上海市](#)
[江苏省](#)
[浙江省](#)

[附件下载](#)
[联系我们](#)
[政府网站 找错](#)

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

[首页](#)
[政策法规](#)
[工作动态](#)
[从业企业](#)
[从业人员](#)
[用户登录](#)

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

茂名市长达交通建设有限公司

[基本信息](#)
[资质信息](#)
[人员信息](#)
[业绩信息](#)
[奖惩记录](#)
[全国综合评价](#)
[企业在场的信用等级](#)
[企业变更记录](#)
[企业诚信历史记录](#)

评价年度: 2024

企业信用等级				
序号	评价编号	评价年份	等级	举报
无记录				

相关链接

[北京市](#)
[天津市](#)
[河北省](#)
[山西省](#)
[内蒙古自治区](#)
[辽宁省](#)
[吉林省](#)
[黑龙江省](#)
[上海市](#)
[江苏省](#)
[浙江省](#)

[附件下载](#)
[联系我们](#)
[政府网站 找错](#)

全国公路建设市场监督管理系统
 Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部

123

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要查询的单位名称

搜索

茂名市长达交通建设有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

诚信信息

处罚记录

信用综合评价

企业在建项目应用情况

企业变更记录

企业基础信息记录

评价年度: 请选择

企业信用等级

序号	评价年份	信用等级	评价结果
1	2016	AA	AA
2	2017	AA	AA
3	2016	AA	AA
4	2015	AA	AA
5	2014	AA	AA
6	2014	B	AA
7	2013	B	AA
8	2013	A	AA
9	2012	A	AA
10	2010	B	AA

相关链接

[首页](#)
[企业信息填报](#)
[信息公告](#)
[重点领域企业](#)
[导航](#)
15218...

国家企业信用信息公示系统
 National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信息填报](#)
[经营异常名录](#)
[严重违法失信名单](#)

茂名市长达交通建设有限公司 [查看\(开业\)企业](#)

统一社会信用代码: 91440900194940796X
 注册号:
 法定代表人: 刘玉豪
 登记机关: 茂名市茂南区市场监督管理局
 成立日期: 1994年02月16日

[发送消息](#)
[信息分享](#)
[信息打印](#)

[基础信息](#)
[行政许可信息](#)
[行政处罚信息](#)
[列入经营异常名录信息](#)
[列入严重违法失信名单\(黑名单\)信息](#)
[公告信息](#)

■ 列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(人)	移出严重违法失信名单(黑名单)日期	移出日期	作出决定机关(人)
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息							

共查到0条记录 共0页

信用中国
 WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

[信用信息](#)
[统一社会信用代码](#)
[站内文章](#)

茂名市长达交通建设有限公司

[首页](#)
[信用动态](#)
[政策法规](#)
[信息公示](#)
[信用服务](#)
[信用研究](#)
[诚信文化](#)

[信用承诺](#)
[信易+](#)
[联合奖惩](#)
[个人信用](#)
[行业信用](#)
[城市信用](#)
[网站导航](#)

您所在的位置: [首页](#) > [信用信息查询](#) > [失信被执行人](#)

筛选

类型: 不限 [失信被执行人](#) [经营异常名录](#) [税收违法黑名单](#)

提示: 如对搜索结果有异议, 可通过 [异议申诉系统](#) 进行申诉。

很抱歉, 没有找到您搜索的数据

历史记录

茂名市长达交通建设有限公司
 [清空](#)

相关文章

官方严惩涉医犯罪: 行为异常患者由保卫人员陪诊
 国家旅游局曝光10起不合理低价游案例
 中国人民银行: 调控显成效 房地产信贷增长势头回落
 认证人员: 以行业公信力助力质量提升
 工商总局出台《国家企业信用信息公示系统使用运行管理办法(试行)》
 诚信应当成为矿产勘查市场的底线





信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 * 茂名市长达交通建设有限公司

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

茂名市长达交通建设有限公司

存续

守信激励对象

统一社会信用代码: 91440900194940796X

重要提示:

1. 如认为所公示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的, 可依法申请行政复议或提起行政诉讼; 如需对相关行政处罚信息进行信用修复, 可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。
2. 本查询结果仅反映有数据公示相关信息, 供社会参考使用。使用相关信息的单位, 应对信息使用行为的合法性负责。
3. "信用中国"网站公示信息与认定单位公示信息不一致的, 以认定单位相关公示信息为准。
4. 因篇幅有限, 单类数据仅按当前流程展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人

陆良

企业类型

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期

1994-02-16

住所

茂名市新城四街1号大院



行政管理



诚实守信



严重失信



经营正常



信用承诺



信用评价



司法判决



其他



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
丁朝凤	5102321969****6327
管金胜	1326231964****2015
李红林	4209821978****1448
林建康	5111241977****2617
蒋莎清	3326261966****0017
韦露宁	4527011961****1325

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
上海远利融资租赁有限公司	RU210241-3
浙江普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****9771
河池市弘农加油站	9145120159****9771
北京远翰国际教育咨询有限公司	55140080-1
上海星物钢铁有限公司	75955905-3

查询条件

被执行人姓名/名称: 茂名市长达交通建设有限公司

身份证号码/组织机构代码: 91440900194940796X

省份: 全部

验证码: zk5w

查询结果

在全国范围内没有找到 91440900194940796X 茂名市长达交通建设有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自觉履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会公开“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各主体可通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并符合《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依法、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

国家机关工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人,执行法院将依据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定,对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保费购买保险理财产品;(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的,被采取限制消费措施后,被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的,可以向执行法院提出书面申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的,可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考,如有争议,以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的,人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息,不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的,由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息属免费信息,严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站,未经许可,任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接,不得建立本网站的镜像(包括全部和局部镜像),不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该页面内容有异议,请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址:北京市东城区东交民巷27号 邮编:100745 总机:010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

(六) 拟委任的项目经理和项目总工情况表

(六)-1拟委任的项目经理和项目总工汇总表

姓名	年龄	拟在本项目中担任的职务	技术职称	建造师类别及注册号	累计对应岗位的工作年限(月)	备注
何法迎	54岁	项目经理	工程师	公路工程 级建造师 粤1442017 201742083	395	/
袁钜胜	54岁	项目总工	高级工程师	/	384	/
/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/

(六)-2拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	何法迎	年龄	54岁	专业	土木工程
技术职称	工程师	学历	本科	拟在本标段工程任职	项目经理
工作年限	33年			类似施工经验年限	33年
毕业学校	2011年7月毕业于中央广播电视大学学校土木工程专业，学制两年				
经历					
时间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	发包人及联系电话
2016. 2. 2- 2019. 4. 22	化州市城西(环城)公路改造工程(第一标段)			项目经理	化州市地方公路建设管理处, 0668-7370880
2011. 1. 25- 2014. 11. 05	顿梭至连界公路顿梭至镇江段路面大修工程			项目副经理	高州市地方公路建设管理处0668-6672076
2014. 10. 19- 2016. 2. 1	建设遂溪县Y699线榄罗湾至官湖村委会公路路面大修工程项目			项目经理	遂溪县交通局地方公路管理站0759-7763306
获奖情况		/			
本人 <u>何法迎</u> (亲笔签字) 知晓自己为本项目的项目经理(填写项目经理或项目总工), 并对其真实性负责。					
备注		/			

注: 1. 本表后应填写项目经理和项目总工相关情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

姓名 何法迎
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 5 月 19 日
住址 广东省茂名市茂南区福华
直一巷 18 号大院2号701
房
公民身份号码 [REDACTED]



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 茂名市公安局茂南分局
有效期限 2006.11.29-2026.11.29

中央广播电视大学

毕业证书



(无中央广播电视大学钢印无效)

批准文号:
注册证号:



学生 何法迪 , 性别 男 ,
生于一九七一年五月十九日, 于
二〇一一年七月在本校修完二年制
(专科起点)本科土木工程

专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格,

准予毕业。



校长:

何书坚

学校:



年 七 月

J001514133

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn



使用有效期: 2025年03月27日
- 2028年03月25日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓 名: 何法迎

性 别: 男

出生日期: 1971年05月19日

注册编号: 粤1442017201742083



聘用企业: 茂名市长达交通建设有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2025-03-26至2028-03-25)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

何法迎

个人签名: 何法迎

签名日期: 2025年3月27日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期: 2025年03月27日





公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：何法迎

身份证号：4

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：茂名市长达交通建设有限公司

证书编号：

有效期至：2027年10月17日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2009年10月19日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制



粤中取证字第 0800102461736 号

何法迎 于二〇〇七年

十二月，经 茂名市路桥工
程中级专业技术资格

评审委员会评审通过，

具备 路桥工程师

资格。特发此证



发证机关：茂名市人事局

二〇〇七年 十二月三十日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：何法迎

证件号码：

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	19940101	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	19980301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	19980301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202412	111000023565	4492	673.8	0	359.36	2650	21.2	5.3	23.85	
202501	111000023565	4492	718.72	0	359.36	2650	21.2	5.3	23.85	
202502	111000023565	4492	718.72	0	359.36	2650	21.2	5.3	23.85	
202503	111000023565	4492	718.72	0	359.36	2650	21.2	5.3	23.85	
202504	111000023565	4492	718.72	0	359.36	2650	21.2	5.3	23.85	
202505	111000023565	4492	718.72	0	359.36	2650	21.2	5.3	23.85	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

111000023565: 茂名市: 茂名市长达交通建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在茂名市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-12-09，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期: 2025年06月12日

人员信息截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

[首页](#)
[政策法规](#)
[工作动态](#)
[从业企业](#)
[从业人员](#)
[用户登录](#)

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

[基本信息](#)
[资质信息](#)
[人员信息](#)
[业绩信息](#)
[奖惩记录](#)
[全国综合评价](#)
[企业在地的信用等级](#)
[企业变更历史](#)
[企业信用信息记录](#)

姓名: 请输入查询条件

序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业	备注
16	钟开金	男	广东交通职业技术学院	大专	公路与桥梁	
17	陈露露	女	茂名学院	大专	计算机及应用	
18	李刚	男	广州市城建职工大学	大专	建筑设计	
19	叶桂超	男	华南理工大学	大专	交通管理	
20	李伟勇	男	中央广播电视大学	大专	建筑施工与管理	
21	丁露辉	男	广东交通职业技术学院	大专	公路与桥梁	
22	何法迎	男	中央广播电视大学	本科	土木工程	
23	赖振	男	湛江农业专科学校	大专	农业技术师范	
24	姚博华	男	中央广播电视大学	大专	建筑施工与管理	
25	邓毅	男	中央广播电视大学	本科	土木工程	
26	陈文丽	男	本溪冶金高等专科学校	大专	工程测量	
27	叶天	男	佛山大学	大专	公路与桥梁工程	
28	黄炎	男	茂名学院	本科	土木工程	
29	柯连慧	女	广东石油化工学院	大专	建筑工程管理	
30	彭国铭	男	广东广播电视大学	大专	会计学	

[上一页](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[下一页](#)
[刷新](#)
[页](#)
[确定](#)
共37条

相关链接

北京市

天津市

河北省

山西省

内蒙古自治区

辽宁省

吉林省

黑龙江省

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

河南省

湖北省

湖南省

广东省

广西壮族自治区

海南省

重庆市

四川省

贵州省

云南省

西藏自治区

陕西省

甘肃省

青海省

宁夏回族自治区

新疆维吾尔自治区

新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站 找错

全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部

职称信息截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	何法迎	毕业院校	广东广播电视大学
性别	男	所学专业	土木工程
学历	本科	开始工作时间	1992-07-11

申报

职称信息	执业资格信息	履历信息	个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)		
序号	职称	证书编号	职称专业	核发机关	核发日期	单位
1	工程师	粤中职称字第0800102461736号	路桥	茂名市人事局	2007412-30	肇庆

相关链接

北京市

天津市

河北省

山西省

内蒙古自治区

辽宁省

吉林省

黑龙江省

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

河南省

湖北省

湖南省

广东省

广西壮族自治区

海南省

重庆市

四川省

贵州省

云南省

西藏自治区

陕西省

甘肃省

青海省

宁夏回族自治区

新疆维吾尔自治区

新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站
找错

全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部

138

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

基本信息

姓名

同法迎

性别

男

学历

本科

毕业院校

中央广播电视大学

所学专业

土木工程

开始工作年份

1992-07-11

申报

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)		个人业绩 (2025.1.1之后录入)	
序号	注册类别	注册等级	发证机关	证书编号	发证日期	注册有效期至	申报		
1	注册建造师	公路工程一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	粤1442017201742063	2025-03-26	2029-03-25	申报		
2	安全员	B类	广东省交通运输厅	粤交安B09G30165	2009-10-19	2027-10-17	申报		
3	注册建造师	市政公用工程二级	广东省住房和城乡建设厅	粤2442007200803989	2024-04-25	2027-04-24	申报		
4	安全员	B类	广东省住房和城乡建设厅	粤建安B (2005) 0005509	2005-08-01	2026-07-31	申报		
5	注册建造师	公路工程一级	中华人民共和国住房和城乡建设部	粤1442017201742063	2022-06-02	2025-06-01	申报		
6	安全员	B类	广东省交通运输厅	粤交安B (09) G30165	2009-10-19	2024-10-17	申报		

履历信息截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名

何法迎

性别

男

学历

本科

毕业学校

中央广播电视大学

所学专业

土木工程

开始工作年份

1992-07-15

举报

职位信息

执业资格信息

履职信息

个人业绩 (2025.1.1之前录入)

个人业绩 (2025.1.1之后录入)

序号	公司名称	职务类型	职务	任职状态	入职时间	离岗时间	举报
1	茂名市长达交通建设有限公司	其他		在职			举报

相关链接

北京市

天津市

河北省

山西省

内蒙古自治区

辽宁省

吉林省

黑龙江省

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

河南省

湖北省

湖南省

广东省

广西壮族自治区

海南省

重庆市

四川省

贵州省

云南省

西藏自治区

陕西省

甘肃省

青海省

宁夏回族自治区

新疆维吾尔自治区

新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站 找错

全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2022 中华人民共和国交通运输部

个人业绩信息截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要查询的人员姓名

搜索

基本信息

姓名

何建超

性别

男

学历

本科

毕业院校

中央广播电视大学

所学专业

土木工程

开始工作年份

1992-07-11

申报

业绩信息

执业资格信息

履历信息

个人业绩 (2025.1.1之前录入)

个人业绩 (2025.1.1之后录入)

序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在网起始日期	在网截止日期	申报
1	肇庆至连界公路肇庆至连界段路面大修工程	肇庆至连界段	茂名市长达交通建设有限公司	项目副经理		2011-01-25	2014-11-05	申报
2	建设连界至Y899线梅罗湾至官湖村段公路路面大修工程项目	不分标段	茂名市长达交通建设有限公司	项目经理		2014-10-19	2015-02-01	申报
3	高州市彭村大桥新建工程	不分标段	茂名市长达交通建设有限公司	项目经理		2013-07-25	2015-12-05	申报
4	化州市城背(环城)公路改造工程(第一标段)	第一标段	茂名市长达交通建设有限公司	项目经理		2016-02-02	2019-04-22	申报
5	廉江市雅塘镇Y972线那西大桥改建工程	不分标段	茂名市长达交通建设有限公司	项目副经理		2020-01-10	2021-08-05	申报
6	肇庆省道S332线新桥大桥维修加固工程	不分标段	茂名市长达交通建设有限公司	项目经理		2021-08-10	2022-12-14	申报

相关链接

北京市

天津市

河北省

山西省

内蒙古自治区

辽宁省

吉林省

黑龙江省

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

河南省

湖北省

湖南省

广东省

广西壮族自治区

海南省

重庆市

四川省

贵州省

云南省

西藏自治区

陕西省

甘肃省

青海省

宁夏回族自治区

新疆维吾尔自治区

新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站 找错

全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	何海迪	执业资格	中央广播电视大学
性别	男	专业类别	土木工程
学历	本科	开始注册年份	1992-07-11

举报

职称信息		执业资格信息		履历信息		个人业绩 (2025.1.1之前录入)	个人业绩 (2025.1.1之后录入)
序号	项目名称	标段名称	业绩所属单位	工作岗位	职务日期	在网开始日期	在网截止日期
无记录							

相关链接

北京市	天津市	河北省	山西省	内蒙古自治区	辽宁省
吉林省	黑龙江省	上海市	江苏省	浙江省	安徽省
福建省	江西省	山东省	河南省	湖北省	湖南省
广东省	广西壮族自治区	海南省	重庆市	四川省	贵州省
云南省	西藏自治区	陕西省	甘肃省	青海省	宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区	新疆生产建设兵团				

附件下载

联系我们

政府网站
找错

全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部

详细业绩截图

企业名称	茂名市长达交通建设有限公司	项目类型	其他工程
工程名称	化州市城西（环城）公路改建工程（第一标段）	核算价（万元）	
合同价（万元）	2702.3639	合同段名称	第一标段
技术等级	二级公路	完工日期	2019-04-22
开工日期	2014-11-01	建设状态	已经竣工
竣工日期		合同段桩号	K1+001.7
合同段开始桩号	K0+000	所在省份	广东省
质量评定情况	合格		
项目代码			
主要工程量	本合同段主要工程量：化州市城西（环城）公路改建工程（第一标段）位于化州市下郭村乡（K0+000）~（K1+001.7），长1.662公里。路面工程：25cm厚C40水泥混凝土31224m ² ，20cm厚水泥稳定碎石基层22364m ² ，15cm厚水泥稳定碎石基层36439m ² ，路基填方390270m ³ ，路基挖方54350m ³ ，特殊路基填方66027m ³ ，水泥稳定碎石2627m ³ ，C15混凝土132m ³ ，钢筋网114.2m ² 。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	郑健	项目经理	2014-11-01~2019-04-22
2	莫文强	项目副经理	2014-11-01~2019-04-22
3	陈智强	工程部门负责人	2014-11-01~2019-04-22
4	陈智强	安全负责人	2014-11-01~2019-04-22
5	何志强	质量负责人	2014-11-01~2019-04-22
6	何志强	项目副经理	2014-11-01~2019-04-22
7	李海强	项目副经理	2014-11-01~2019-04-22

打印

企业名称	茂名市长达交通建设有限公司	项目类型	其他工程
工程名称	化州市城西（环城）公路改建工程（第一标段）	核算价（万元）	1567.4475
合同价（万元）	1090.7572	合同段名称	第一标段
技术等级	二级公路	完工日期	2014-11-05
开工日期	2011-01-25	建设状态	已经竣工
竣工日期	2017-01-09	合同段桩号	K15+356
合同段开始桩号	K0+000	所在省份	广东省
质量评定情况	合格		
项目代码			
主要工程量	水泥混凝土路面85331m ² ，水泥稳定碎石基层76543m ² 。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	李海强	项目经理	2011-01-25~2014-11-05
2	何志强	项目副经理	2011-01-25~2014-11-05
3	郑健	安全负责人	2011-01-25~2014-11-05
4	陈智强	工程部门负责人	2011-01-25~2014-11-05
5	莫文强	项目副经理	2011-01-25~2014-11-05
6	何志强	项目副经理	2011-01-25~2014-11-05
7	李海强	项目副经理	2011-01-25~2014-11-05

打印

企业名称	东莞市广达交通建设有限公司	项目类型	其他工程
工程名称	建设惠莞高速Y050线松山至海山段农村公路路面大修工程项目	预算价 (万元)	
合同价 (万元)	522.0115	合同段名称	不分标段
技术等级	三级公路	完工日期	2016-02-01
开工日期	2014-10-19	建设状态	总包已建
竣工日期		合同段桩号范围	K6+901.694
合同段桩号	K0+000	所在省份	广东省
质量评定情况	合格		
项目代码			
主要工程量	实际里程5.915公里。1、50mm碎石基层12337m ² ；2、180mm水泥混凝土674.25m ² ；3、210mm水泥混凝土36582.10m ² ；4、路面宽2273m ² ；5、设置交通标志牌12个。		

人员履约信息

序号	姓名	所在岗位或专业负责人	任职日期
1	何成强	项目经理	2014-10-19-2016-02-01
2	李润荣	项目总工	2014-10-19-2016-02-01



全国建筑市场监管公共服务平台截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键字，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数量 > 人员列表 > 手机查看

何法迎

证件类型	居民身份证	证件号码	440921*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	茂名市长达交通建设有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 茂名市长达交通建设有限公司

注册编号/执业印章号: 粤 1442017201742083

注册专业: 公路工程

有效期至: 2028年03月25日



2025-03-26 - 延续注册 - 公路工程
茂名市长达交通建设有限公司

2022-06-02 - 重新注册 - 公路工程
茂名市长达交通建设有限公司

2022-01-02 - 强制注销 - 已注册专业
茂名市交通建设工程总公司

2017-09-30 - 初始注册 - 公路工程
茂名市交通建设工程总公司

查看证书变更记录 (4)

二级注册建造师

注册单位: 茂名市长达交通建设有限公司

注册编号/执业印章号: 粤 2442007200803989

注册专业: 市政公用工程

有效期至: 2027年04月24日

暂无证书变更记录

相关网站链接

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2548623806

网站建设 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部市场监管司
网站备案号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德信信息技术有限公司 北京建设信源源有限公司



交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页

证书详细信息

证书编号: 粤交安B09G30165

发证时间: 2009-10-19

有效时间: 2027-10-17

证书状态: 有效

姓 名: 何法迎

性 别: 男

出生日期: 1971/5/19

企业名称: 茂名市长达交通建设有限公司

照 片:



考核管理部门咨询电话: 020-33739247



项目经理无在建项目承诺书

致高州市地方公路建设管理处：

我方在此声明，我方拟派往高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理何法迎（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在建建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：（主）广东普宁公路工程有限公司，

（成）茂名市长达交通建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李玲（签字）

日期： 2025 年 6 月 24 日

(六)-2拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓名	袁钜胜	年龄	54岁	专业	公路工程与管理
技术职称	高级工程师	学历	本科	拟在本标段工程任职	项目总工
工作年限	32年			类似施工经验年限	32年
毕业学校	2006年7月毕业于北京交通大学学校公路工程与管理专业，学制三年				
经历					
时间	参加过的类似工程项目名称			担任职务	发包人及联系电话
2016. 10. 15 -2018. 1. 24	省道松仙线(S283线)高州市路段改建工程(二期工程)			项目经理	[REDACTED]
2011. 1. 25- 2014. 11. 5	顿梭至连界公路顿梭至镇江段路面大修工程			项目总工	
2016. 2. 1- 2018. 4. 24	吴川市Y974线樟铺至五和段路面大修工程			项目副经理	
获奖情况		/			
本人 <u>袁钜胜</u> (亲笔签字) 知晓自己为本项目的项目总工(填写项目经理或项目总工), 并对其真实性负责。					
备注		/			

注: 1. 本表后应填写项目经理和项目总工相关情况。

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

袁钜胜

男 汉族

1971 年 2 月 24 日

广东省茂名市茂南区福华
直一巷18号大院3号602
房

公民身份号码 [REDACTED]



中华人民共和国居民身份证

签发机关 茂名市公安局茂南分局

有效期限 2006.12.25-2026.12.25



粤高取证字第0800101105437 号

袁钜胜 于二〇〇七年
十二月，经 广东省路桥、航
运工程技术高级工程师资格
评审委员会评审通过，
具备 路桥高级工程师
资格。特发此证



发证机关 广东省人事厅
二〇〇八年 三 月 二十六日



公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

姓 名：袁钜胜

身份证号：

性 别：男

领 域：公路工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：茂名市长达交通建设有限公司

证书编号：粤交安B09G30185

有效期至：2027年10月17日



发证机关（章） 广东省交通运输厅

发证日期

2009年10月19日



查询网址：<http://gd.safetyams.cn/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 袁钜胜

证件号码: [REDACTED]

该参保人在茂名市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	19940101	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	19980301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	19980301	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业		工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	
202412	111000023565	12700	1905	0	1016	12700	101.6	25.4	114.3
202501	111000023565	12700	2032	0	1016	12700	101.6	25.4	114.3
202502	111000023565	12700	2032	0	1016	12700	101.6	25.4	114.3
202503	111000023565	12700	2032	0	1016	12700	101.6	25.4	114.3
202504	111000023565	12700	2032	0	1016	12700	101.6	25.4	114.3
202505	111000023565	12700	2032	0	1016	12700	101.6	25.4	114.3

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

111000023565: 茂名市: 茂名市长达交通建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在茂名市参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2025-12-09, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费, 其中“单位缴费划入个账”是按政策规定, 将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称(证明专用章)

证明日期: 2025年06月12日

人员信息截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

搜索

茂名市长达交通建设有限公司

基本信息

资质信息

人员信息

业绩信息

奖惩记录

全国综合评价

企业在各地的信用等级

企业变更记录

企业转移历史记录

姓名: 请输入查询条件

搜索

人员信息

序号	姓名	性别	毕业学校	学历	专业
1	陈亚冰	男	交通部电视中等专业学校	中专	公路与桥梁
2	李海燕	男	中央广播电视大学	本科	土木工程
3	余永群	男	中国石化广东石油化工高等专科学校	大专	工业与民用建筑
4	郭强生	男	广东交通职业技术学院	大专	公路与桥梁
5	吴茂清	男	华南理工大学	本科	公路与城市道路工程
6	袁伟	男	大连理工大学	大专	土木工程
7	陈瑞彬	男	南京粮食经济学院	本科	会计学
8	林明吉	男	国家开放大学	本科	道路与桥梁工程
9	陈伟旺	男	广东省冶金工业学校	中专	矿山测量
10	赖庆怡	男	武汉理工大学	本科	土木工程
11	曾文锋	男	中央广播电视大学	本科	土木工程
12	袁钜胜	男	北京交通大学	本科	公路工程与管理
13	张金	男	广东农垦通什中等专科学校	中专	测绘
14	吴云	男	中央广播电视大学	大专	建筑施工与管理
15	黎智明	男	广东交通职业技术学院	大专	公路与桥梁

1

2

3

下一页

智能

页

确定

共37页

相关链接

北京市

天津市

河北省

山西省

内蒙古自治区

辽宁省

吉林省

黑龙江省

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

河南省

湖北省

湖南省

广东省

广西壮族自治区

海南省

重庆市

四川省

贵州省

云南省

西藏自治区

陕西省

甘肃省

青海省

宁夏回族自治区

新疆维吾尔自治区

新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站 找错

全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2022 中华人民共和国交通运输部

职称信息截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名	袁根柱	毕业院校	北京交通大学
性别	男	所学专业	公路工程与管理
学历	本科	开始工作年份	1993-06-20

打印

职称名称	执业资格名称	证书编号	个人业绩 (2020-11之前录入)	个人业绩 (2020-11之后录入)
1	高级工程师	粤发改证字第000101105437号	路桥	广东人事厅

相关链接

北京市

天津市

河北省

山西省

内蒙古自治区

辽宁省

吉林省

黑龙江省

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

河南省

湖北省

湖南省

广东省

广西壮族自治区

海南省

重庆市

四川省

贵州省

云南省

西藏自治区

陕西省

甘肃省

青海省

宁夏回族自治区

新疆维吾尔自治区

新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

网站首页

全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2027 中华人民共和国交通运输部

执业信息截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息

姓名袁明胜

性别男

学历本科

毕业院校北京交通大学

所学专业公路工程与管理

开始工作年份1998-06-28

举报

广东善宇公路工程有限公司

44060315221000

履历信息截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页
政策法规
工作动态
从业企业
从业人员
用户登录

施工 人员姓名查询

去搜索

基本信息			
姓名	曹德胜	毕业院校	北京交通大学
性别	男	所学专业	公路工程与管理
学历	本科	开始工作时间	1993-06-28

打印

序号	单位名称	职务名称	个人业绩 (2013-12-31前)	个人业绩 (2014-12-31后)
1	河南省高速公路建设有限公司	技术负责人	担任	担任

相关链接

北京市

天津市

河北省

山西省

内蒙古自治区

辽宁省

吉林省

黑龙江省

上海市

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

河南省

湖北省

湖南省

广东省

广西壮族自治区

海南省

重庆市

四川省

贵州省

云南省

西藏自治区

陕西省

甘肃省

青海省

宁夏回族自治区

新疆维吾尔自治区

新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站
反馈

全国公路建设市场监督管理系统
 Copyright © 2011-2027 中交公路长大桥梁建设有限公司

个人业绩信息截图

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

内网
政策法规
工作动态
从业企业
从业人员
用户登录

施工 人员姓名查询

请输入关键字查询的人员姓名 [X] 搜索

基本信息

姓名	黄国胜	性别	男
学历	本科	职称	高级工程师
身份证号	360103198205150011		

[X] 申报

序号	项目名称	标段名称	单位名称	工作岗位	入职日期	在岗截止日期	在岗截止日期	备注
1	G207国道江西贵溪至玉山段改建工程	不分标段	江西省公路建设开发有限公司	项目经理	2015-09-27	2016-09-27		在建
2	新建五洲桥至新建五洲桥公路改建工程	新建五洲桥	江西省公路建设开发有限公司	项目经理	2011-01-25	2012-11-05		在建
3	贵州市贵安新区贵安新区贵安新区公路改建工程	不分标段	江西省公路建设开发有限公司	项目经理	2013-01-25	2014-06-05		在建
4	贵州市贵安新区贵安新区公路改建工程	不分标段	江西省公路建设开发有限公司	项目经理	2013-11-30	2015-12-05		在建
5	X015省道贵安新区贵安新区公路改建工程	不分标段	江西省公路建设开发有限公司	项目经理	2016-01-25	2016-12-27		在建
6	贵州市贵安新区贵安新区公路改建工程	不分标段	江西省公路建设开发有限公司	项目经理	2016-02-01	2016-04-24		在建
7	贵州市贵安新区贵安新区公路改建工程	不分标段	江西省公路建设开发有限公司	项目经理	2016-10-15	2016-01-24		在建

相关链接

北京市

天津市

上海市

重庆市

广东省

云南省

新疆维吾尔自治区

河北省

山西省

山东省

河南省

湖北省

湖南省

陕西省

辽宁省

吉林省

黑龙江省

内蒙古自治区

宁夏回族自治区

青海省

甘肃省

四川省

贵州省

广西壮族自治区

海南省

福建省

浙江省

安徽省

附件下载

联系我们

政府网站

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017-2022 中国公路建设信息网

施工 人员姓名查询

请输入您要搜索的人员姓名

搜索

基本信息					
姓名	黄煜强	毕业院校	北京交通大学		
性别	男	所学专业	公路工程施工管理		
学历	本科	施工经历	1997年-2010		
打印					

工作经历		从业企业经历		职称信息		个人业绩 (2020.1.1之前录入)		个人业绩 (2020.1.1之后录入)	
年份	项目名称	单位名称	职位名称	证书/资质证书	工作年限	项目开始日期	项目结束日期	在路项目日期	
无记录									

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省
吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省
福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省
广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省
云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区 新疆生产建设兵团

附件下载

联系我们

政府网站 找错

全国公路建设市场监督管理系统

Copyright © 2017-2021 All Rights Reserved 京ICP备17000000号

企业名称	深圳市兴达交通建设有限公司	项目类型	其他工程
工程名称	惠州市Y574线增城至五和段路面大修工程	合同段名称	不分标段
合同价 (万元)	801.6483	竣工日期	2015-04-24
技术等级	三级公路	建设状态	是否已竣工
开工日期	2016-02-01	合同段桩号	K8+546.377
竣工日期		所在省份	广东省
合同段开始桩号	K0+000		
质量评定情况	合格		
项目代码			
主要工程量	本合同段主要工程量: K0+000-K8+546.377段。路基工程: 浆砌防护工程、排水工程、小桥及涵洞工程、涵洞工程; 路面工程: 水泥稳定石粉类基层、水泥稳定石灰粉煤灰碎石类基层、水泥砼路面、土路肩、路缘石; 交通安全设施: 标志牌、波形护栏等。		

人员履约信息

序号	姓名	担任岗位或专业负责人	任职日期
1	袁超阳	项目经理	2016-02-01~2016-04-24
2	李伟良	项目副经理	2016-02-01~2016-04-24
3	曾子豪	工程部门负责人	2016-02-01~2016-04-24
4	林华志	质检负责人	2016-02-01~2016-04-24
5	黄国强	安全负责人	2016-02-01~2016-04-24



安全生产考核管理系统查询

交通运输工程施工单位安管人员安全生产考核管理系统信息公共查询平台

Public Information Query Platform for the Safety Production Assessment Management System of Safety Management Personnel in Transportation Engineering Construction Units

企业用户登录 | 首页

证书详细信息

证书编号: 粤交安B06030188

发证时间: 2009-10-19

有效期至: 2027-10-17

证书状态: 有效

姓 名: 袁旭彪

性 别: 男

出生日期: 1971-03-28

企业名称: 茂名市恒达交通建设有限公司

照 片:


考核管理部门咨询电话: 020-83730347



项目总工无在建项目承诺书

致高州市地方公路建设管理处：

我方在此声明，我方拟派往高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目总工袁钜胜（项目总工姓名）现阶段没有担任任何在建项目的职务。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：（主）广东善宇公路工程有限公司，

（成）茂名市长达交通建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李永合（签字）

日期：2025 年 6 月 24 日

九、其他资料

1、提供“九-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书”。

后附。

2、提供“九-2、投标人的自评分表”。

后附。

3、提供“九-3、公示信息表”。

后附。

4、提供最新年度广东省公路工程从业单位（施工单位）信用评价等级（若有），并标识单位所在位置。

无。

5、初次进入广东省的，但在最新年度的全国综合评价结果为C级或D级的，提供最新年度的全国综合评价结果单位查询所在页。

我方最新年度的全国综合评价结果未被评定为C级或D级，最新年度的全国综合评价结果单位查询所在页后附

6、如上一年度有信用评价而最新年度在广东省无信用等级的需提供上一年度的信用评价（若有），并标识单位所在位置。

无。

7、详细说明投标人投标文件递交截止日前1年内，因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈、茂名市交通运输局或高州市交通运输局行政处罚的文件。

我方投标文件递交截止日前1年内，没有因公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈、茂名市交通运输局或高州市交通运输局行政处罚的文件。

8、投标人认为需要的其他内容（如体现技术能力的相关证明材料）。

后附。



九-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书

致招标人：高州市地方公路建设管理处

按相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：


一、我单位在高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程的招标中，第 / 次使用（或不使用）广东省交通运输厅发布的 / 年度信用评价 / 等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用 / 等级结果（不使用时上述填“/”）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件：单位使用 / 年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表
特此承诺！

投标人（单位全称）：广东善宇公路工程有限公司

投标人的法定代表人或其委托代理人签名： 

2025年6月24日

注：1、AA、A级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用”时需和附表（单位使用年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表）一起编入投标文件中。

2、AA、A级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使用”时，使用次数应按标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致）。如同时对多个标段选择

“使用”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。

3、中标候选人公示中，将对所有承诺使用最新年度AA、A级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。

4、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

九-1、使用广东省信用评价等级的申请承诺书

致招标人：高州市地方公路建设管理处

按相关要求，现我单位对使用信用等级申请如下：

一、我单位在高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程的招标中，第 / 次使用（或不使用）广东省交通运输厅发布的 / 年度信用评价 / 等级结果和对应等级分值。

二、我单位承诺，在递交本次申请后，我单位将失去一次使用 / 等级结果（**不使用时上述填“/”**）参与投标的机会。当累计使用超过规定的次数，我单位同意按降低一个信用等级对应分值来认定参与投标评审。

三、如果我单位发生违反规定使用信用等级结果的情形，自愿接受省级交通运输主管部门的处理。

附件：单位使用 / 年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表

特此承诺！



投标人（单位全称）：茂名市长达交通建设有限公司

投标人的法定代表人或其委托代理人签名：

2025年6月24日



注：1、AA、A级信用等级企业必须填写此申请承诺书；选择“使用”时需和附表（单位使用年度广东省公路工程从业单位信用等级情况汇总表）一起编入投标文件中。

2、AA、A级信用等级企业应区分标段、分别填写并提交此申请承诺书；如同时对多个标段选择“使用”时，使用次数应按标段累加（即各个标段申请承诺书的使用次数应不一致）。如同时对多个标段选择“使用”而多个标段所附申请承诺书的使用次数为同一次时，多个标段均视为未正确填报申请承诺书，均按不承诺使用对应的信用等级处理。

3、中标候选人公示中，将对所有承诺使用最新年度AA、A级投标人的年度信用等级使用情况进行公开。4、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

附表:

(主) 广东善宇公路工程有限公司 单位使用年度广东省公路工程从业单位

信用等级情况汇总表

序号	招标人名称	标类或（标段）名称	递交文件时间 （年月日）	使用信用等级（AA/A）	备注
1	/	/	/		/
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：1、应如实填报信用评价等级使用情况。

2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

**(成) 茂名市长达交通建设有限公司 单位使用年度广东省公路工程从业单位
信用等级情况汇总表**

序号	招标人名称	标类或（标段）名称	递交文件时间 （年月日）	使用信用等级（AA/A）	备注
1	/	/	/	/	/
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
...					

注：1、应如实填报信用评价等级使用情况。

2、以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

承诺函

致：高州市地方公路建设管理处：

我方（主）广东善宇公路工程有限公司，（成）茂名市长达交通建设有限公司参加高州市2024年中心镇街县道单改双改造工程的投标工作，我方在此承诺：

1、我方作为投标人，投标人及其法定代表人、拟投入本项目的项目经理(含备选，如有)、项目总工(含备选，如有)等在近三年内均无行贿犯罪记录(以投标人投标函中的承诺为准)。

2、我方投标文件递交截止日前1年内，没有公路工程（含附属设施）质量、安全、履约问题或招标投标问题等原因被交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚或正式约谈、茂名市交通运输局或高州市交通运输局行政处罚的文件。

投标人：（主）广东善宇公路工程有限公司，
（成）茂名市长达交通建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李勤（签字）

日期：2025年6月24日

九-2、投标人的自评分表

序号	评分因素	满分	评分标准	自评分	评分情况说明	页码索引
1	总体施工组织布置及规划	2分	(1) 对项目的基本情况了解全面、准确, 施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强, 按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行, 得 1.6~2.0 分; (2) 满足工程建设需要, 施工总体布置规划、施工进度计划基本可行, 得 1.2~1.6 分; (3) 一般但不被评定为不响应的, 得 1.2 分。	2分	我方对项目的基本情况了解全面、准确, 施工总体布置规划、施工进度计划科学合理、可操作性强, 按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行	P25-42
2	重点、难点和关键工程的施工方案与技术措施	2分	1) 对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻, 能充分发挥自身优势, 积极采用“四新”技术, 制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强, 重点突出的, 按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行, 得分 1.6~2.0 分; (2) 对项目重点、难点和关键工程认识基本到位, 施工方案与技术措施基本可行, 重点较为突出的, 得分 1.2~1.6 分; (3) 一般但不被评定为不响应的, 得分 1.2分。	2分	我方对项目重点、难点和关键工程认识分析透彻, 能充分发挥自身优势, 积极采用“四新”技术, 制定的施工方案与技术措施针对性和可操作性强, 重点突出的, 按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行	P43-52
3	工期、质量、安全、环保、水保、文明施工保证措施	1分	(1) 能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因素, 拟采取预防保证措施针对性强、科学有效, 重点突出的, 按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行, 得分 0.8~1.0 分; (2) 对工期、质量、安全、环保、水保等风险有一定认识, 预防保证措施基本可行, 重点较为突出的, 得分 0.6~0.8 分; (3) 一般但不被评定为不响应的, 得分 0.6分	1分	我方能够准确预判分析工期、质量、安全、环保、水保、文明施工目标实现的主要影响因素, 拟采取预防保证措施针对性强、科学有效, 重点突出的, 按《广东省公路工程施工标准化指南》及《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》《公路工程施工安全防护设施技术指南》执行	P53-64

4	项目经理任职资格与业绩	1分	(1)满足资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)时,得0.6分; (2)每增加担任1个公路工程业绩的,加0.2分,最多加0.4分。	1分	我方拟派的项目经理满足资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求),附3个公路工程业绩	P130-147
5	项目总工任职资格与业绩	1分	(1)满足资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)时,得0.6分; (2)每增加担任1个公路工程业绩的,加0.2分,最多加0.4分。	1分	我方拟派的项目总工满足资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求),附3个公路工程业绩	P148-161
6	技术能力	1分	(1)投标人获得与项目施工有关的国家级工法、专利(发明专利或实用新型专利)、国家级科学技术进步奖、鲁班奖、詹天佑奖,主编或参编过国家标准,每项加0.2分; (2)投标人获得省级科学技术进步奖,主编或参编过的行业或地方(指省级)标准,每项加0.1分; 注:技术能力加分最高1分,同一事项按较高分只计一次。如联合体投标的指联合体成员任何一方。	1分	我方获得实用新型专利5个	P173-182
7	履约信誉	10分	1.信用等级分值(5分) AA、A、B、C级单位的信用等级得分分别为5.00、4.75、4.45、3.65分。 注:信用等级的确定原则遵循投标人须知前附表10.2款的规定。 2.履约情况(5分) 若没出现下述情形得满分; 投标文件递交截止日前1年内,投标人因公路工程(含附属设施)质量、安全、履约或招标投标问题等原因被: (1)交通运输部行政处罚的,扣5分/次。 (2)广东省交通运输厅行政处罚的,扣3分/次。 (3)项目所在地地级以上市交通运输局行政处罚的,扣1.5分/次。 (4)广东省交通运输厅正式约谈的,扣0.1分/次。 同一事项同时被多个部门行政处罚或正式约谈只按最高的扣分计算1次。 。如果扣完本项分值,可以从总分中扣。以联合体形式投标的,	9.45分	1、我方的信用等级默认为B级。 2、我方自投标文件递交截止日前1年内,没有因公路工程(含附属设施)质量交通运输部行政处罚、广东省交通运输厅行政处罚、项目所在地地级以上市交通运输局行政处罚、广东省交通运输厅正式约谈。	P114-128

			若各联合体成员任何一方或均存在上述情形的，对联合体各成员进行累计扣分。			
8	财务	1分	满足资格审查条件(财务最低要求)得0.3分；在此基础上， (1) 最新年度营运资金在 5000 万元基础上，每增加 1000 万元（尾数不计）加 0.1 分。最高加分不超过0.2 分。 (2) 近三个年度的年平均营业总收入在 10000 万基础上，每增加2000 万元（尾数不计）加 0.1 分。最高加分不超过 0.2 分。 (3) 近三个年度连续盈利加 0.3 分。 注：如联合体投标的指联合体成员任何一方。	1分	我方满足资格审查条件的财务最低要求；本联合体成员其中一方最新年度营运资金为7699.613万元，得 0.2分； 本联合体成员其中一方近三个年度的年平均营业总收入为 43695.4414万元，得 0.2分。 本联合体成员其中一方近三个年度连续盈利加 0.3 分。	99-101
9	业绩	1分	满足“资格审查条件(业绩最低要求)”规定的，得1分	1分	我方满足“资格审查条件(业绩最低要求)”规定	P102-113
合计		20分	-	19.45分		

投标人：(主) 广东善宇公路工程有限公司，

(成) 茂名市长达交通建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：李亚合 (签字)

(主) 广东善宇公路工程有限公司信用等级截图：

全国公路建设市场监督管理系统 人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

广东善宇公路工程有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 诚信记录 全国综合评价 企业在建的信用等级 企业变更信息 企业转移历史记录

评价年度 请选择

企业信用等级

序号	企业名称	评价年份	等级	得分	备注
无记录					

相关链接

北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 安徽省 河南省 四川省

上海市 浙江省 江西省 山东省 河南省 贵州省

福建省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市

附件下载 联系我们 政府网站 找错

全国公路建设市场监督管理系统 人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

广东善宇公路工程有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 诚信记录 全国综合评价 企业在建的信用等级 企业变更信息 企业转移历史记录

评价年度 请选择

企业信用等级

序号	企业名称	评价年份	等级	得分	备注
无记录					

(成) 茂名市长达交通建设有限公司信用等级截图:

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

茂名市长达交通建设有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 诚信记录 全国综合评价 企业在各地的信用等级 企业变更信息 企业档案历史记录

评价年度: 请选择

企业信用等级					
序号	企业类型	评价年份	等级	得分	备注
无记录					

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页 政策法规 工作动态 从业企业 从业人员 用户登录

施工 从业单位名称或统一社会信用代码查询

请输入您要搜索的单位名称

茂名市长达交通建设有限公司

基本信息 资质信息 人员信息 业绩信息 诚信记录 全国综合评价 企业在各地的信用等级 企业变更信息 企业档案历史记录

评价年度: 请选择

企业信用等级					
序号	评价年份	评价年份	等级	等级	
1	云南省	2016	A	等级	
2	云南省	2017	A	等级	
3	云南省	2016	A	等级	
4	云南省	2016	B	等级	
5	云南省	2014	A	等级	
6	广西壮族自治区	2014	B	等级	
7	云南省	2013	B	等级	
8	广西壮族自治区	2013	A	等级	
9	云南省	2012	A	等级	
10	云南省	2010	B	等级	

相关链接

北京市	天津市	河北省	山西省	内蒙古自治区	辽宁省
吉林省	黑龙江省	上海市	江苏省	浙江省	安徽省
福建省	江西省	山东省	河南省	湖北省	湖南省
广东省	广西壮族自治区	海南省	重庆市	四川省	贵州省
云南省	西藏自治区	陕西省	甘肃省	青海省	宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区	新疆生产建设兵团				

附件下载 联系我们 政府网站 找钢

全国公路建设市场监督管理系统
Copyright © 2017 2027 中华人民共和国交通运输部

(成) 茂名市长达交通建设有限公司获得专利(发明专利或实用新型专利)证书:

证书号第17430712号



实用新型专利证书

实用新型名称: 一种便于搬运的公路临时护栏

发 明 人: 黄圣帝

专 利 号: ZL 2022 2 0231335.4

专利申请日: 2022 年 01 月 27 日

专 利 权 人: 茂名市长达交通建设有限公司

地 址: 525000 广东省茂名市新湖四街1号大院

授权公告日: 2022 年 09 月 16 日

授权公告号: CN 217438791 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查, 决定授予专利权, 颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年, 自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号第17430712号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年01月27日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

黄圣帝

发明人：

黄圣帝



证书号第17418141号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种公路检测取芯机固定装置

发 明 人：宋振乾

专 利 号：ZL 2021 2 2207793.2

专利申请日：2021年09月13日

专 利 权 人：茂名市长达交通建设有限公司

地 址：525000 广东省茂名市新潮四街1号大院

授权公告日：2022年09月16日

授权公告号：CN 217442879 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17418141号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年09月13日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

宋振乾

发明人：

宋振乾



证书号第17466514号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种公路用限高装置

发 明 人：黄梓刚

专 利 号：ZL 2022 2 0232504.6

专利申请日：2022年01月27日

专 利 权 人：茂名市长达交通建设有限公司

地 址：525000 广东省茂名市新湖四街1号大院

授权公告日：2022年09月23日

授权公告号：CN 217480029 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17466514号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年01月27日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

黄梓刚

发明人：

黄梓刚



证书号第17469275号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种太阳能道路提示报警装置

发 明 人：邱升强

专 利 号：ZL 2022 2 0070203.8

专利申请日：2022年01月12日

专 利 权 人：茂名市长达交通建设有限公司

地 址：525000 广东省茂名市新潮四街1号大院

授权公告日：2022年09月23日

授权公告号：CN 217484977 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第17469275号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年01月12日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

邱升强

发明人：

邱升强



证书号第18170549号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种道路施工用道路灌缝装置

发 明 人：郭红斌

专 利 号：ZL 2022 2 2387850.4

专利申请日：2022年09月08日

专 利 权 人：茂名市长达交通建设有限公司

地 址：525000 广东省茂名市新潮四街1号大院

授权公告日：2023年01月03日

授权公告号：CN 218203799 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第18170549号

专利权人应当依照专利法及其实实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年09月08日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

郭红斌

发明人：

郭红斌



九-3、公示信息表

公示信息表（业绩）

序号	项目名称
1	茂名市区高山至公馆段一级公路新建工程(茂化快线东延线)
2	省道S279线郁南大湾将军岭至罗定屏风山段路面改造工程。
3	省道松仙线(S283线)高州市路段改建工程(二期工程)

注：1、请各投标人将投标时申报的业绩汇总至本表，如被推荐为中标候选人将进行公示相关业绩信息。

2、请各投标人填好本表后打印并编入投标文件中，同时将本表电子版（word或excel版）存入投标文件的电子文件中，随投标文件一并交于招标人。

3、投标人的公示信息表所填内容仅作为参考，投标人填写或不填写不影响其投标文件的有效性，不可作为否决投标的条件。

公示信息表（主要人员）

任职	姓名	证书及其性质			
		证书名称	证书编号	颁发部门	颁发时间
项目经理	何法迎	职称证	粤中职称字第0800102461736号	茂名市人事局	2007年12月30日
		注册建造师证	粤1442017201742083	中华人民共和国住房和城乡建设部	2022年6月2日
		安全证	粤交安B09G30165	广东省交通运输厅	2009年10月19日
项目经理 备选人	/	职称证	/	/	/
		注册建造师证	/	/	/
		安全证	/	/	/
项目 总工	袁钜胜	职称证	粤高职证字第0800101105437号	广东省人事厅	2008年3月26日
		安全证	粤交安B09G30185	广东省交通运输厅	2009年10月19日
项目 总工备选人	/	职称证	/	/	/
		安全证	/	/	/

主要人员资历表

任职	姓名	经历（业绩）	
项目经理	何法迎	1	化州市城西(环城)公路改造工程（第一标段）
		2	顿梭至连界公路顿梭至镇江段路面大修工程
		3	建设遂溪县Y699线榄罗湾至官湖村委会公路路面大修工程项目
项目经理 备选人	/	1	/
		2	/
		...	/
项目 总工	袁钜胜	1	省道松仙线(S283线)高州市路段改建工程(二期工程)
		2	顿梭至连界公路顿梭至镇江段路面大修工程
		3	吴川市Y974线樟铺至五和段路面大修工程
项目 总工备选 人	/	1	
		2	/
		...	/

注：1、请各投标人将投标时申报的项目经理和项目总工的资格证书信息及业绩信息汇总至本表，如被推荐为中标候选人将进行公示相关人员信息。

2、请各投标人在填好本表后打印并编入投标文件中，同时将本表电子版（word或excel版）存入投标文件的电子文件中，随投标文件一并交于招标人。

3、投标人的公示信息表所填内容仅作为参考，投标人填写或不填写不影响其投标文件的有效性，不可作为否决投标的条件。
